„Sanace dna a dělící hráze neplaveckého bazénu a vybudování mola na LKOP

zhotovitel: **DEV Company, spol. s r.o.**
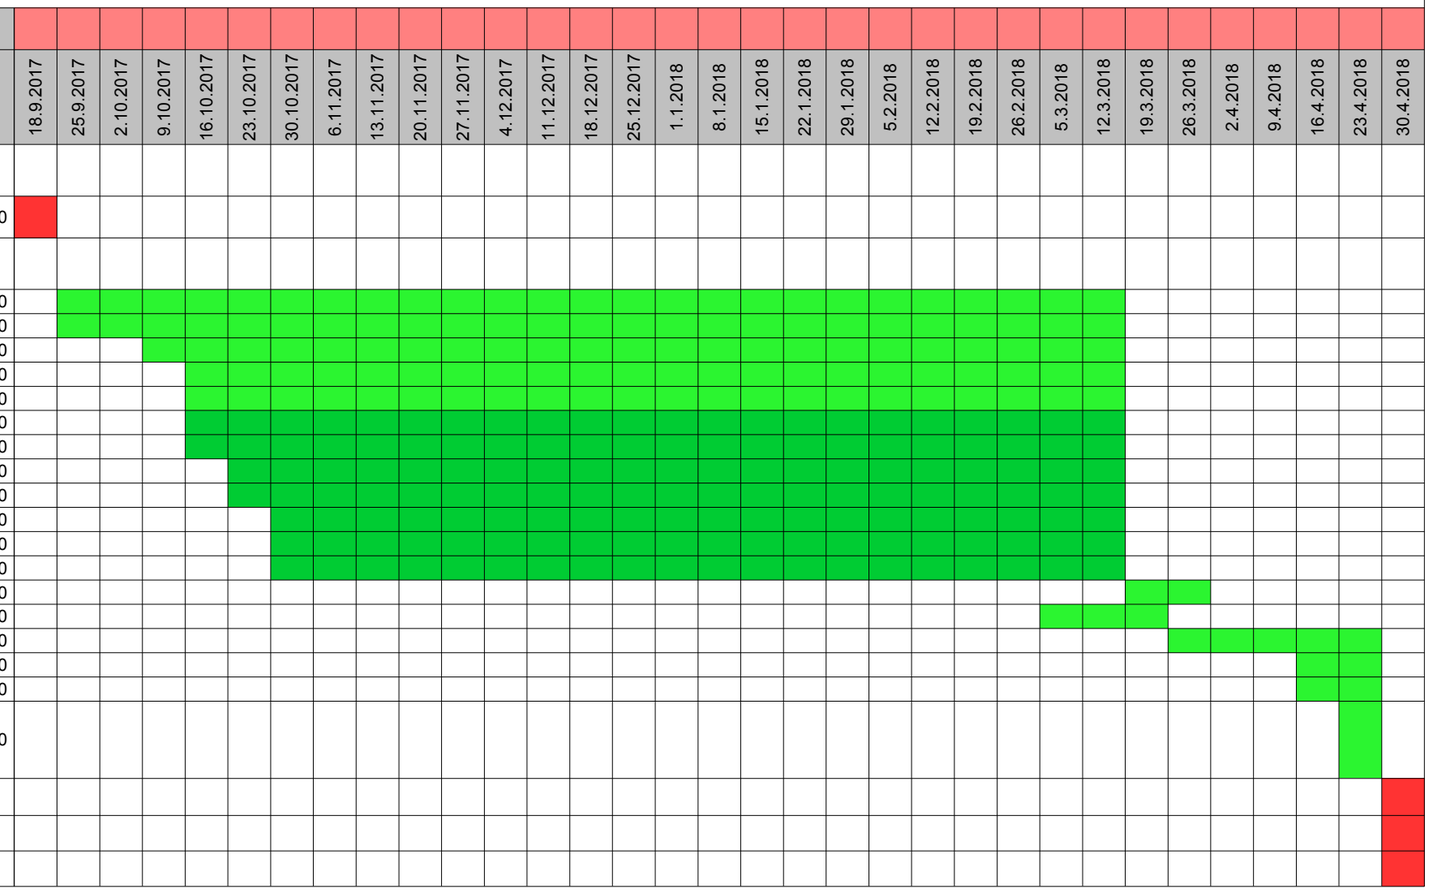
Druh	ozn.	Popis činnosti	Týden označení: Datum zahájení	Datum ukončení	Počet dnů
Převzetí staveniště	1		20.9.2017		
----------	2	Zařízení staveniště	20.9.2017	22.9.2017	2,0
Zahájení stavby	3		25.9.2017		
HSV DEV	SO02	Bourání stávajícího dna I.žebro-8.žebro	25.9.2017	12.3.2018	168,0
HSV DEV	SO02	Odvoz suti I.žebro-8.žebro	25.9.2017	12.3.2018	168,0
HSV DEV	SO02	Výkopové práce I.žebro-8.žebro	4.10.2017	12.3.2018	159,0
HSV DEV	SO02	Podklad ze štěrkodrtě I.žebro-8.žebro	11.10.2017	12.3.2018	152,0
HSV DEV	SO02	Zhutnění podloží I.žebro-8.žebro	13.10.2017	12.3.2018	150,0
HSV DEV	SO02	Potrubí žeber včetně propojení I.žebro-8.žebro	18.10.2017	12.3.2018	145,0
HSV DEV	SO02	Výztuž ŽB desky I.žebro-8.žebro	18.10.2017	12.3.2018	145,0
HSV DEV	SO02	Bednění žeber I.žebro-8.žebro	25.10.2017	12.3.2018	138,0
HSV DEV	SO02	Železobeton žeber I.žebro-8.žebro	27.10.2017	12.3.2018	136,0
HSV DEV	SO02	Železobeton desek základových I.žebro-8.žebro	30.10.2017	12.3.2018	133,0
HSV DEV	SO02	Řezání dilatačních spár I.žebro-8.žebro	31.10.2017	12.3.2018	132,0
HSV DEV	SO02	Tmelení dilatačních spár I.žebro-8.žebro	2.11.2017	12.3.2018	130,0
HSV DEV	SO02	Nátěř dna plaveckého bazénu	19.3.2018	26.3.2018	7,0
HSV DEV	SO03	Výroba ocelového mola	5.3.2018	25.3.2018	20,0
HSV DEV	SO03	Montáž ocelového mola	26.3.2018	23.4.2018	28,0
HSV DEV	SO03	Montáž dřevěné podlahy mola	16.4.2018	23.4.2018	7,0
HSV DEV	SO03	Místo pro plavčíka	16.4.2018	23.4.2018	7,0
HSV DEV	SO02 aSO03	Uúklid staveniště a dokončovací práce	23.4.2018	29.4.2018	6,0
	4	Předání stavby	29.4.2018	29.4.2018	
	5	Ukončení stavby		29.4.2018	
	6	Konečný termín stavby dle SoD		30.4.2018
