POSTUP PRÁCE: Oprava GPK 1. a 2. SK Kolín (I. část)

Datum: 1.11.2017

Lokalita: Dopravna Kolín

TÚDÚ:

Předpokládaný začátek / konec výluky: 25.11. / 5.12.2017

Předpokládaná doba výluky: viz níže

Den/č.	Popis práce	Objem prací	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - BEZ VÝLUKY				
	Diagnostika tras technické infrastruktury	soubor	Řešeno před zahájením výluk		
	Laboratorní rozbor kol.lože a zeminy	soubor			
	Zřízení staveniště	soubor			
	Navážení Materiálů	soubor			
	ROV 63389				
25.11.	**Etapa A**		19:00	23:00	4:00
	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	1.TK od1L-S1a	19:00	19:30	0:30
	Doplnění a úprava štěrkového lože	1.TK od1L-S1a	19:30	21:30	2:00
	Úprava GPK	1.TK od1L-S1a	21:00	22:00	1:00
	Dynamická stabilizace	1.TK od1L-S1a	22:00	22:30	0:30
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	1.TK od1L-S1a	22:30	23:00	0:30
	Etapa A1		23:00	5:00	1:00
25.11.-26.11.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	1.TK od1L-S1a	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	1.TK od1L-S1a	1x60 min		
	Úprava GPK	1.TK od1L-S1a	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	1.TK od1L-S1a	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	1.TK od1L-S1a	etapou B		
	Etapa B		23:00	5:00	6:00
25.11.-26.11.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	2.TK od 2L-S2a	23:00	23:30	0:30
	Doplnění a úprava štěrkového lože	2.TK od 2L-S2a	23:30	3:00	4:30
	Úprava GPK	2.TK od 2L-S2a	3:00	4:00	1:00
	Dynamická stabilizace	2.TK od 2L-S2a	4:00	4:30	0:30
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	2.TK od 2L-S2a	4:30	5:00	0:30
	Etapa C		23:00	5:00	0:30
25.11.-26.11.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	zhlaví zábořské, Se5-S38a	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	zhlaví zábořské, Se5-S38a	1x30 min		
	Úprava GPK	zhlaví zábořské, Se5-S38a	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	zhlaví zábořské, Se5-S38a	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	zhlaví zábořské, Se5-S38a	etapou B		
	Etapa D		12:00	20:00	8:00
26.11.	Uzavírka přejezdu, demontáž a zpětná montáž přejezdu/přechodu	3ks	11:00	20:00	9:00
	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	1a; 1b; 1c od S1a - Se32	12:00	13:00	1:00
	Doplnění a úprava štěrkového lože	1a; 1b; 1c od S1a - Se32	12:30	18:30	6:00
	Úprava GPK	1a; 1b; 1c od S1a - Se32	17:30	19:00	1:30
	Dynamická stabilizace	1a; 1b; 1c od S1a - Se32	18:00	19:15	1:15
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	1a; 1b; 1c od S1a - Se32	19:00	20:00	1:00
	Etapa E		7:00	19:00	12:00
27.11.	Uzavírka přejezdu, demontáž a zpětná montáž přejezdu/přechodu	3ks	11:00	20:00	9:00
	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	2a; 2b; 2c od S2a - Se28	7:00	8:00	1:00
	Doplnění a úprava štěrkového lože	2a; 2b; 2c od S2a - Se28	7:30	16:30	9:00
	Úprava GPK	2a; 2b; 2c od S2a - Se28	16:00	17:30	1:30
	Dynamická stabilizace	2a; 2b; 2c od S2a - Se28	17:00	18:15	1:15
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	2a; 2b; 2c od S2a - Se28	18:00	19:00	1:00
	Etapa F		7:00	19:00	0:30
27.11.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	střední zhlaví, od Se12-Se13	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	střední zhlaví, od Se12-Se13	1x30 min		
	Úprava GPK	střední zhlaví, od Se12-Se13	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	střední zhlaví, od Se12-Se13	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	střední zhlaví, od Se12-Se13	etapou E		
	Etapa G		8:00	18:00	10:00
28.11.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	2c; 2; od Se28 - Sc2	8:00	9:00	1:00
	Doplnění a úprava štěrkového lože	2c; 2; od Se28 - Sc2	8:30	15:30	7:00
	Úprava GPK	2c; 2; od Se28 - Sc2	15:00	16:30	1:30
	Dynamická stabilizace	2c; 2; od Se28 - Sc2	16:00	17:00	1:00
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	2c; 2; od Se28 - Sc2	17:00	18:00	1:00
	Etapa H		8:00	18:00	0:30
	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	od výh.č. 32 - Sc4 a Sc6	Operativně výluka		

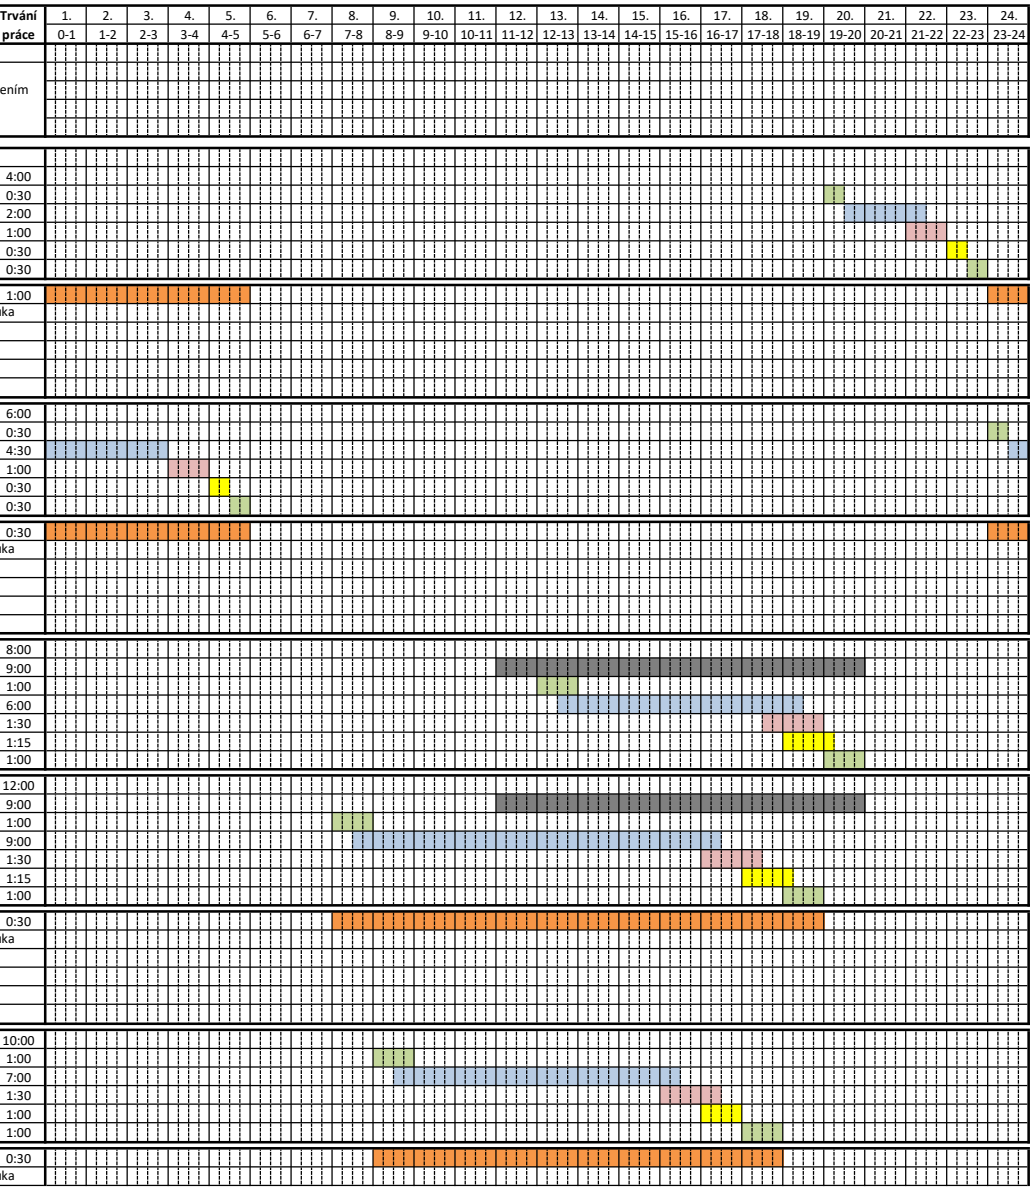

28.11.	Doplnění a úprava štěrkového lože	od výh.č. 32 - Sc4 a Sc6	1x30 min		
	Úprava GPK	od výh.č. 32 - Sc4 a Sc6	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	od výh.č. 32 - Sc4 a Sc6	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	od výh.č. 32 - Sc4 a Sc6	etapou G		
	Etapa I		9:00	17:00	8:00
29.11.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	1c; 1; od Se32 - Sc1	9:00	10:00	1:00
	Doplnění a úprava štěrkového lože	1c; 1; od Se32 - Sc1	9:30	15:30	6:00
	Úprava GPK	1c; 1; od Se32 - Sc1	15:00	16:30	1:30
	Dynamická stabilizace	1c; 1; od Se32 - Sc1	15:30	16:45	1:15
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	1c; 1; od Se32 - Sc1	16:00	17:00	1:00
	Etapa J		9:00	17:00	0:30
29.11.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	2c; od Se28 - Sc2	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	2c; od Se28 - Sc2	1x30 min		
	Úprava GPK	2c; od Se28 - Sc2	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	2c; od Se28 - Sc2	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	2c; od Se28 - Sc2	etapou I		
	Etapa K		9:00	17:00	1:00
29.11.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	301; od Se35 - Se36	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	301; od Se35 - Se36	1x60 min		
	Úprava GPK	301; od Se35 - Se36	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	301; od Se35 - Se36	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	301; od Se35 - Se36	etapou I		
	Etapa L		9:00	17:00	8:00
30.11.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	1d; od Lc1 - Se55	9:00	10:00	1:00
	Doplnění a úprava štěrkového lože	1d; od Lc1 - Se55	9:30	15:30	6:00
	Úprava GPK	1d; od Lc1 - Se55	15:00	16:30	1:30
	Dynamická stabilizace	1d; od Lc1 - Se55	15:30	16:45	1:15
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	1d; od Lc1 - Se55	16:00	17:00	1:00
	Etapa M		9:00	17:00	1:00
30.11.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	301; od Se49 - Se52	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	301; od Se49 - Se52	1x60 min		
	Úprava GPK	301; od Se49 - Se52	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	301; od Se49 - Se52	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	301; od Se49 - Se52	etapou L		
	Etapa N		9:00	17:00	8:00
1.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	2d; od Lc2-Se56	9:00	10:00	1:00
	Doplnění a úprava štěrkového lože	2d; od Lc2-Se56	9:30	15:30	6:00
	Úprava GPK	2d; od Lc2-Se56	15:00	16:30	1:30
	Dynamická stabilizace	2d; od Lc2-Se56	15:30	16:45	1:15
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	2d; od Lc2-Se56	16:00	17:00	1:00
	Etapa O		9:00	17:00	0:30
1.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	Lc1 - Se55	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	Lc1 - Se55	1x30 min		
	Úprava GPK	Lc1 - Se55	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	Lc1 - Se55	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	Lc1 - Se55	etapou N		
	Etapa P		9:00	17:00	1:00
1.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	výh.č. 80 - Se63	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	výh.č. 80 - Se63	1x60 min		
	Úprava GPK	výh.č. 80 - Se63	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	výh.č. 80 - Se63	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	výh.č. 80 - Se63	etapou N		
	Etapa R		7:00	17:00	10:00
4.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	2d; 102; Se74-Sc102	7:00	8:00	1:00
	Doplnění a úprava štěrkového lože	2d; 102; Se74-Sc102	7:30	15:30	8:00
	Úprava GPK	2d; 102; Se74-Sc102	15:00	16:30	1:30
	Dynamická stabilizace	2d; 102; Se74-Sc102	15:30	16:45	1:15
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	2d; 102; Se74-Sc102	16:00	17:00	1:00
	Etapa S		7:00	17:00	1:00
4.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	6b; výh.č. 102 - Se68; Se77 - výh.č. 130	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	6b; výh.č. 102 - Se68; Se77 - výh.č. 130	1x60 min		
	Úprava GPK	6b; výh.č. 102 - Se68; Se77 - výh.č. 130	v souběhu		

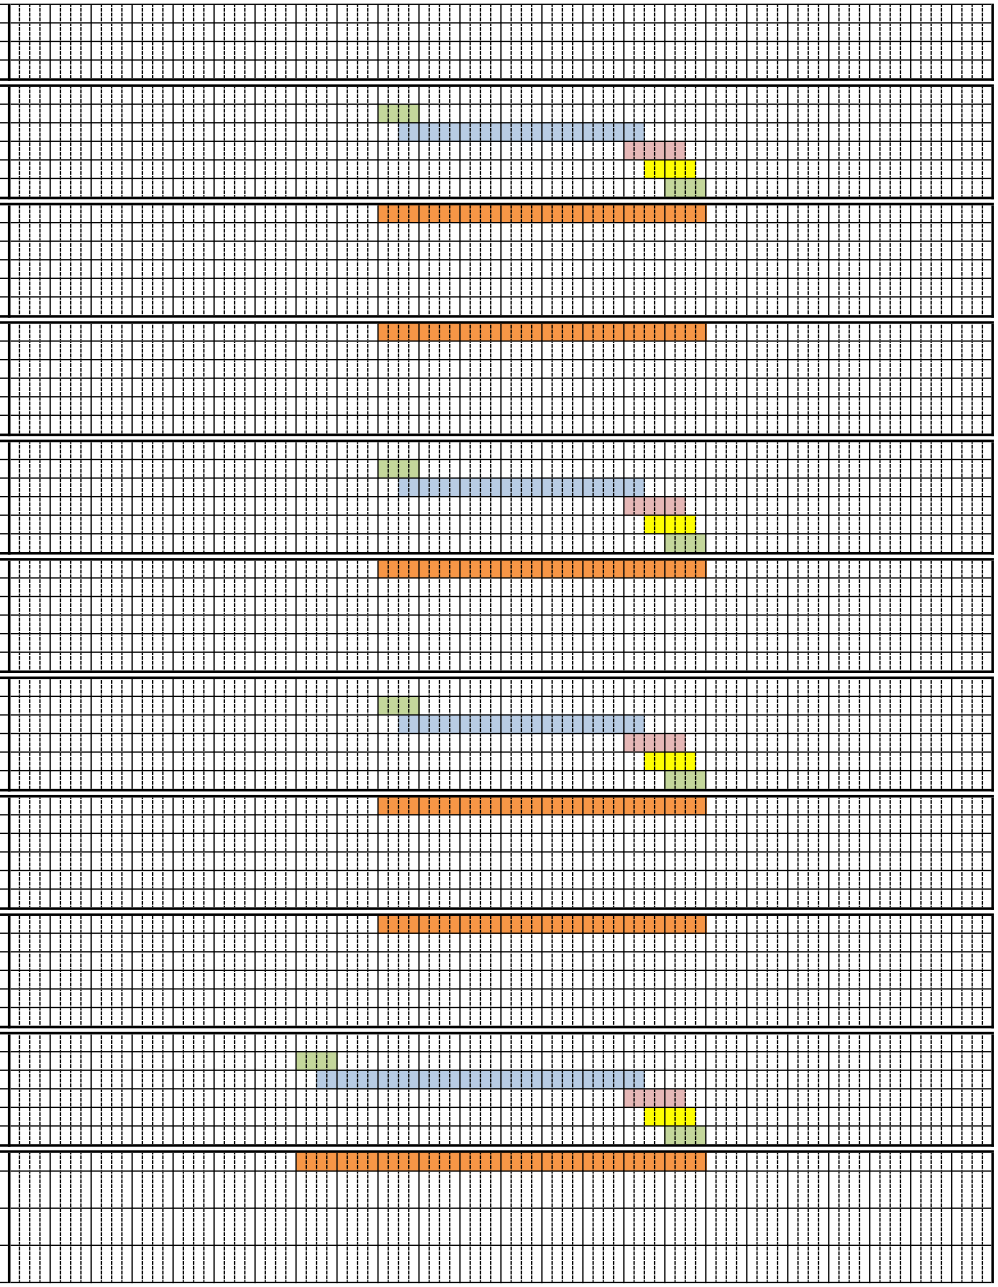

	Dynamická stabilizace	6b; výh.č. 102 - Se68; Se77 - výh.č. 130	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	6b; výh.č. 102 - Se68; Se77 - výh.č. 130	etapou R		
	Etapa T		7:00	17:00	0:30
4.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	výh.č. 141-Sc100;	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	výh.č. 141-Sc100;	1x30 min		
	Úprava GPK	výh.č. 141-Sc100;	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	výh.č. 141-Sc100;	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	výh.č. 141-Sc100;	etapou R		
	Etapa U		7:00	17:00	1:00
4.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	104; výh.č. 135 - Sc104	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	104; výh.č. 135 - Sc104	1x60 min		
	Úprava GPK	104; výh.č. 135 - Sc104	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	104; výh.č. 135 - Sc104	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	104; výh.č. 135 - Sc104	etapou R		
	Etapa V		7:00	17:00	10:00
5.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	1d; 101; Se82 - Sc101	7:00	8:00	1:00
	Doplnění a úprava štěrkového lože	1d; 101; Se82 - Sc101	7:30	15:30	8:00
	Úprava GPK	1d; 101; Se82 - Sc101	15:00	16:30	1:30
	Dynamická stabilizace	1d; 101; Se82 - Sc101	15:30	16:45	1:15
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	1d; 101; Se82 - Sc101	16:00	17:00	1:00
	Etapa W		7:00	17:00	0:30
5.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	výh.č. 131 - Sc100	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	výh.č. 131 - Sc100	1x30 min		
	Úprava GPK	výh.č. 131 - Sc100	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	výh.č. 131 - Sc100	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	výh.č. 131 - Sc100	etapou V		
	Etapa X		7:00	17:00	1:00
5.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	výh.č. 134 - Sc103	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	výh.č. 134 - Sc103	1x60 min		
	Úprava GPK	výh.č. 134 - Sc103	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	výh.č. 134 - Sc103	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	výh.č. 134 - Sc103	etapou V		

- Ruční nářadí
- Vozy se štěrkem; Lokotraktor
- ASP + PUŠL
- Dynamický stabilizátor
- souběhy výluk
- Uzavírka přejezdu; demontáž a montáž přejezdu/přechodu; ruční nářadí
