POSTUP PRÁCE: Oprava GPK 1. a 2. SK Kolín (II. část)

Datum: 1.11.2017

Lokalita: Dopravna Kolín

TÚDÚ:

Předpokládaný začátek / konec výluky: 2.12. / 7.12.2017

Předpokládaná doba výluky: viz níže

Den/č.	Popis práce	Objem prací	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - BEZ VÝLUKY				
	Diagnostika tras technické infrastruktury	soubor	Řešeno před zahájením výluk		
	Laboratorní rozbor kol.lože a zeminy	soubor			
	Zřízení staveniště	soubor			
	Navážení Materiálů	soubor			
	ROV 63390				
2.12.	**Etapa A**		18:00	21:00	3:00
	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	101; 101a; Lc101, Lc100a - Se112	18:00	18:30	0:30
	Doplnění a úprava štěrkového lože	101; 101a; Lc101, Lc100a - Se112	18:15	19:30	1:15
	Úprava GPK	101; 101a; Lc101, Lc100a - Se112	19:15	20:15	1:00
	Dynamická stabilizace	101; 101a; Lc101, Lc100a - Se112	20:00	20:30	0:30
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	101; 101a; Lc101, Lc100a - Se112	20:30	21:00	0:30
	Etapa B		18:00	21:00	1:00
2.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	100a	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	100a	1x60 min		
	Úprava GPK	100a	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	100a	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	100a	etapou A		
	Etapa C		21:00	23:00	2:00
2.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	101a; Se115 - Se123	21:00	21:30	0:30
	Doplnění a úprava štěrkového lože	101a; Se115 - Se123	21:30	22:00	0:30
	Úprava GPK	101a; Se115 - Se123	22:00	22:30	0:30
	Dynamická stabilizace	101a; Se115 - Se123	22:15	22:45	0:30
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	101a; Se115 - Se123	22:30	23:00	0:30
	Etapa D		21:00	23:00	1:00
2.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	Se113-výh.č. 193, po Se119; Se119+výh.č.194-Se124	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	Se113-výh.č. 193, po Se119; Se119+výh.č.194-Se124	1x60 min		
	Úprava GPK	Se113-výh.č. 193, po Se119; Se119+výh.č.194-Se124	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	Se113-výh.č. 193, po Se119; Se119+výh.č.194-Se124	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	Se113-výh.č. 193, po Se119; Se119+výh.č.194-Se124	etapou C		
	Etapa D1		18:00	2:00	1:00
6.-7.12	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení		Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože		1x60 min		
	Úprava GPK		v souběhu		
	Dynamická stabilizace		s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení		etapou G		
	Etapa E		23:00	6:00	7:00
2.-3.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	102; 102a; Lc102, Lc104a, Se114-Se118	23:00	0:00	1:00
	Doplnění a úprava štěrkového lože	102; 102a; Lc102, Lc104a, Se114-Se118	23:30	4:30	5:00
	Úprava GPK	102; 102a; Lc102, Lc104a, Se114-Se118	3:30	5:00	1:30
	Dynamická stabilizace	102; 102a; Lc102, Lc104a, Se114-Se118	4:00	5:15	1:15
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	102; 102a; Lc102, Lc104a, Se114-Se118	5:00	6:00	1:00
	Etapa F		23:00	6:00	0:30
2.-3.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	Se115 - Se123	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	Se115 - Se123	1x30 min		
	Úprava GPK	Se115 - Se123	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	Se115 - Se123	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	Se115 - Se123	etapou E		
	Etapa G		18:00	2:00	8:00
6.-7.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	101b; Se115-Se123; Se142-Sc101c	18:00	19:00	1:00
	Doplnění a úprava štěrkového lože	101b; Se115-Se123; Se142-Sc101c	18:30	23:30	5:00
	Úprava GPK	101b; Se115-Se123; Se142-Sc101c	23:00	0:30	1:30
	Dynamická stabilizace	101b; Se115-Se123; Se142-Sc101c	0:00	1:15	1:15
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	101b; Se115-Se123; Se142-Sc101c	1:00	2:00	1:00
	Etapa H		2:00	6:00	4:00

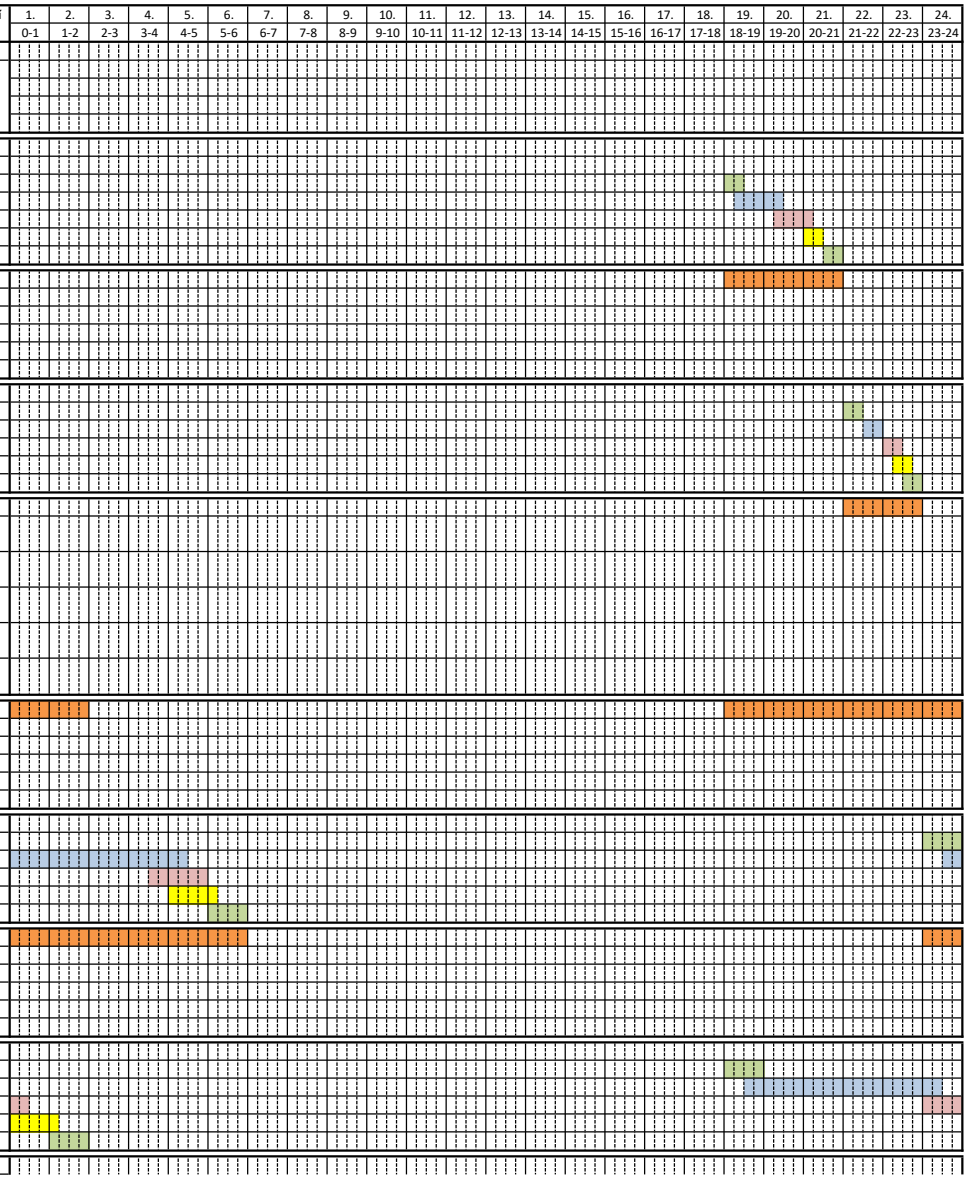

7.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	102a; Se143-Sc102b	2:00	2:30	0:30
	Doplnění a úprava štěrkového lože	102a; Se143-Sc102b	2:30	4:30	2:00
	Úprava GPK	102a; Se143-Sc102b	4:00	5:00	1:00
	Dynamická stabilizace	102a; Se143-Sc102b	4:30	5:30	1.00
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	102a; Se143-Sc102b	5:30	6:00	0:30
	Etapa I		2:00	6:00	0:30
7.12.	Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení	101b; Se142-Sc101c	Operativně výluka		
	Doplnění a úprava štěrkového lože	101b; Se142-Sc101c	1x30 min		
	Úprava GPK	101b; Se142-Sc101c	v souběhu		
	Dynamická stabilizace	101b; Se142-Sc101c	s		
	Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení	101b; Se142-Sc101c	etapou H		

- Ruční nářadí
- Vozy se štěrkem; Lokotraktor
- ASP + PUŠL
- Dynamický stabilizátor
- souběhy výluk
