Harmonogram prací aktualizovaný vlivem změny PD 05/2017

ZZSPk Manětín

číslo	technologie	dny	týdny	zahájení	ukončení
1	**doba výstavby**	161	23	4.5.17	12.10.17
2	Převzetí staveniště	1	0	4.5.17	5.5.17
3	Zemní práce	14	2	9.5.17	23.5.17
4	Základy,zvláštní zakládání	10	1	26.5.17	5.6.17
5	Svislé a kompletní konstrukce	45	6	11.6.17	26.7.17
6	Vodorovné konstrukce a konstrukce suché výstavby	65	9	26.6.17	30.8.17
7	Komunikace	5	1	21.9.17	26.9.17
8	Úpravy povrchů, omítky	14	2	15.7.17	29.7.17
9	Upravy povrchů vnitřní	31	4	10.8.17	10.9.17
10	Upravy povrchů vnější	45	6	10.8.17	24.9.17
11	Podlahy a podlahové konstrukce	10	1	1.9.17	11.9.17
12	Výplně otvorů	10	1	12.9.17	22.9.17
13	Doplňující práce na komunikaci	2	0	18.9.17	20.9.17
14	Lešení a stavební výtahy	50	7	7.8.17	26.9.17
15	Dokončovací kce na pozem.stav.	5	1	5.9.17	10.9.17
16	Staveništní přesun hmot	120	17	1.6.17	29.9.17
17	Izolace proti vodě	70	10	1.6.17	16.8.17
18	Izolace tepelné	20	3	1.9.17	21.9.17
19	Vnitřní kanalizace	105	15	10.6.17	23.9.17
20	Vodovod	105	15	10.6.17	23.9.17
21	Vytápění	105	15	10.6.17	23.9.17
22	Konstrukce tesařské	30	4	27.7.17	26.8.17
23	Konstrukce klempířské	10	1	16.8.17	26.8.17
24	Krytiny tvrdé	25	4	21.8.17	15.9.17
25	Konstrukce truhlářské	10	1	14.9.17	24.9.17
26	Konstrukce zámečnické	10	1	14.9.17	24.9.17
27	Podlahy z dlaždic a obklady	30	4	21.8.17	20.9.17
28	Podlahy povlakové	10	1	28.8.17	7.9.17
29	Podlaha garáže - drátkobeton	7	1	21.8.17	28.8.17
30	Obklady keramické	30	4	21.8.17	20.9.17
31	Nátěry	21	3	21.8.17	11.9.17
32	Malby	16	2	10.9.17	26.9.17
33	Elektromontáže	78	11	10.7.17	26.9.17
34	Kolaudace	1	0	2.10.17	3.10.17
35	Vyklizení staveniště	3	0	25.9.17	28.9.17
36	Předání díla	1	0	12.10.17	13.10.17

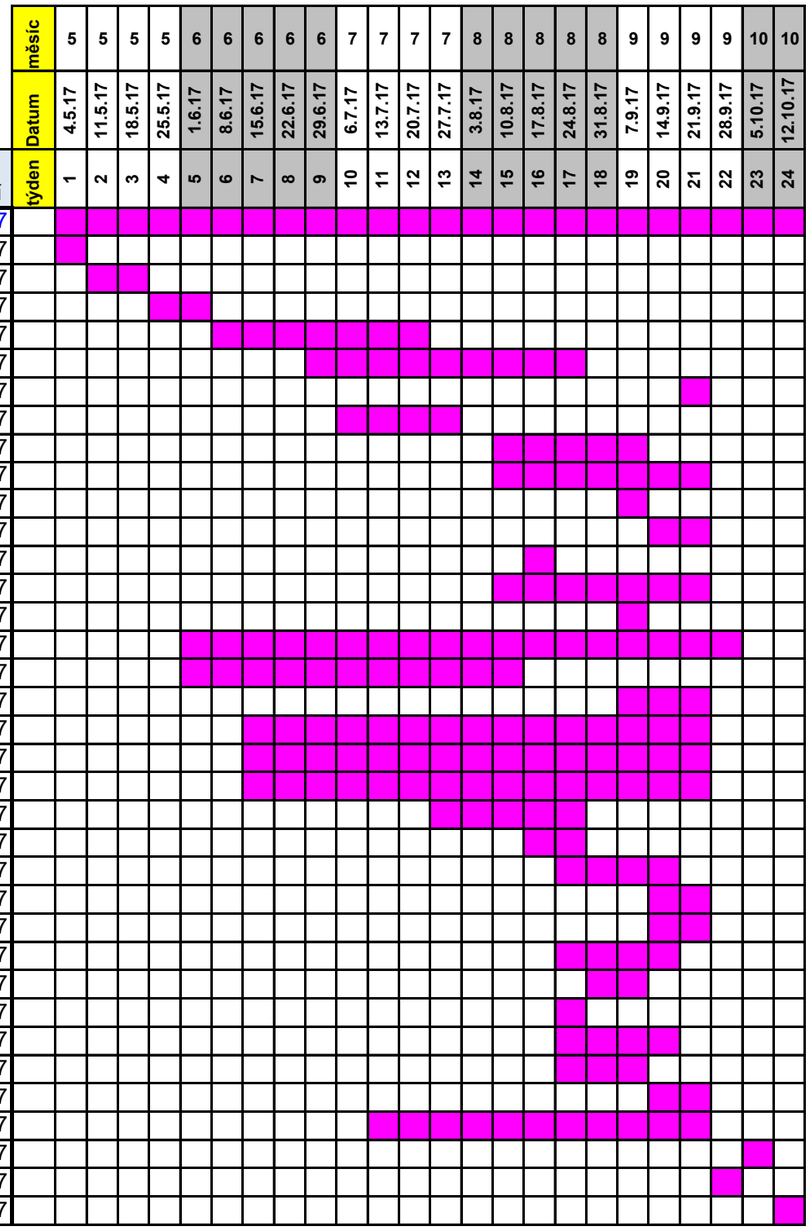

[redacted]

Ing. Jan Zdražil
jednatel
