ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY - „Rapotice – oplocení zakázaného pásma“

Objednatel:
Česká republika – Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
IČ: 00212423

Zhotovitel:
VÁHOSTAV – CZ, organizační složka
Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, Česká republika
IČ: 289 46 898

Vypracoval:
Ing. Zdeněk Čevela

1.6.2016

Ozn. Položky	Popis položky	Doba trvaní ve dnech	Zahájení prací	Ukončení prací		
-	Předání staveniště	1	27.6.2016	27.6.2016		
-	Zahájení stavebních prací	1	28.6.2016	28.6.2016		
	SO 501-02,03 - Demonáž původního a distančního oplocení	13	28.6.2016	10.7.2016		
	SO 501-04,05,06 - Ohradní zeď	167	18.7.2016	31.12.2016	splněno	
	SO 501-07 - Přeložka STL plynovodu	35	25.7.2016	28.8.2016	změna - bude provedeno dříve oproti pův.hrmg	
	SO 501-08.1 -Ochrana stávající dešťové kanalizace	7	26.9.2016	2.10.2016	přesunuto	
	SO 501-08.2 - Ochrana stávající dešťové kanalizace	7	26.9.2016	2.10.2016		
	SO 501-08.3 - Ochrana stávajícího vodovodu	7	26.9.2016	2.10.2016		
	SO 501-08.4 - Ochrana stávajícího vodovodu	7	3.10.2016	9.10.2016		
	SO 501-08.5 - Ochrana stávající dešťové kanalizace	7	3.10.2016	9.10.2016		
	SO 501-08.6 - Ochrana stávající dešťové kanalizace	7	26.9.2016	2.10.2016		
	SO 501-08.7 - Ochrana stávající dešťové kanalizace	7	26.9.2016	2.10.2016	přesunuto	
	SO 501-08.8 - Ochrana stávajícího vodovodu	7	26.9.2016	2.10.2016		
	SO 501-08.9 - Ochrana stávající dešťové kanalizace	7	26.9.2016	2.10.2016		
	SO 501-09.1 - Ochrana sítí NN	7	3.10.2016	9.10.2016		
	SO 501-09.2 - Ochrana sítí NN	7	3.10.2016	9.10.2016		
	SO 501-09.3 - Přeložka sítí NN (pro psinec obj. 024)	21	5.9.2016	25.9.2016		
	SO 501-09.4 - Přeložka sítí NN (pro garáže obj. 014)	21	5.9.2016	25.9.2016		
	SO 501-09.5 - Přeložka sítí NN (pro ubytovnu obj. 004)	21	5.9.2016	25.9.2016		
	SO 501-09.6 - Přeložka sítí V.O. (pro parkoviště)	21	5.9.2016	25.9.2016		
	SO 501-10.1 - Přeložka a ochrana sítí slaboproudu O2 CR a.s.	14	22.8.2016	4.9.2016	přesunuto z důvodu přepojení na 5.9.	
	SO 501-10.2 - Ochrana slaboproudu	14	29.8.2016	11.9.2016		
	SO 501-10.3 - Přeložka slaboproudu (pro psinec obj. 024)	21	5.9.2016	25.9.2016		
	SO 501-10.4 - Přeložka slaboproudu (pro garáže obj. 014)	21	5.9.2016	25.9.2016		
	SO 501-10.5 - Ochrana slaboproudu	7	12.9.2016	18.9.2016		
	SO 501-10.6 - Ochrana slaboproudu	14	12.9.2016	25.9.2016		
	SO 501-10.7 - Ochrana slaboproudu	14	12.9.2016	25.9.2016		
	SO 501-11.1 - Přeložka vodovodu a hydrantu	140	11.7.2016	27.11.2016	splněno bez konstrukcí komunikací	
	SO 501-11.2 - Přeložka hydrantu	7	10.10.2016	16.10.2016		
	SO 501-11.3 - Přeložka vodovodu	21	11.7.2016	31.7.2016	splněno	
	SO 501-12 - Přeložka splaškové kanalizace	21	1.8.2016	21.8.2016		
	SO 501-13,14 - Demontáž stávajícího venkovního osvětlení a stávajícího teplovodu	70	11.7.2016	18.9.2016		
	SO 501-15 - Úprava parkoviště	7	21.11.2016	27.11.2016		
	SO 501-16 - Rozšíření komunikace	7	21.11.2016	27.11.2016		
	SO 501-17.1 - Odvodnění exponovaných míst u objektu SO 024	154	4.7.2016	4.12.2016	chybí žlaby a drenáž pod zdí	
	SO 501-17.2 - Odvodnění exponovaných míst u objektu SO 002 a 003	154	4.7.2016	4.12.2016	chybí žlaby a drenáž pod zdí	
	SO 501-17.3 - Odvodnění exponovaných míst v rohu u brány č. 1	154	4.7.2016	4.12.2016	chybí žlaby a drenáž pod zdí	
	SO 501-18 - Zvýšení zabezpečení vstupního objektu a vjezdového koše SO 003	30	1.11.2016	30.11.2016		
	SO 501-19 - Venkovní osvětlení	168	11.7.2016	25.12.2016		
-	Finální úpravy, vyklizení staveniště	6	26.12.2016	31.12.2016		
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	188	27.6.2016	31.12.2016		
	Předání stavby	1	31.12.2016	31.12.2016		
	Zabezpečení vstupního objektu	30	1.9.2016	30.9.2016		
	Příprava kabeláží k rohům zdi	30	1.10.2016	31.10.2016		
	Instalace kamer a čidel na dokončenou zeď	28	1.1.2017	15.1.2017		
-	Připojení systémů do grafické nadstavby, zkušební provoz	14	15.1.2017	22.1.2017		
finanční plán v Kč bez DPH						
tavby v Kč bez DPH a bez rezervy					**0**	

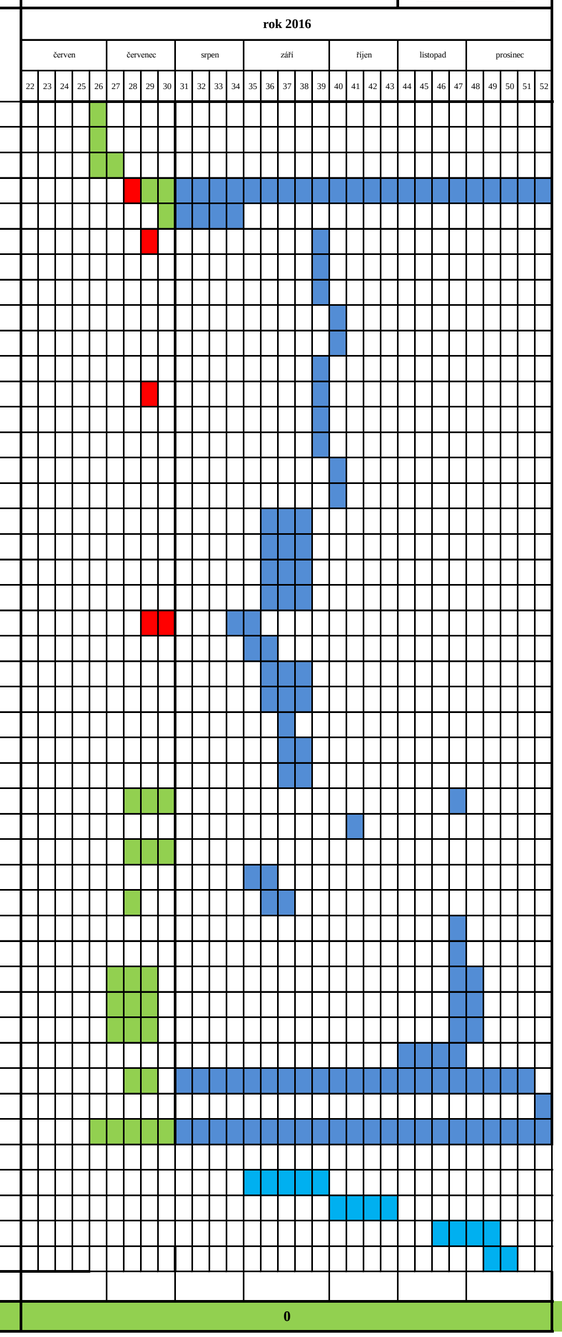

LEGENDA:

- nezahájení staveb.prací
- provedené stavební práce
- plánované stavební práce
