ID	Název úkolu	Poznámky	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	TECHNOLOGICKY POSTUP VYLUKOVYCH PRACI				
2	**Výměna mostnic na žel. mostě kol.č.2 v km 2,080 trati Praha hl.n.-Praha Vyšehrad**				
3					
4	**Práce v nepřetržité výluce**		**3 dny**	**30.3. 2018 6:00**	**1.4. 2018 22:00**
5	**Snesení železničního svršku**	**20m**	**0,56 dny**	**30.3. 2018 6:00**	**30.3. 2018 15:00**
6	Řezání kolejnic pilou	4 ks	1 hodina	30.3. 2018 6:00	30.3. 2018 7:00
7	Rozebrání koleje na pražcích dřevěných v ose	20 m	1 hodina	30.3. 2018 7:00	30.3. 2018 8:00
8	Rozebrání koleje na ocelových mostech	23,08 m	7 hodin	30.3. 2018 8:00	30.3. 2018 15:00
9	Demontáž mostnic a pozednic	40 ks	7 hodin	30.3. 2018 15:00	30.3. 2018 22:00
10	Čištění a nátěr horních ploch podélníků	9,52 m2	6 hodin	30.3. 2018 19:00	31.3. 2018 9:00
11	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	2 ks	5 hodin	31.3. 2018 6:00	31.3. 2018 11:00
12	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu	38 ks	20 hodin	31.3. 2018 8:00	1.4. 2018 12:00
13	Údržba OK mostů - očistění, nátěr, namazání ložisek	4 ks	5 hodin	31.3. 2018 9:00	31.3. 2018 14:00
14	**Montáž železničního svršku**		**0,63 dny**	**1.4. 2018 12:00**	**1.4. 2018 22:00**
15	Kolej z kolejnic S49 rozdělení d pražce dřevěné v ose	20 m	4 hodin	1.4. 2018 12:00	1.4. 2018 16:00
16	Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnici	23.08 m	4 hodin	1.4. 2018 16:00	1.4. 2018 20:00
17	Jednotlivý svar kolejnic termitem, krátký předehřev, široká spára, tvar S 49	4ks	4 hodin	1.4. 2018 18:00	1.4. 2018 22:00
18	Hlavní prohlídka a ukončení výluky		0 dny	1.4. 2018 22:00	1.4. 2018 22:00

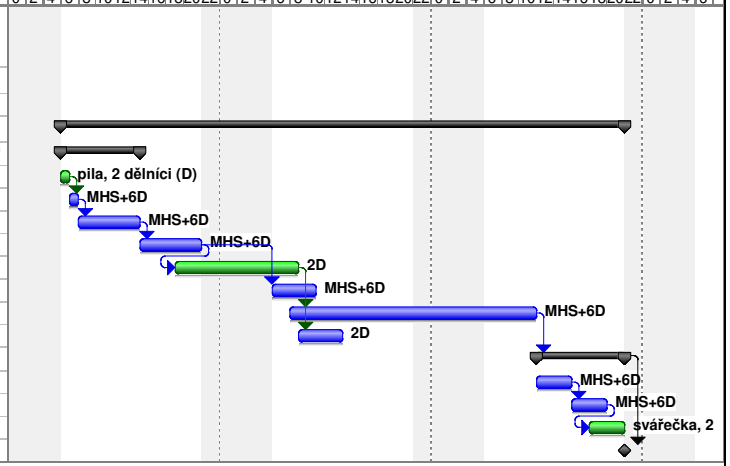

Projekt: HMNG výlukový km 2_080 Pr
Datum: 21.12. 2017 15:12

Úkol	Souhrnný	Zahrnutý průběh	Souhrn projektu		
Průběh	Zahrnutý úkol	Rozdělení	Seskupit podle souhrnu		
Milník	Zahrnutý milník	Vnější úkoly	Konečný termín		
