REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ÚPRAVNY VODY PLZEŇ

HMG VĚCNÝ
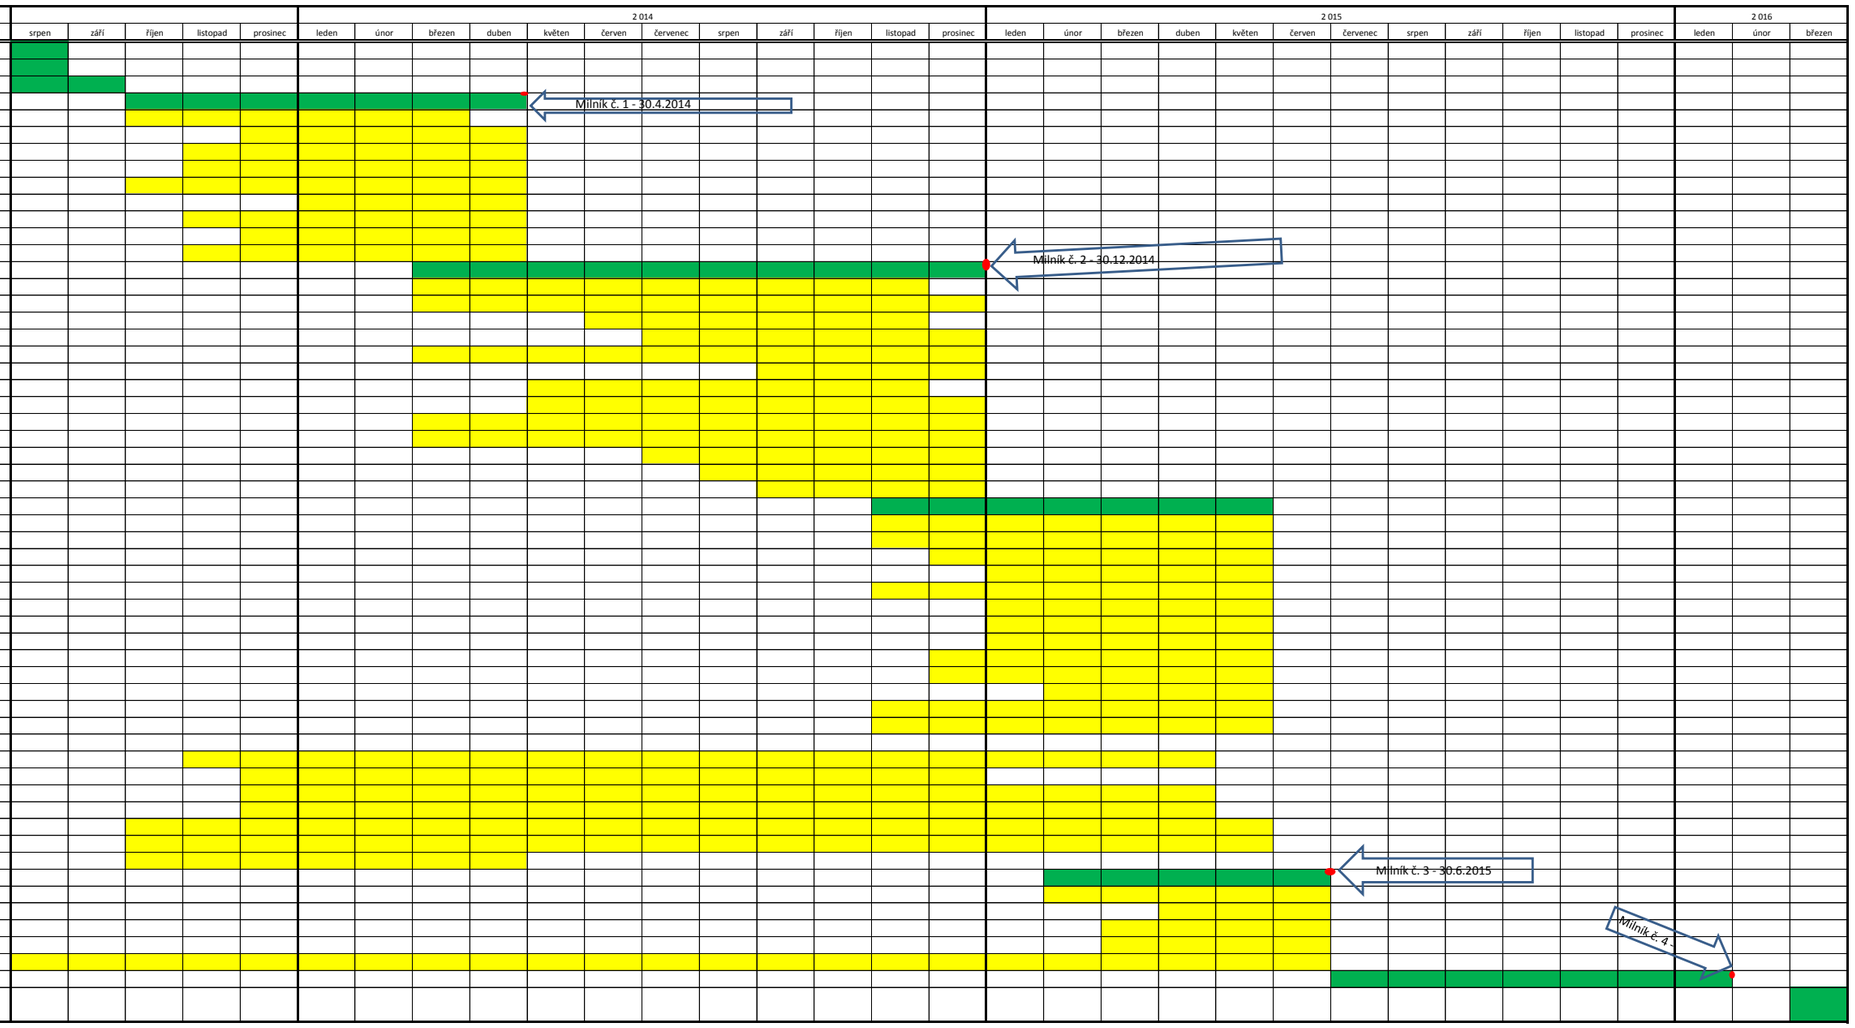
			zahájení	dokončení	počet měsíců
		Uzavření SoD	5.8.2013	5.8.2013	
		Předání staveniště	15.8.2013	15.8.2013	
1. celek		1. etapa (přípravné práce. ZS)	16.8.2013	30.9.2013	1
	UČD 1	2. etapa	1.10.2013	30.4.2014	7
		SO 1102 jemné česle, ČS surové vody a rozvodna			
		PS 1102 jemné česle			
		SO 1601 kanály surové vody			
		SO 1604 výměna řadu dopravujícího vodu na ÚV III			
		SO 2206 akumulace upravené vody (B)			
		PS 2209 akumulace upravené vody (B)			
		SO 2207 akumulace upravené vody (C)			
		PS 2210 akumulace upravené vody (C)			
		SO 2603 propojovací potrubí do akumulace B, C			
	UČD 2	3. etapa	3.3.2014	30.12.2014	10
		SO 2201 budova reakčních nádrží, dávkování			
		SO 2203 budova filtrace			
		PS 2203 písková filtrace			
		PS 2204 ČS prací vody			
		SO 2205 akumulace upravené vody (A)			
		PS 2208 akumulace upravené vody			
		SO 2208 ČS upr. vody ÚV III (vč. dmych. a rozvod.)			
		SO 2403 dávkování ox. uhl. a desinfekce			
		SO 2604 sanace vodovodních řadů v areálu ÚV			
		SO 2606 rekonstrukce kanal. odpadů v areálu ÚV			
		PS 2301 kalové hospodářství			
		PS 2401 chemické hospodářství I			
		PS 2403 chemické hospodářství II			
2. celek		4. etapa	3.11.2014	29.5.2015	7
		SO 2101 jímání surové vody (ÚV III)			
		PS 1103 ČS surové vody			
		PS 2101 jímání surové vody			
		PS 2201 přítok surové vody, reakční nádrž			
		SO 2204 ozonizace, ČS na GAU a nádrž recirkulátu			
		PS 2205 ozonizace			
		PS 2206 ČS na GAU			
		PS 2207 filtrace přes GAU			
		SO 2602 řad z filtrace GAU do akumulace			
		SO 2601 výtlačný řad z ozon. na filtraci s GAU			
		PS 2407 UV záření			
		PS 2501 transformační stanice			
		PS 2502 vnější kabelové rozvody			
		2. - 4. etapa			
		SO 2211 elektroinstalace stavební			
		SO 2212 vytápění			
		SO 2213 vzduchotechnika			
		SO 2214 zdravotně-technická instalace			
		PS 1601 SŘTP (ÚV II)	1.10.2013	31.5.2015	20
		PS 2601 SŘTP (ÚV III)	1.10.2013	31.5.2015	20
		SO 2202 sedimentační nádrže			
		5. etapa	1.2.2015	30.6.2015	5
		SO 2607 rekonstrukce zpevněných ploch			
		SO 2608 terénní a sadové úpravy			
		SO 2609 venkovní osvětlení			
		SO 2610 protipovodňová opatření			
		Všeobecné položky			23
		Zkušební provoz celé technologické linky	1.7.2015	31.1.2016	7
		Termín pro vydání kolaudačnoho souhlasu, odstranění zbývajících vad a převzetí díla		31.3.2016
