Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly
Organizace výstavby
Řádkový harmonogram

Legenda: D=denní, N=nepřetržitá

- připravné a dokončující práce (předání TP, KZP)
- hlavní stavební práce (včetně práce za dílčí výluky)
- práce za nickolejného provozu (v noční vlakové pauze - 4 hod.)
- aktivace zabezpečovacího zař.
- provoz po jedné TK!

Úsek číslo a název	Stavební postup: číslo	vliv na dopravu	rozhodující a kolejové práce	ostatní klíčové objekty a práce	měs.	týdny	dny	od/do
0.a Č.Brod-Úvaly	0.a-0	bez vlivu	předání staveniště, přípravné práce, předání TP a KZP	vytýčení sítí, hranic, přístupy na staveniště	-	3	21	4.11.-25.11.
	0.a-1	D výluka k.č.1+noční pauzy k.č.0	vybudování prov. nást. u kol.č.0 (1)	SO 1111, Rostoklaty, Tuklaty, SO 6102	-	-	2	25.11.-27.11.
	0.a-2	D výluka k.č.2+noční pauzy k.č.0	vybudování prov. nást. u kol.č.0 (2)	SO 1111, Rostoklaty, Tuklaty, SO 6102	-	-	2	27.11.-29.11.
	0.a-3	bez vlivu		kabelizace zz	-	3	21	11.11.-2.12.
	0.a-4	D výluka k.č.1+noční pauzy k.č.0	demontáž provizorního nástupiště u kol.č.0 (1)	SO 1111, Rostoklaty, Tuklaty, SO 6102	-	1	7	4.4.-8.4.
	0.a-5	D výluka k.č.2+noční pauzy k.č.0	demontáž provizorního nástupiště u kol.č.0 (2)	SO 1111, Rostoklaty, Tuklaty, SO 6102	-	1	7	11.4.-15.4.
0.b Úvaly - Vysunuté spojky	0.b-0	bez vlivu	předání staveniště, přípravné práce, předání TP a KZP	smýcení vegetace, vytýčení, přístupy, ZS	-	3	21	4.11.-25.11.
	0.b-1	D výluka k.č.2	výluka k.č.2	TV SO 5101, lávka SO 2920, prop. SO 1031, most SO 2001, kabelizace ZZ	-	3	21	17.3.-7.4
	0.b-2	N výluka k.č.1+noční pauzy k.č.0+2	těleso, odvodnění a svršek k.č.1, SO 1101,1102	TV SO 5101, lávka SO 2920, prop. SO 1031, most SO 2001, kabelizace ZZ	1,5	7	49	7.4.-26.5.
	0.b-3	N výluka k.č.0+noční pauzy k.č.1	spodek a svršek k.č.0, SO 1101,1102	prop. SO 1031, most SO 2001, kabelizace ZZ, prov.TV SO 5101 na Výmole	1	4	28	26.5.-23.6.
	0.b-4	N výluka k.č.2+noční pauzy k.č.0	spodek a svršek k.č.2, SO 1101,1102	prop. SO 1031, most SO 2001, kabelizace ZZ	1	3	21	23.6.-14.7.
	0.b-5	D výluky		aktivace prov. ZZ na vysunutých spojkách	-	1	7	14.7.-21.7.
	0.b-6	N výluka k.č.2	spodek a svršek k.č.2, SO 1101,1102 na Výmole	most SO 2100 Výmola, TV SO 5101, PHS SO 3101 u k.č.2, kabelizace ZZ	3,5	14	98	24.7.-30.10.
	0.b-7	N výluka k.č.1+0	spodek a svršek k.č.1,0, SO 1101,1102 na Výmole	most SO 2100 Výmola, TV SO 5101, PHS SO 3101 u k.č.1	4,2	18	127	2.3.-7.7.
I. ŽST Úvaly	I.-0	bez vlivu	předání staveniště, přípravné práce, předání TP a KZP	smýcení vegetace, vytýčení, přístupy, ZS	1	4	28	4.11.-2.12.
	I.-1	D výluka k.č.1+noční pauzy k.č.0	vybudování prov. nást. u k.č.0 (1)		-	-	1	4.12.-5.12.
	I.-2	bez vlivu, pauzy k.č.1+2	demontáž rušených částí kolejiště SO 1101	demolice kolidujících objektů SO4191, kabelizace ZZ	1	4	28	4.11.-2.12.
	I.-3	N lokální výluka k.č.2,4+noční pauzy k.č.0	dílčí demontáže a zpětné montáže k.č.2, 4, SO 1101	TV SO 5101, kabelovod SO 1171, dílčí demolice SO 1111, kabelizace ZZ	0,5	3	21	17.3.-7.4
	I.-4	N lokální výluka k.č.1,3+noční pauzy k.č.0	dílčí dem.+mont. svršku SO 1101, k.č.1,3	TV SO 5101, PHS SO 3102, kabelovod SO 1171, kabelizace ZZ	1	5	35	7.4-12.5.
	I.-5	N lokální výluka k.č.0+noční pauzy k.č.2	dílčí dem.+mont. svršku SO 1101, k.č.0	TV SO 5101, kabelovod SO 1171, kabelizace ZZ	-	-	2	26.4.-27.4.
	I.-6	N výluka k.č.0		kabelizace ZZ, průchod pod kolejí č.0	-	-	2	2.6.-3.6.
	I.-7	D lokální výluka k.č.0,2,4		realizace pažení mezi kol.č.0 a 2 pro podchod SO 2101	-	-	2	19.7.-21.7.
	I.-8	N výluka k.č.0,2	podélné trativody mezi k.č.0 a 2	TV SO 5101 vložení dělečů a izolací	-	1,5	10	21.7.-31.7.
	I.-9	N výluka k.č.2,4	spodek, svršek k.č.2,4,6, SO 1101,1102, nástupiště SO 1111, přejezd	podchod SO2101+SO2102,PHS SO3101,3102,zastřešení SO4111,most SO2103,lávka SO2901,	3	12	84	1.8.-23.10.
	I.-10	D výluky		TV SO 5101, aktivace prov. ZZ včetně pražského zhlaví ŽST Úvaly	0,5	2	14	23.10.-6.11.
	I.-11	N výluka k.č.0,1,3	spodek, svršek k.č.0,1,3, SO 1101,1102, nástupiště SO 1111, dem.prov.nást., přejezd	PS 0111 aktivace prov. ZZ včetně pražského zhlaví ŽST Úvaly, podchod SO2101+SO2102,PHS SO3101,3102,zastřešení SO4111,most SO2103,lávka SO2901, TV SO 5101	2,5	11	77	2.3.-18.5.
	I.-12	N výluka k.č.1,3	spodek, svršek k.č.1,3, SO 1101,1102, nástupiště SO 1111	PS 0111 aktivace definitivního zab.zař., podchod SO2101+SO2102,PHS SO3101,3102,3103,3105, zastřešení SO4111,most SO2103,lávka SO2901, TV SO 5101	1,5	6	42	20.4.-1.6.
	I.-13	N výluka k.č.0 na pražském zhlaví+noční pauzy k.č.1,2	spodek, svršek k.č.0, SO 1101,1102, N výh.č.18-21	TV SO5101	1,5	5	36	1.6.-7.7.
	I.-14	N výluka k.č.0,2, N výluka částí k.č.1+noční pauzy	spodek,svršek,odvodnění,kanalizace, SO1101,1102	TV SO5101, PHS 3105	1	4	27	7.7.-3.8.
	I.-15	N výluka k.č.4 na pražském zhlaví	spodek,svršek,odvodnání, SO1101,1102	TV SO5101	0,5	2	14	3.8.-17.8.
	I.-16	N výluka k.č.2,4 na pražském zhlaví	spodek,svršek,odvodnání, SO1101,1102	TV SO5102	0,5	3	21	17.8.-7.9.
II. Úvaly-Blatov	II.-0	bez vlivu	předání staveniště, přípravné práce, předání TP a KZP	smýcení vegetace, vytýčení, přístupy, ZS	1	5	35	4.11.-9.12.
	II.-1	D výluka k.č.1+noční pauzy k.č.0	vybudování prov. nást. u kol.č.0 (1)	SO 1211, Klánovice, demolice částí zastřešení Klánovice SO4211, demolice objektů SO4291	-	-	2	29.11.-1.12.
	II.-2	D výluka k.č.2+noční pauzy k.č.0	vybudování prov. nást. u kol.č.0 (2)	SO 1211, Klánovice, demolice částí zastřešení Klánovice SO4211 demolice objektů SO4291	-	-	2	1.12.-3.12.
	II.-3	N lokální výluka k.č.2+noční pauzy k.č.0	dílčí demontáž a zpětná montáž k.č.2	domol. částí nást. SO1211,pažicí stěna podch.,mostní prov. SO 2203,lávky SO2902,2903,2904,2905, TV SO5201 kab.ZZ	-	3	21	17.3.-7.4
	II.-4	N lokální výluka k.č.0, provoz po jedné koleji!!!	dílčí demontáž a zpětná montáž k.č.0, podélný trativod SO 1202	pažicí stěna podchodu, mostní provizorium SO 2203, kabelizace ZZ (přechod k.č.1,0), TV SO 5201		1	5	17.4-21.4.
	II.-5	N výluka k.č.1 + noční pauzy k.č.0,2	dílčí dem. a montáž k.č.1, spodek, odvodnění SO 1202, nástup. SO1211	domol.částí nást. SO1211,mosty SO2201,2202,podchod SO2203,lávky SO2902,2903,2904,2905, prop.SO1231,TV SO5201,kabelizace ZZ	2	9	63	7.4.-9.6.
	II.-6	N výluka k.č.0+noční pauzy k.č.1,2	dílčí demontáž a zpětná montáž k.č.0, spodek, odvodnění SO 1202	mosty SO2201,2202,podchod SO2203, demontáž provizoria, prop. SO1231,TV SO5201,kabelizace ZZ	1	5	35	9.6.-14.7.
	II.-7	noční pauzy k.č.0, 1, 2		TV SO5201, osazování bran, převěšování, lávky SO2902,2903,2904,2905, kabelizace ZZ	1,5	6	42	27.5.-8.7.
	II.-8	N výluka k.č.2	dílčí dem. a montáž k.č.2, spodek, odvod.SO1202, nástup. SO1211	mosty SO2201,2202,podch. SO2203,dem.prov.,demolice části SO2251,prop. SO1231, TV SO5201,přístř.SO4211,kabelizace ZZ	2,5	11	77	28.7.-13.10.
	II.-9	N výluka k.č.0, provoz po jedné koleji!!!	dílčí demontáž a zpětná montáž k.č.0, podélný trativod SO 1202	demolice části starého podchodu SO2251	-	1	7	23.8.-29.8.
	II.-10	noční pauzy k.č.0, 1, 2		TV SO5201, osazování bran, převěšování, lávky SO2902,2903,2904,2905	1	4	28	15.9.-13.10.
	II.-11	N výluka kol.č.1	dílčí demontáž a zpětná montáž k.č.1 s úpravou směru., nástupiště SO1211	PS 0121 aktivace definitivního zab.zař., demolice části starého podchodu SO2251, přístřešky SO4211	1,5	5	36	1.6.-7.7.
	II.-12	N výluka kol.č.2	sanace spodku SO1202	nasazení sanačního stroje v kol.č.2	1	4	28	7.9.-5.10.
	II.-13	N výluka kol.č.1	sanace spodku SO1202	nasazení sanačního stroje v kol.č.1	1	4	28	5.10.-2.11.
	II.-14	N výluka kol.č.0, kol.č.1, provoz po jedné koleji!!!	sanace spodku SO1202 v kol.č.0	nasazení sanačního stroje v kol.č.0	0,5	2	14	2.11-16.11.
	II.-15	N výluka kol.č.0	výměna svršku v ose, SO1201	nasazení obnovovacího stroje na výměnu kolejového roštu	1	4	28	7.9.-5.10.
	II.-16	N výluka kol.č.1	výměna svršku v ose, SO1201	nasazení obnovovacího stroje na výměnu kolejového roštu	1	4	28	5.10.-2.11.
	II.-17	N výluka kol.č.2	výměna svršku v ose, SO1201, demontáž prov.nást. u kol.č.0 (2)	nasazení obnovovacího stroje na výměnu kolejového roštu	0,5	2	14	16.11.-30.11.
	II.-18	D výluka kol.č.1 + noční pauzy k.č.0	demontáž prov.nást. u kol.č.0 (1)	SO 1211, Klánovice		1	5	14.3.-18.3.
III. Odb. Blatov	III.-0	bez vlivu	předání staveniště, přípravné práce, předání TP a KZP	smýcení vegetace, vytýčení, přístupy, ZS	1	5	35	4.11.-9.12.
	III.-1	N výluka k.č.2,2a,102a+noční pauzy k.č.0	odděšování a budování rozšířího tělesa u koleje č.2 SO 1302	realizace TV SO 5301 u kol.č.2, kabelizace ZZ	-	3	21	17.3.-7.4
	III.-2	N výluka k.č.1,1a,1b,101a	terénní úpravy a odvodnění u kol.č.1 SO 1302	realizace TV SO 5301 u kol.č.1, kabelizace ZZ, mosty SO2204, SO2301	1,5	7	49	7.4.-26.5.
	III.-3	noční pauzy k.č.0, 1, 2		realizace TV SO 5301	1,5	6	42	27.5.-8.7.
	III.-4	N výluka k.č.2,2a,102a+noční pauzy k.č.0	spodek, svršek k.č.2,2a,102a, SO 1301, 1302	realizace TV SO 5301 u kol.č.2, kabelizace ZZ, mosty SO2204, SO2301	2,5	11	77	28.7.-13.10.
	III.-5	noční pauzy k.č.0, 1, 2		TV SO5201, osazování bran, převěšování trakce	1	4	28	15.9.-13.10.
	III.-6	N výluka kol.č.0+noční pauzy k.č.2	svršek k.č.0, SO1301, provizorní napojení k.č.0 na N výh.č.7		-	-	2	9.6.-11.6.
	III.-7	N výluka k.č.0a, 1a	spodek, svršek k.č.0a,1a, SO 1301, 1302	realizace TV SO 5301 vyloučených kol., mosty SO2204, SO2301	1	4	28	11.5.-8.6.
	III.-8	N výluka k.č.0, 0a, 1, 1a	spodek, svršek k.č.0, 0a, 1, 1a, 101a, SO 1301, 1302	realizace TV SO 5301 vyloučených kol., mosty SO2204, SO2301	1	4	28	8.6.-7.7.
	III.-9	N výluka k.č.0+noční pauzy k.č.1,2	spodek,svršek k.č.0, SO 1301,1302		1	4	27	7.7.-3.8.
IV.a Blatov-Běchovice	IV.a-0	bez vlivu	předání staveniště, přípravné práce, předání TP a KZP	smýcení vegetace, vytýčení, přístupy, ZS	-	3	21	4.11.-25.11.
	IV.a-1	N výluka kol.č.2a, 102a		realizace TV SO 5401, přípravné práce propustky SO 1432, 1433, 1434, mosty SO 2401, 2402, kabelizace	-	3	21	17.3.-7.4
	IV.a-2	N výluka k.č.101a		realizace TV SO 5401, přípravné práce propustky SO 1432, 1433, 1434, mosty SO 2401, 2402, kabelizace, PHS SO 3401	1	3	21	7.4.-28.4.
	IV.a-3	N výluka k.č.1a		realizace TV SO 5401, přípravné práce propustky SO 1432, 1433, 1434, mosty SO 2401, 2402, kabelizace, PHS SO 3401	1	4	28	28.4.-26.5.
	IV.a-4	noční pauzy k.č.0, 1, 2		realizace TV SO 5401	1,5	6	42	27.5.-8.7.
	IV.a-5	N výluka kol.č.2a, 102a	spodek, svršek k.č.2a,102a, SO 1401, 1402	realizace TV SO 5401, propustky SO 1432, 1433, 1434, mosty SO 2401, 2402, kabelizace	2,5	11	77	28.7.-13.10.
	IV.a-6	noční pauzy k.č.0a, 1a, 101a, 2a, 101a		realizace TV SO 5301	1	4	28	15.9.-13.10.
	IV.a-7	N výluka kol.č.0a, 1a	spodek, svršek k.č.0a, 1a, SO 1401, 1402	realizace TV SO 5401, propustky SO 1432, 1433, 1434, mosty SO 2401, 2402, kabelizace, PHS SO 3401	2	8	57	11.5.-7.6.
	IV.a-8	N výluka kol.č.101a	spodek, svršek k.č.101a	realizace kabelizace, PHS SO 3401	-	1	7	7.6.-14.6.
IV.b Běchovice	IV.b-0	bez vlivu	předání staveniště, přípravné práce, předání TP a KZP	smýcení vegetace, vytýčení, přístupy, ZS	-	3	21	4.11.-25.11.
	IV.b-1	D výluka k.č.2+noční pauzy k.č.0	vybudování prov. nást. u kol.č.0 (2)	SO 1211, Běchovice	-	-	2	4.12.-5.12.
	IV.b-2	D výluka k.č.1+noční pauzy k.č.0	vybudování prov. nást. u kol.č.0 (1)	SO 1211, Běchovice	-	-	2	3.12.-4.12.
	IV.b-3	bez vlivu	průběžná realizace dle navazujících postupů		-	-	-	
	IV.b-4	D výluka k.č.2+noční pauzy k.č.0	demontáž provizorního nástupiště u kol.č.0 (2)	SO 1211, Běchovice	-	1	5	21.3.-25.3.
	IV.b-5	D výluka k.č.1+noční pauzy k.č.0	demontáž provizorního nástupiště u kol.č.0 (1)	SO 1211, Běchovice	-	0,5	4	29.3.-1.4.

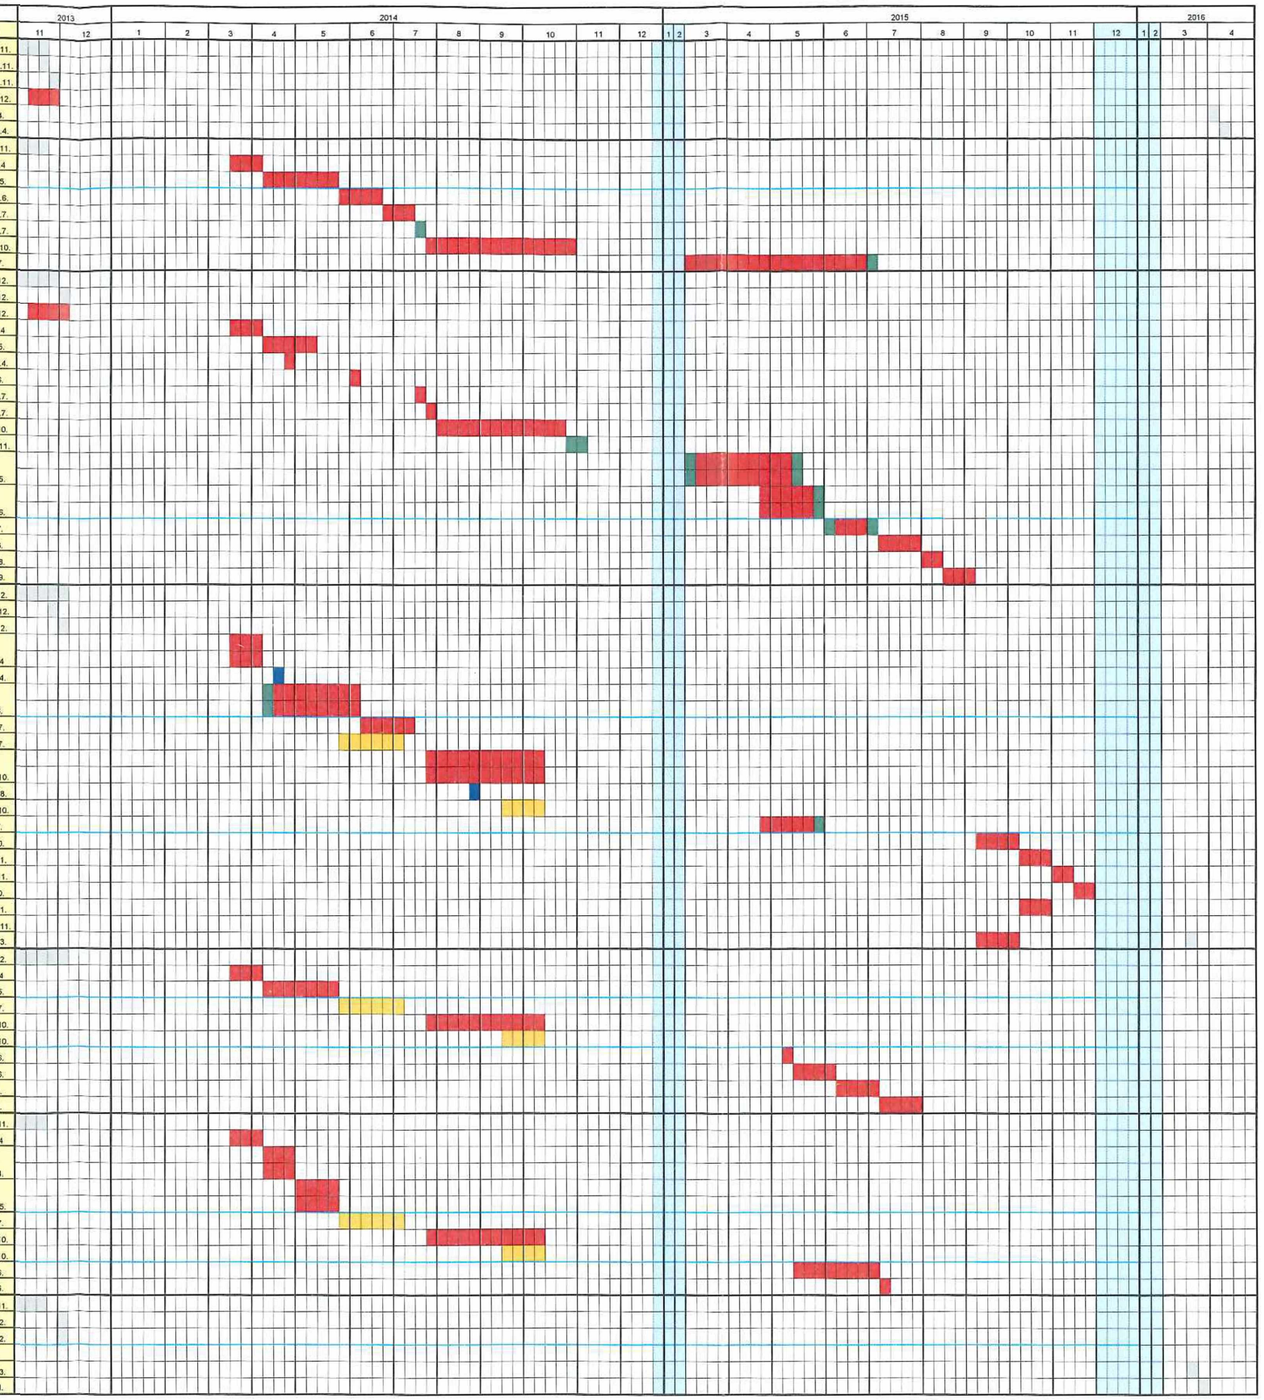

Etapizace postupů výstavby s ohledem na průběh prací v jednotlivých postupech.

Datum aktualizace: 15.10.2013
