Harmonogram stavby "OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště č.p. 494"

Kód položky	Popis	Začátek	Konec	Délka trvání
	Rok			
	Měsíc			
	Týden			
1808	OS Jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště č.p. 494	01.06.2018	28.10.2018	150
HSV	Práce a dodávky HSV	01.06.2018	28.10.2018	150
3	Svislé a kompletní konstrukce	17.08.2018	12.10.2018	57
314231164	Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	24.09.2018	09.10.2018	16
314236135	Krycí deska základní pro 1průduchový cihelný komín	28.09.2018	03.10.2018	6
314236165	Krycí deska základní pro 3průduchový cihelný komín	05.10.2018	12.10.2018	8
349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	17.08.2018	20.09.2018	35
349235861	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 150 mm	24.08.2018	21.09.2018	29
5	Komunikace pozemní	19.10.2018	28.10.2018	10
572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	19.10.2018	23.10.2018	5
572370112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva	26.10.2018	28.10.2018	3
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	01.06.2018	28.10.2018	150
612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	27.07.2018	12.10.2018	78
619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	29.06.2018	11.10.2018	105
622325209	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	22.06.2018	19.10.2018	120
622325602	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 5 v rozsahu do 20%	29.06.2018	26.10.2018	120
622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	01.06.2018	01.06.2018	0
622645001	Kamenické práce - výměna pískovcových obelisků - kompletní provedení (demontáž, výroba replik a montáž)	22.06.2018	25.08.2018	65
622645001b	Kamenické práce - výměna pískovcových čučků - kompletní provedení (demontáž, výroba replik a montáž)	22.06.2018	25.08.2018	65
623645001	Restaurátorské opravy kamene - pískovcový vstupní portál - kompletní provedení	10.08.2018	13.09.2018	35
623645001b	Restaurátorské opravy kamene - žulové ostění vstupních dveří a bočních vrat - kompletní provedení	24.08.2018	15.09.2018	23
623645001c	Restaurátorské opravy kamene - žulové ostění suterenních oken - kompletní provedení	07.09.2018	12.10.2018	36
625681013	Ochrana proti holubům hrotovým systémem třířadým s účinnou šířkou 20 cm	05.10.2018	19.10.2018	15
629991001	Zakrytí podélných ploch geotextílií volně položenou	01.06.2018	03.06.2018	3
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	01.06.2018	01.06.2018	0
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	01.06.2018	02.06.2018	2
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	20.07.2018	22.07.2018	2
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	10.08.2018	11.08.2018	2
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	07.09.2018	08.09.2018	2
632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - průjezd	26.10.2018	28.10.2018	3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	01.06.2018	28.10.2018	150
941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	01.06.2018	15.06.2018	15
941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	19.10.2018	28.10.2018	10
942111121	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m	16.06.2018	18.06.2018	3
942211821	Demontáž lešení vysunutého dílcového s podepřením v 20 m	26.10.2018	27.10.2018	2
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	19.06.2018	23.06.2018	5
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	26.10.2018	27.10.2018	2
944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	24.06.2018	26.06.2018	3
944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	26.10.2018	26.10.2018	1
962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	14.09.2018	23.09.2018	10
967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	20.07.2018	03.10.2018	76
968062244	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	29.06.2018	26.09.2018	90
978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	17.08.2018	21.08.2018	5

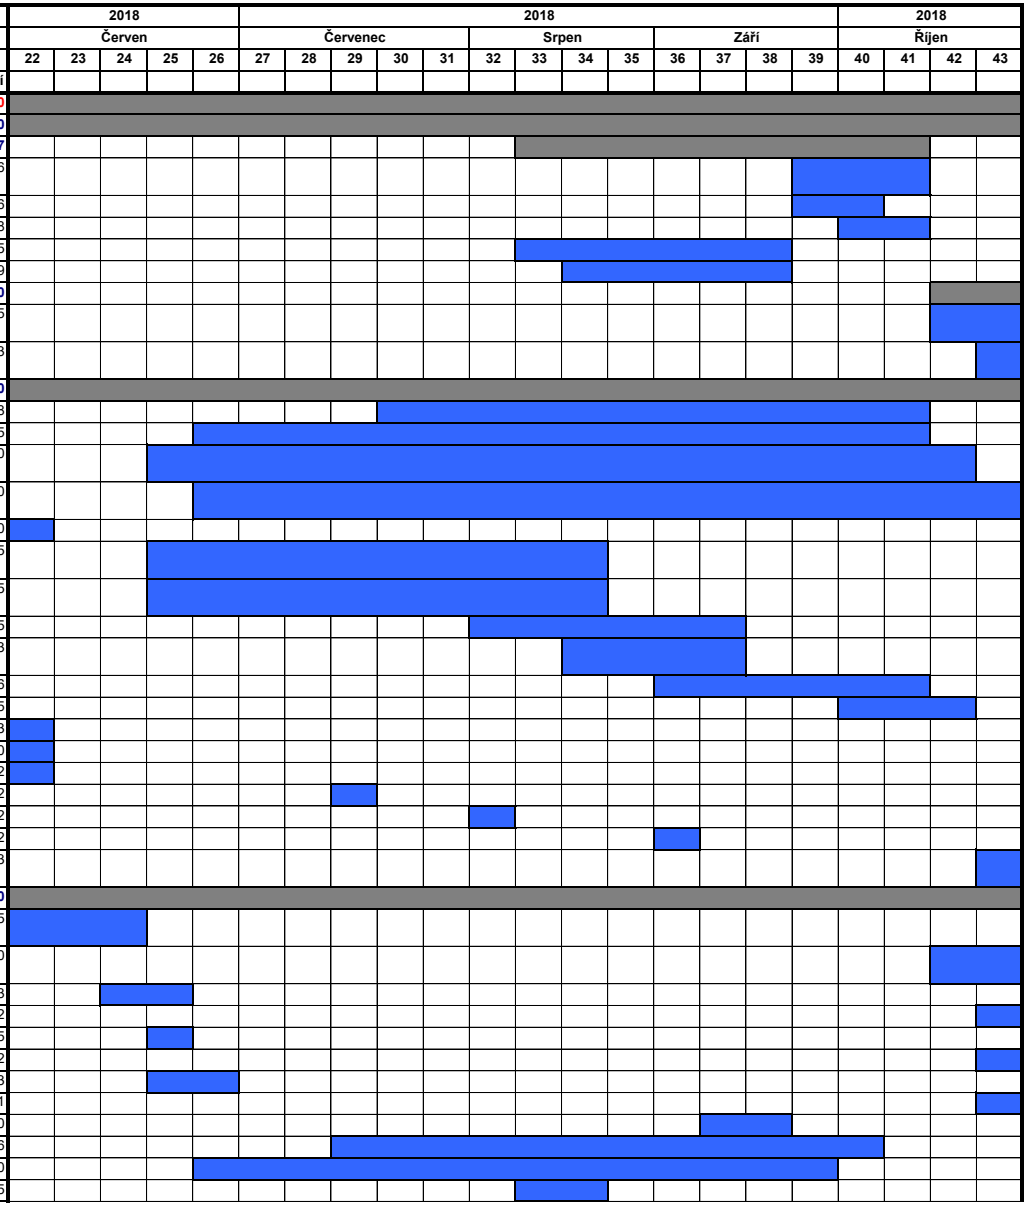
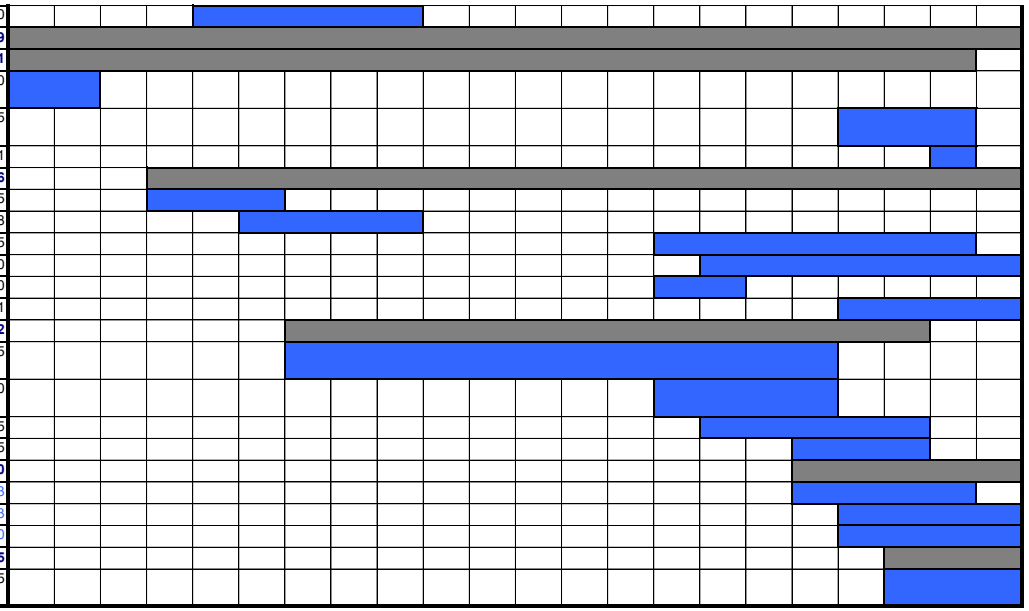
978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	29.06.2018	28.07.2018	30
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**01.06.2018**	**27.10.2018**	**149**
743	**Elektromontáže**	**01.06.2018**	**19.10.2018**	**141**
743621110	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou - kompletní provedení	01.06.2018	10.06.2018	10
743621110	Zpětná montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou - kompletní provedení	05.10.2018	19.10.2018	15
743991100	Revize hromosvodu	19.10.2018	19.10.2018	1
764	**Konstrukce klempířské**	**22.06.2018**	**25.10.2018**	**126**
764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	22.06.2018	06.07.2018	15
764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	06.07.2018	23.07.2018	18
764236444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm	07.09.2018	21.10.2018	45
764238425	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	14.09.2018	23.10.2018	40
764331407	Lemování komínů z Cu plechu	07.09.2018	16.09.2018	10
764538424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	05.10.2018	25.10.2018	21
766	**Konstrukce truhlářské**	**13.07.2018**	**12.10.2018**	**92**
766621113	Dodávka a montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva vč. kování dle PD (1500x2570 mm - pol. 1.01)	13.07.2018	25.09.2018	75
76662111a	Repasování dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva vč. kování dle PD (1500x2570 mm - pol. 1.01	07.09.2018	26.09.2018	20
766682111	Dodávka a montáž průjezdových vrat vč. nátěrů - pol. 1.07 a 1.08	14.09.2018	08.10.2018	25
766694112	Dodávka a montáž parapetních desek dřevěných šířky do 30 cm - špaletová okna	28.09.2018	12.10.2018	15
782	**Dokončovací práce**	**28.09.2018**	**27.10.2018**	**30**
622273201	Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový obousměrný rošt bez tepelné izolace	28.09.2018	20.10.2018	23
782112112	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z kamene do lepidla tl do 30 mm	05.10.2018	27.10.2018	23
782511112	Montáž obkladu ostění z pravoúhlých desek z kamene tl do 30 mm	05.10.2018	24.10.2018	20
784	**Dokončovací práce**	**12.10.2018**	**26.10.2018**	**15**
784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	12.10.2018	26.10.2018	15
