Příloha č.13 - Harmonogram

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Příloha "B1" - Harmonogram	Text2
1		[redacted]						
2		[redacted]						
3		Předání díla 2. etapa	0 dny	30.4. 19	30.4. 19	111		
4		[redacted]						
5		Kolaudace 2. etapy	45 dny	1.5. 19	14.6. 19	3		
6		[redacted]						
7		Přípravné práce + ZS	25 dny	3.7. 17	31.7. 17			
8		**Azbest**	**142 dny**	**27.7. 17**	**18.1. 18**			
13		Foyer + veřejné prostory (osa A-L) - předmětem samostatného HMG	294 dny	4.11. 17	25.10. 18			
14		Zázemí + Technologie (osa L-X)	563 dny	31.7. 17	30.4. 19			
15		**Bourací práce**	**242 dny**	**31.7. 17**	**21.5. 18**			
22		Sanace monolitických konstrukcí	90 dny	27.1. 18	14.5. 18			
23		Technologie stavby	200 dny	18.12. 17	20.8. 18		[redacted]	
24		**Energoblog**	**143 dny**	**22.1. 18**	**9.7. 18**			
32		**Strojovna VZT**	**163 dny**	**5.1. 18**	**16.7. 18**			
41		**Výměníková stanice**	**200 dny**	**18.12. 17**	**20.8. 18**			
44		Rozvodny ELS - stavební část	90 dny	27.1. 18	14.5. 18			
45		Rozvodny ELS - technologie	60 dny	12.6. 18	20.8. 18	44		
46		**CHÚC**	**177 dny**	**22.1. 18**	**17.8. 18**			
56		Vyzdívky	257 dny	5.10. 17	13.8. 18			
57		SDK stěny - 5.NP	98 dny	18.1. 18	14.5. 18			
58		ELS - hrubé rozvody	144 dny	15.11. 17	14.5. 18			
59		VZT - hrubé rozvody	145 dny	6.11. 17	5.5. 18			
60		Voda a kanalizace -hrubé rozvody	145 dny	23.10. 17	21.4. 18			
61		Vytápění - hrubé rozvody	163 dny	23.10. 17	12.5. 18			
62		Omítky 1 etapa	250 dny	27.11. 17	26.9. 18			
63		**Podlahy - betonáž 1. etapa**	**112 dny**	**26.3. 18**	**4.8. 18**			
71		**Podlahy - betonáž 2. etapa**	**116 dny**	**12.7. 18**	**20.11. 18**		[redacted]	
78		SDK podhledy	160 dny	29.1. 18	4.8. 18			
79		Obklady a dlažby - 1. etapa	106 dny	21.5. 18	20.9. 18			
80		Dveře - zárubně - 1. etapa	82 dny	2.7. 18	4.10. 18			
81		Dveře - repas - 1. etapa	94 dny	4.6. 18	20.9. 18			
82		Okna 2PP	25 dny	7.5. 18	4.6. 18			
83		Okna 5NP	25 dny	7.5. 18	4.6. 18			
84		kompletace EPS + ERO + NO kpl	60 dny	13.8. 18	20.10. 18			
85		**kompletace TZB 1. etapa**	**75 dny**	**23.7. 18**	**17.10. 18**			
92		**Podlahy - nášlapná vrstva, 1. etapa**	**137 dny**	**22.6. 18**	**24.11. 18**		nášlapná vrstva ve 2PP a 3PP budou provedeny ve 2. etapě	
100		Výmalba - komplet -1 etapa	46 dny	1.9. 18	25.10. 18			
101		**Truhlářské výrobky 1. etapa**	**83 dny**	**10.8. 18**	**12.11. 18**			
105		Výtahy	90 dny	2.7. 18	13.10. 18			
106		úklid finál -1 etapa	22 dny	1.10. 18	25.10. 18			
107		úklid modrá zóna	46 dny	3.9. 18	25.10. 18			
108		Jevištní technologie 1. etapa	250 dny	4.12. 17	3.10. 18			
109		Jevištní technologie - zkoušky	28 dny	22.9. 18	25.10. 18			
110		[redacted] zkoušky	[redacted] dny	20.[redacted] 18	[redacted]		funkční [redacted] nestihneme v 1 etap	
111		**2. Etapa - dokončení prostor nevyžadovaných divadel**	**232,75 dny**	**1.9. 18**	**30.4. 19**		[redacted]	
112		SDK podhledy	75 dny	1.11. 18	14.1. 19			
113		Dveře - zárubně - 2. etapa	85 dny	1.11. 18	24.1. 19			
114		Dveře repas - 2. etapa	85 dny	1.11. 18	24.1. 19			
115		Prostorová akustika -zkušebna orchestru a velký sál	90 dny	5.11. 18	2.2. 19			
116		obklady a dlažby 2. etapa	80 dny	1.11. 18	19.1. 19	79		
117		omítky	150 dny	1.9. 18	7.2. 19			
118		kompletace TZB 2. etapa	75 dny	1.12. 18	14.2. 19			
125		Podlahy - nášlapná vrstva 2. etapa	144 dny	22.10. 18	15.3. 19			
131		truhlářské výrobky 2. etapa	136 dny	20.11. 18	4.4. 19			
136		vymalba komplet 2. etapa	40 dny	16.3. 19	24.4. 19	125		
137		CHÚC - 2. ETAPA, 1. ČÁST	70 dny	1.12. 18	9.2. 19			
142		**CHÚC - 2. ETAPA, 2. Část**	**70 dny**	**9.2. 19**	**20.4. 19**			
147		Jevištní technologie 2. etapa- velký sál a orchestřiště, večerní pokladna	70 dny	3.2. 19	13.4. 19	115		
148		finální úklid 2. etapa	23 dny	8.4. 19	30.4. 19			
149		**Střecha**	**374 dny**	**1.8. 17**	**23.10. 18**			
150		S1	131 dny	23.10. 17	5.4. 18			
167		S2	141 dny	23.10. 17	17.4. 18			
175		**Střecha nad provazištěm**	**208 dny**	**1.8. 17**	**12.4. 18**			
196		**Střecha nad hledištěm**	**238 dny**	**15.1. 18**	**20.10. 18**			
197		demontáž + zakrytí stávajících konstrukcí pod střešní	24 dny	6.4. 18	3.5. 18			
198		projekt statika	35 dny	15.1. 18	23.2. 18			

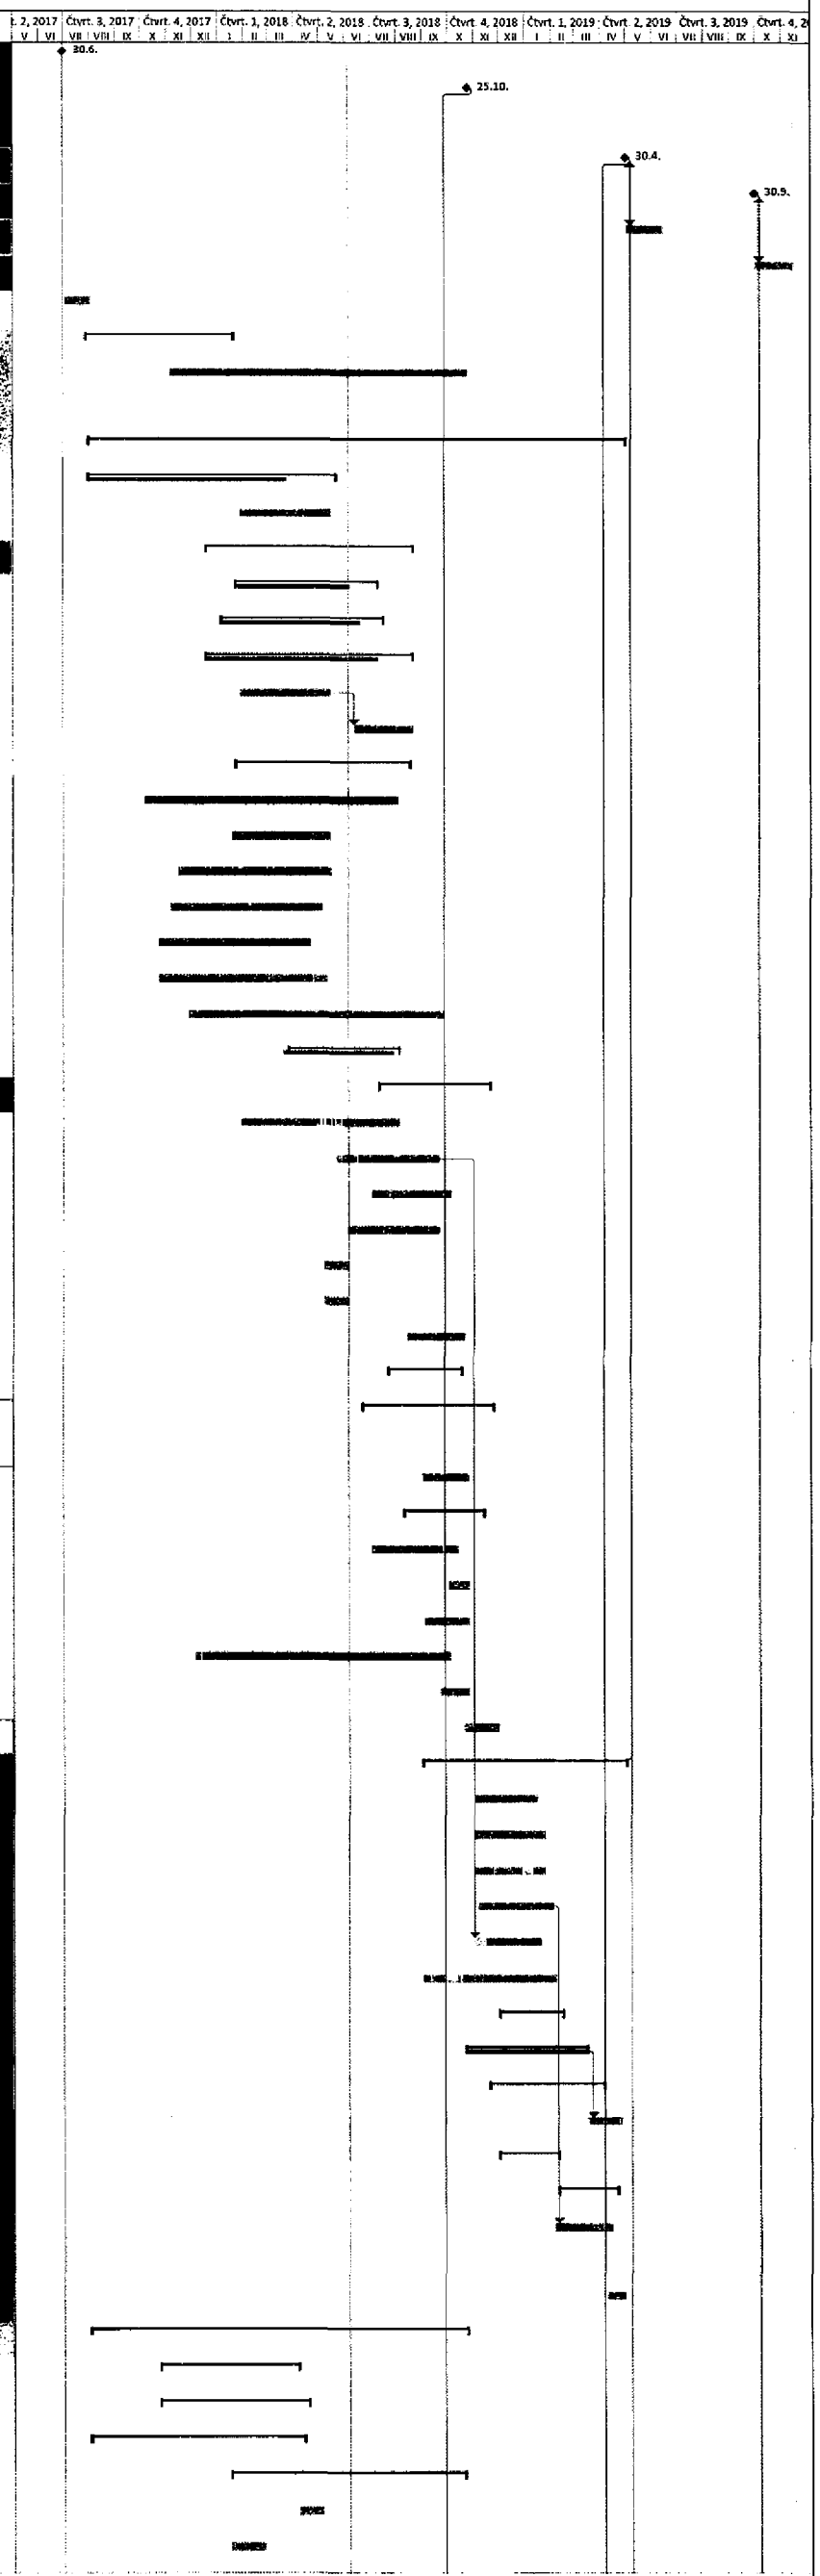

Projekt: hmg
Datum: 5.6. 18

Úkol	Souhrn projektu	Neaktivní milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín	
Rozdělení	Vnější úkoly	Neaktivní souhrn	Ruční souhrn	Průběh	
Milník	Vnější milník	Ruční úkol	Pouze zahájení	Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný	Neaktivní úkol	Pouze s dobou trvání	Pouze s datem dokončení		

Příloha č.13 - Harmonogram

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Příloha "B1" - Harmonogram	Text2
199		projekt ars	35 dny	23.2. 18	6.4. 18			
200		pomocná plošina	25 dny	6.4. 18	4.5. 18			
201		krycí konstrukce	15 dny	6.4. 18	23.4. 18			
202		1. Polovina	70 dny	24.4. 18	13.7. 18			
206		2.polovina	70 dny	14.7. 18	3.10. 18			
210		demontáž pomocné plošiny	79 dny	14.7. 18	13.10. 18	202		
211		demontáž krycí konstrukce	22 dny	22.9. 18	17.10. 18	209FS-10 dny		
212		mtž technologie v půdním meziprostoru	58 dny	15.8. 18	20.10. 18			
213		Výměna střešního pláště A+	180 dny	26.3. 18	23.10. 18			
215		Venky - 1. etapa	210 dny	19.2. 18	23.10. 18			
216		Střešní terasy nad 2PP - 1. část	110 dny	1.3. 18	9.7. 18			
221		Střešní terasy nad 2PP - 2. část	100 dny	16.6. 18	11.10. 18			
227		skladba K1	210 dny	19.2. 18	23.10. 18			
234		Královské schodiště	185 dny	19.3. 18	22.10. 18			
238		Technologie nakládání NA	135 dny	16.4. 18	19.9. 18			
245		[redacted] etapa - [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
246		Likvidace buňkoviště - po 2.etapě	10 dny	1.5. 19	10.5. 19	3	[redacted]	
247		[redacted] - 3. [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted] etapa	
248		[redacted] rekonstrukce VO - [redacted] etapa	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted] etapa	
249								
250		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	
251		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	
252		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	
253		Předpřejimka, soupis VaN - 2. etapa	15 dny	16.4. 19	30.4. 19	3FS-15 dny		
254		odstraňování drobných VaN 2. etapa	10 dny	1.5. 19	10.5. 19	253	[redacted]	
255		odstraňování VaN ostatních - 2. etapa	30 dny	1.5. 19	30.5. 19	253	[redacted]	
256		odstraňování VaN [redacted] - 3. etapa	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted] 10.11.2019 -klimatické podmínky	

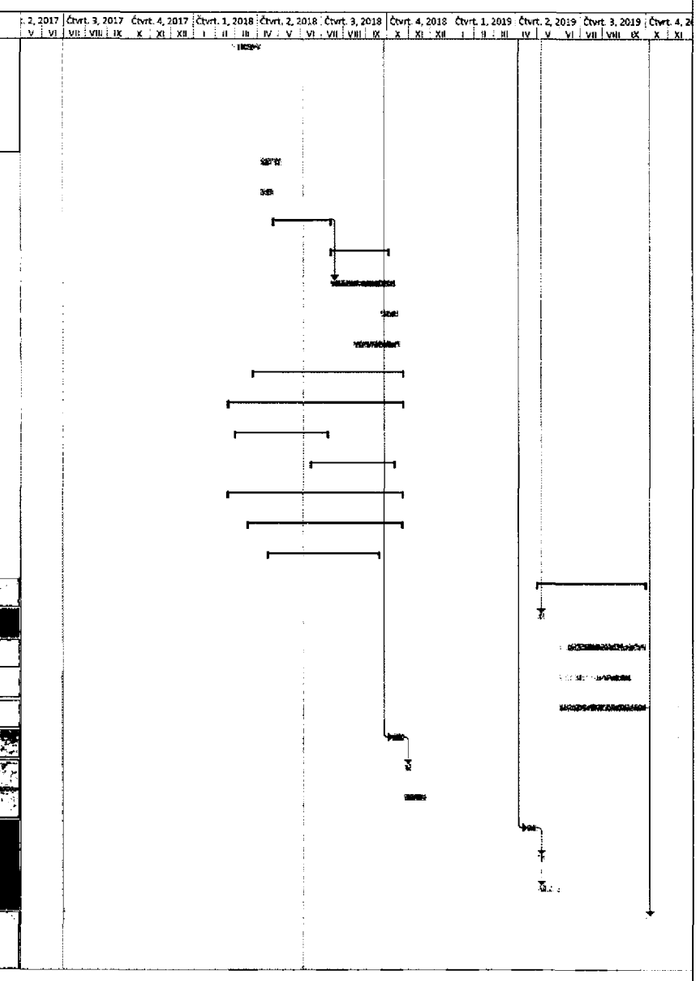

Projekt: hmg Datum: 5.6. 18	Úkol	Souhrn projektu	Neaktivní milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín
	Rozdělení	Vnější úkoly	Neaktivní souhrn	Ruční souhrn	Průběh
	Milník	Vnější milník	Ruční úkol	Pouze zahájení	Průběh ručně zadaného úkolu
	Souhrnný	Neaktivní úkol	Pouze s dobou trvání	Pouze s datem dokončení	
