PBW GROUP
stavební a inženýrská činnost

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Kalendář úkolů	Text1
1	**Welcome Center, úpravy příletové haly -Terminál 1**	**214 dny**	**1.3. 16**	**30.9. 16**		**PBW**	
2	Předání staveniště	0 dny	7.3. 16	7.3. 16		Standar	
3	objednávky materiálů s dlouhou dobou dodání	2 dny	7.3. 16	8.3. 16	2	Standar	
4	vzorkování	10 dny	7.3. 16	16.3. 16	2	PBW	
5							
6	**Termíny dodání materiálů s dlouhou dobou dodání**	**30 dny**	**7.3. 16**	**15.4. 16**		**Žádný**	
7	podhledy HD	20 dny	7.3. 16	1.4. 16	2	Standar	
8	svítidla welcome centrum (1.+2.faze)	15 dny	7.3. 16	25.3. 16	2	Standar	
9	svítidla	30 dny	7.3. 16	15.4. 16	2	Standar	
10	bezpečnostní dveře	25 dny	7.3. 16	8.4. 16	2	Standar	
11	požární dveře rozvodny	15 dny	7.3. 16	25.3. 16	2	Standar	
12	ocelová konstrukce	6 dny	28.3. 16	4.4. 16	33	Standar	
13	dibond	20 dny	17.3. 16	13.4. 16	4	Standar	
14	corian	20 dny	17.3. 16	13.4. 16	4	Standar	
15	lacobel	15 dny	17.3. 16	6.4. 16	4	Standar	
16	dodávka rozvaděčů	15 dny	7.3. 16	25.3. 16	2	Standar	
17	**Přípravné práce - pránájem buňkoviště**	**9 dny**	**1.3. 16**	**13.3. 16**		**Žádný**	
18	Stavba buňkoviště a zařízení staveniště	3 dny	11.3. 16	13.3. 16		PBW	
19	Demontáž buňkoviště a vyklizení zařízení staveniště	3 dny	1.3. 16	3.3. 16		PBW	
20							
21	**I. FÁZE**	**28 dny**	**14.3. 16**	**10.4. 16**		**PBW**	
22	**1NP**	**28 dny**	**14.3. 16**	**10.4. 16**		**PBW**	
23	stavba provizorní zástěny ZS v místě rozvoden a prostorů montáže lešení	2 dny	14.3. 16	15.3. 16	18	PBW	
24	vybourání dveří do rozvodny	1 den	16.3. 16	16.3. 16	23	PBW	
25	montáž SDK stěny rozvodna - 1244	1 den	16.3. 16	16.3. 16	23	PBW	
26	vybourání kavárny, demontáže	4 dny	17.3. 16	20.3. 16	25	PBW	
27	demontáže stávajících prvků ESI, ESL, ZTI	3 dny	19.3. 16	21.3. 16	25SS+3 dny	PBW	
28	montáže SDK příček - rastr + první záklop	4 dny	22.3. 16	25.3. 16	27	PBW	
29	Nové rozvody ESI, ESL, ZTI, RTCH - hlavní trasy	5 dny	26.3. 16	30.3. 16	28	PBW	
30	montáže SDK podhledů	5 dny	29.3. 16	2.4. 16	29SS+3 dny	PBW	
31	montáže příček - doklopení	3 dny	31.3. 16	2.4. 16	29	PBW	
32	osazení zárubní	2 dny	26.3. 16	27.3. 16	11;25	PBW	
33	zaměření vestavěných prvků nábytku, ocelová konstrukce	2 dny	26.3. 16	27.3. 16	28	PBW	
34	Hrubé podlahy - opravy, dobetonávky	4 dny	3.4. 16	6.4. 16	31	PBW	
35	obklad celní kontroly (1. část) IS_13	4 dny	3.4. 16	6.4. 16	31	PBW	
36	montáž OK	3 dny	5.4. 16	7.4. 16	12	PBW	
37	malby	2 dny	8.4. 16	9.4. 16	36	PBW	
38	úklid	2 dny	8.4. 16	9.4. 16	36	PBW	
39	demontáž a montáž nových bezpečnostních dveří včetně úpravy ostění	2 dny	9.4. 16	10.4. 16	10	PBW	
40	**2NP**	**27 dny**	**14.3. 16**	**9.4. 16**		**PBW**	
41	montáž lešení	5 dny	14.3. 16	18.3. 16	18	PBW	
42	Demontáže stávajících podhledů, včetně koncových prvků a rozvodů	3 dny	19.3. 16	21.3. 16	41	PBW	
43	Hlavní kabelové trasy	2 dny	22.3. 16	23.3. 16	42	PBW	
44	Montáže svítidel	5 dny	24.3. 16	28.3. 16	43	PBW	
45	Montáže podhledů HD	8 dny	24.3. 16	31.3. 16	43	PBW	
46	osazení koncových prvků ESI, ESL, CCTV, RTCH, MaR	3 dny	1.4. 16	3.4. 16	45	PBW	

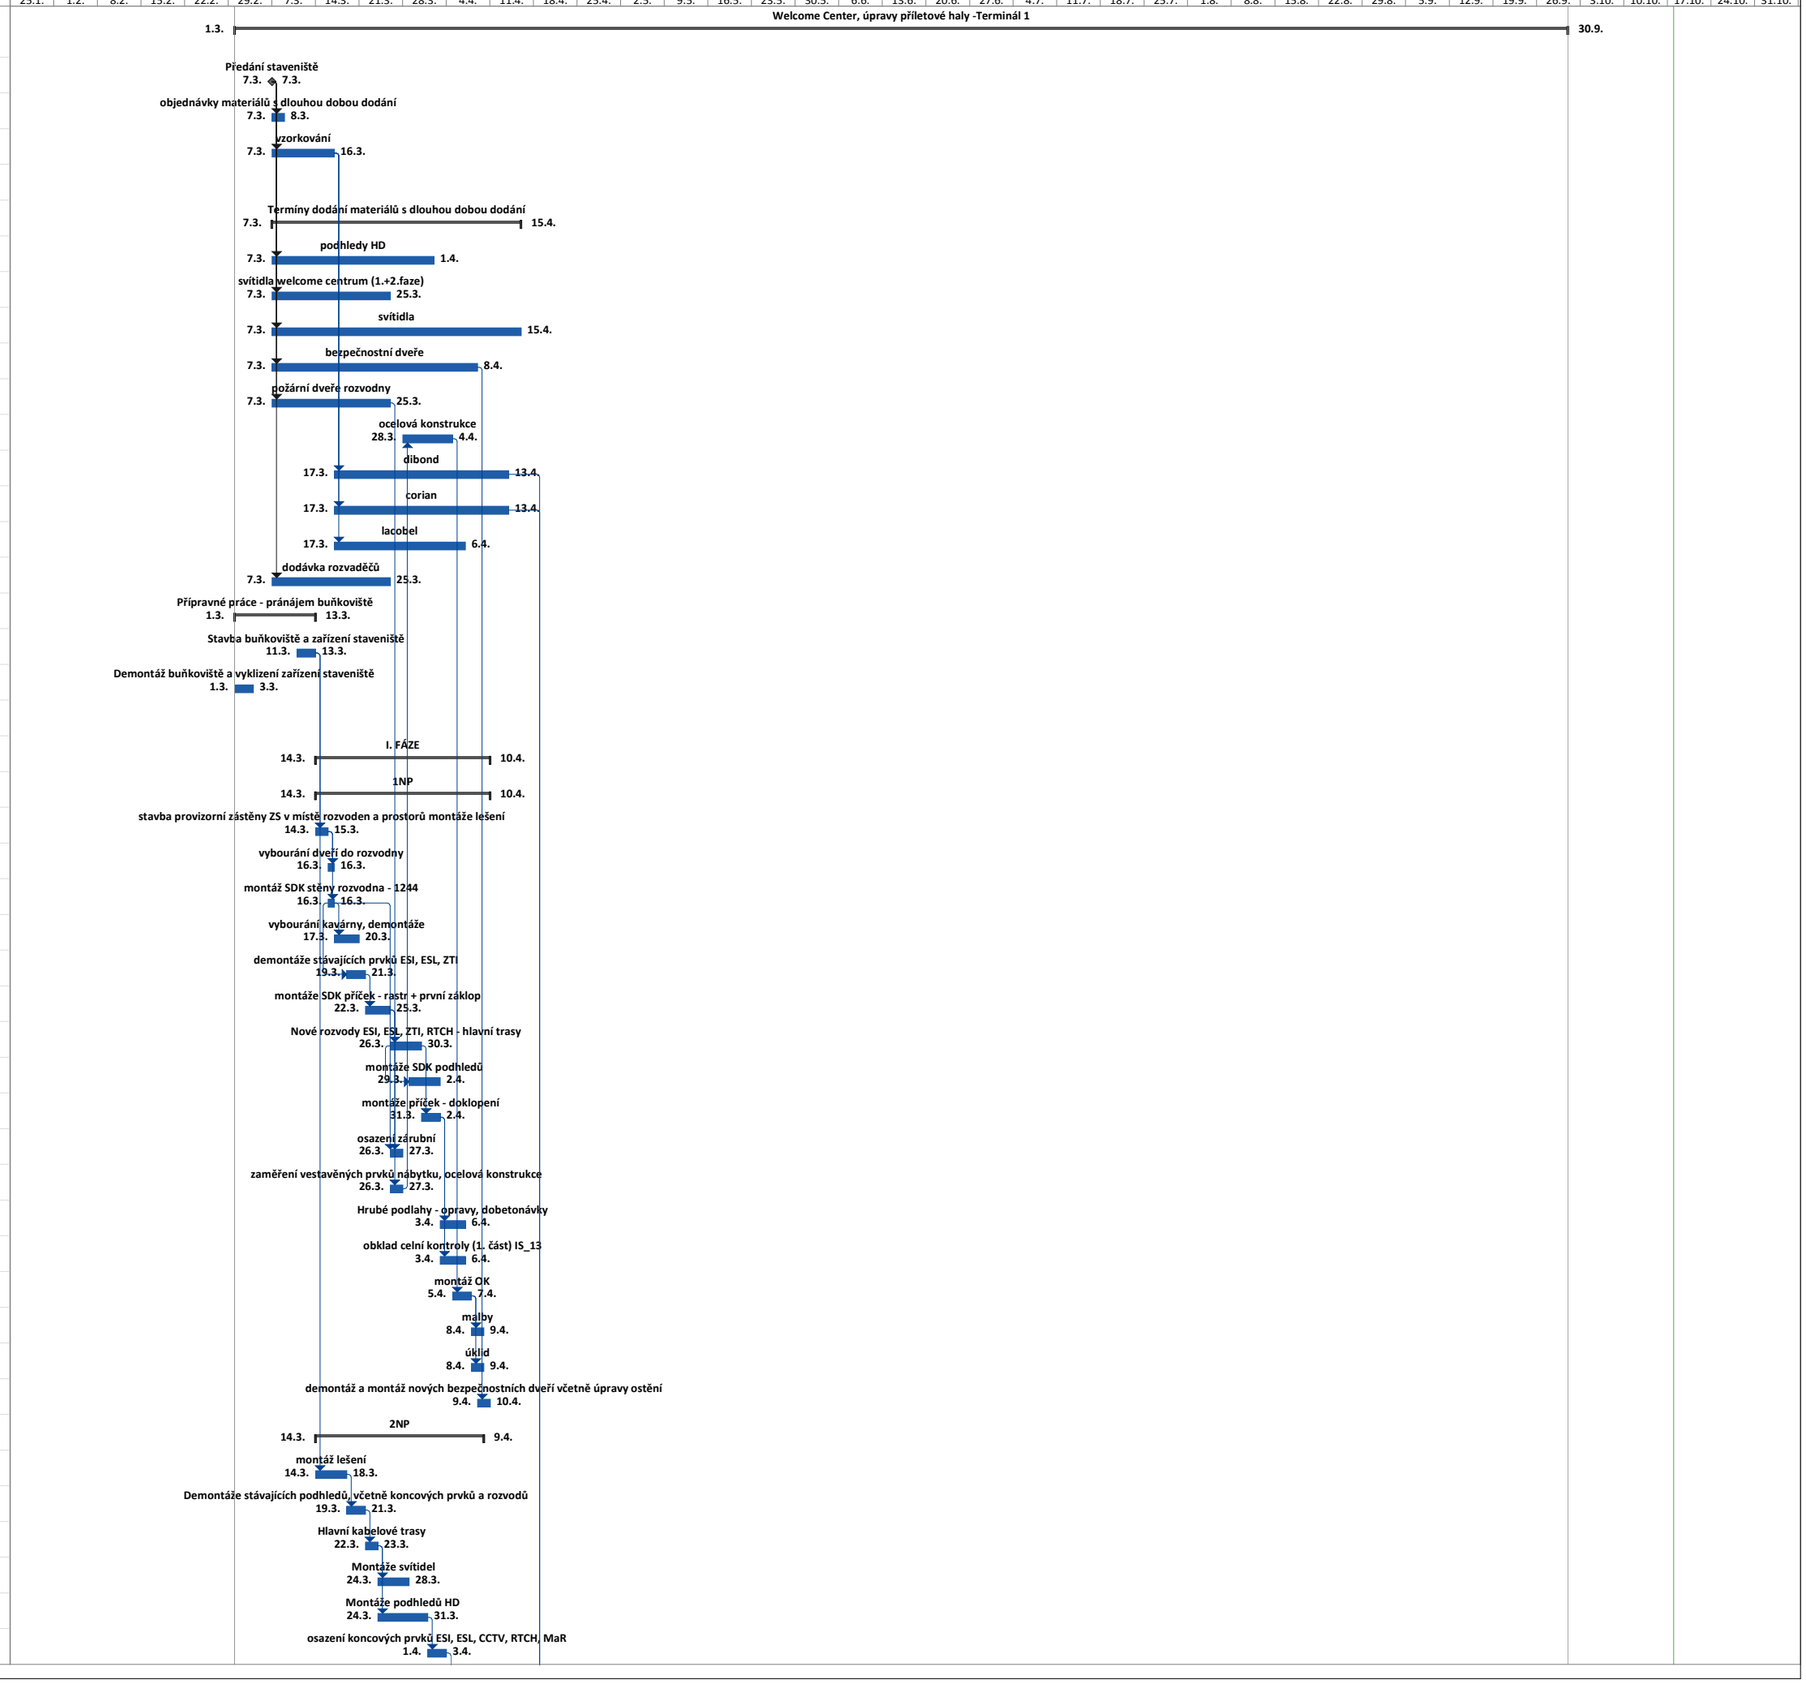

PBW GROUP
stavební a inženýrská činnost

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Kalendář úkolů	Text1
47	demontáž lešení	3 dny	4.4. 16	6.4. 16	46	PBW	
48	čištění podlahy	3 dny	7.4. 16	9.4. 16	47	PBW	
49							
50	**II. FÁZE**	**17 dny**	**11.4. 16**	**27.4. 16**		**PBW**	
51	**1NP**	**16 dny**	**11.4. 16**	**26.4. 16**		**PBW**	
52	**návštěvnické centrum**	**12 dny**	**11.4. 16**	**26.4. 16**		**Žádný**	
53	rozvody ESI, ESL pod podiem	1 den	11.4. 16	11.4. 16	48	PBW	
54	zdvojená podlaha nad OK	3 dny	12.4. 16	14.4. 16	53	PBW	
55	opláštění OK (dibond, corianový pult)	5 dny	19.4. 16	23.4. 16	13;14;57	PBW	
56	vestavěné skříně včetně zabudovaných dveří	4 dny	15.4. 16	18.4. 16	54	PBW	
57	osazení rolet	4 dny	15.4. 16	18.4. 16	54	PBW	
58	kompletace prvků ESI, ESL, CCTV…	3 dny	24.4. 16	26.4. 16	55	PBW	
59	dodávka nábytku a ostatních interiérových prvků (textilní panel, logo…)	4 dny	19.4. 16	22.4. 16	57	PBW	
60	finální podlahové krytiny	3 dny	15.4. 16	17.4. 16	54	PBW	
61							
62	**celní kontrola**	**14 dny**	**11.4. 16**	**24.4. 16**		**PBW**	
63	demontáže (zábradlí, dveřní křídla, obklady na stěnách)	3 dny	11.4. 16	13.4. 16	48	PBW	
64	výstavba SDK kcí + předstěna	3 dny	14.4. 16	16.4. 16	63	PBW	
65	montáž obkladu lacobel	3 dny	17.4. 16	19.4. 16	64	PBW	
66	kompletace prvků ESI, ESL, CCTV…	1 den	20.4. 16	20.4. 16	65	PBW	
67	dodávka a montáž zábradlí	4 dny	17.4. 16	20.4. 16	64	PBW	
68	Oprava podlahy	2 dny	21.4. 16	22.4. 16	67	PBW	
69							
70	dodávka a montáž zelené stěny	5 dny	11.4. 16	15.4. 16	48	PBW	
71	rozvody a příprava ZTI pro kavárnu	3 dny	16.4. 16	18.4. 16	70	PBW	
72							
73	Vybudování info totemu včetně úpravy konstrukcí	10 dny	15.4. 16	24.4. 16		PBW	
74	kompletační práce	2 dny	23.4. 16	24.4. 16	68	PBW	
75							
76	**2NP**	**22 dny**	**11.4. 16**	**2.5. 16**		**PBW**	
77	montáž lešení	4 dny	11.4. 16	14.4. 16	47SS+2 dny	PBW	
78	Demontáže stávajících podhledů, včetně koncových prvků a rozvodů	3 dny	15.4. 16	17.4. 16	77	PBW	
79	Hlavní kabelové trasy	2 dny	18.4. 16	19.4. 16	78	PBW	
80	Montáže svítidel	4 dny	20.4. 16	23.4. 16	79	PBW	
81	Montáže podhledů HD	8 dny	17.4. 16	24.4. 16	78SS+2 dny	PBW	
82	osazení koncových prvků ESI, ESL, CCTV, RTCH, MaR	2 dny	25.4. 16	26.4. 16	81	PBW	
83	demontáž lešení	3 dny	27.4. 16	29.4. 16	82	PBW	
84	čištění podlahy	3 dny	30.4. 16	2.5. 16	83	PBW	
85							
86	**III. FÁZE**	**18 dny**	**28.4. 16**	**15.5. 16**		**PBW**	
87	**1NP**	**15 dny**	**3.5. 16**	**17.5. 16**		**PBW**	
88	provizorní oplocení	2 dny	3.5. 16	4.5. 16	84	PBW	
89	vybourání podlahy a úpravy pod kioskem	2 dny	5.5. 16	6.5. 16	88	PBW	
90	dodávka a montáž kiosku včetně rolet	10 dny	7.5. 16	16.5. 16	89	PBW	
91	rozvody Esi, ESL…	3 dny	7.5. 16	9.5. 16	89	PBW	
92							

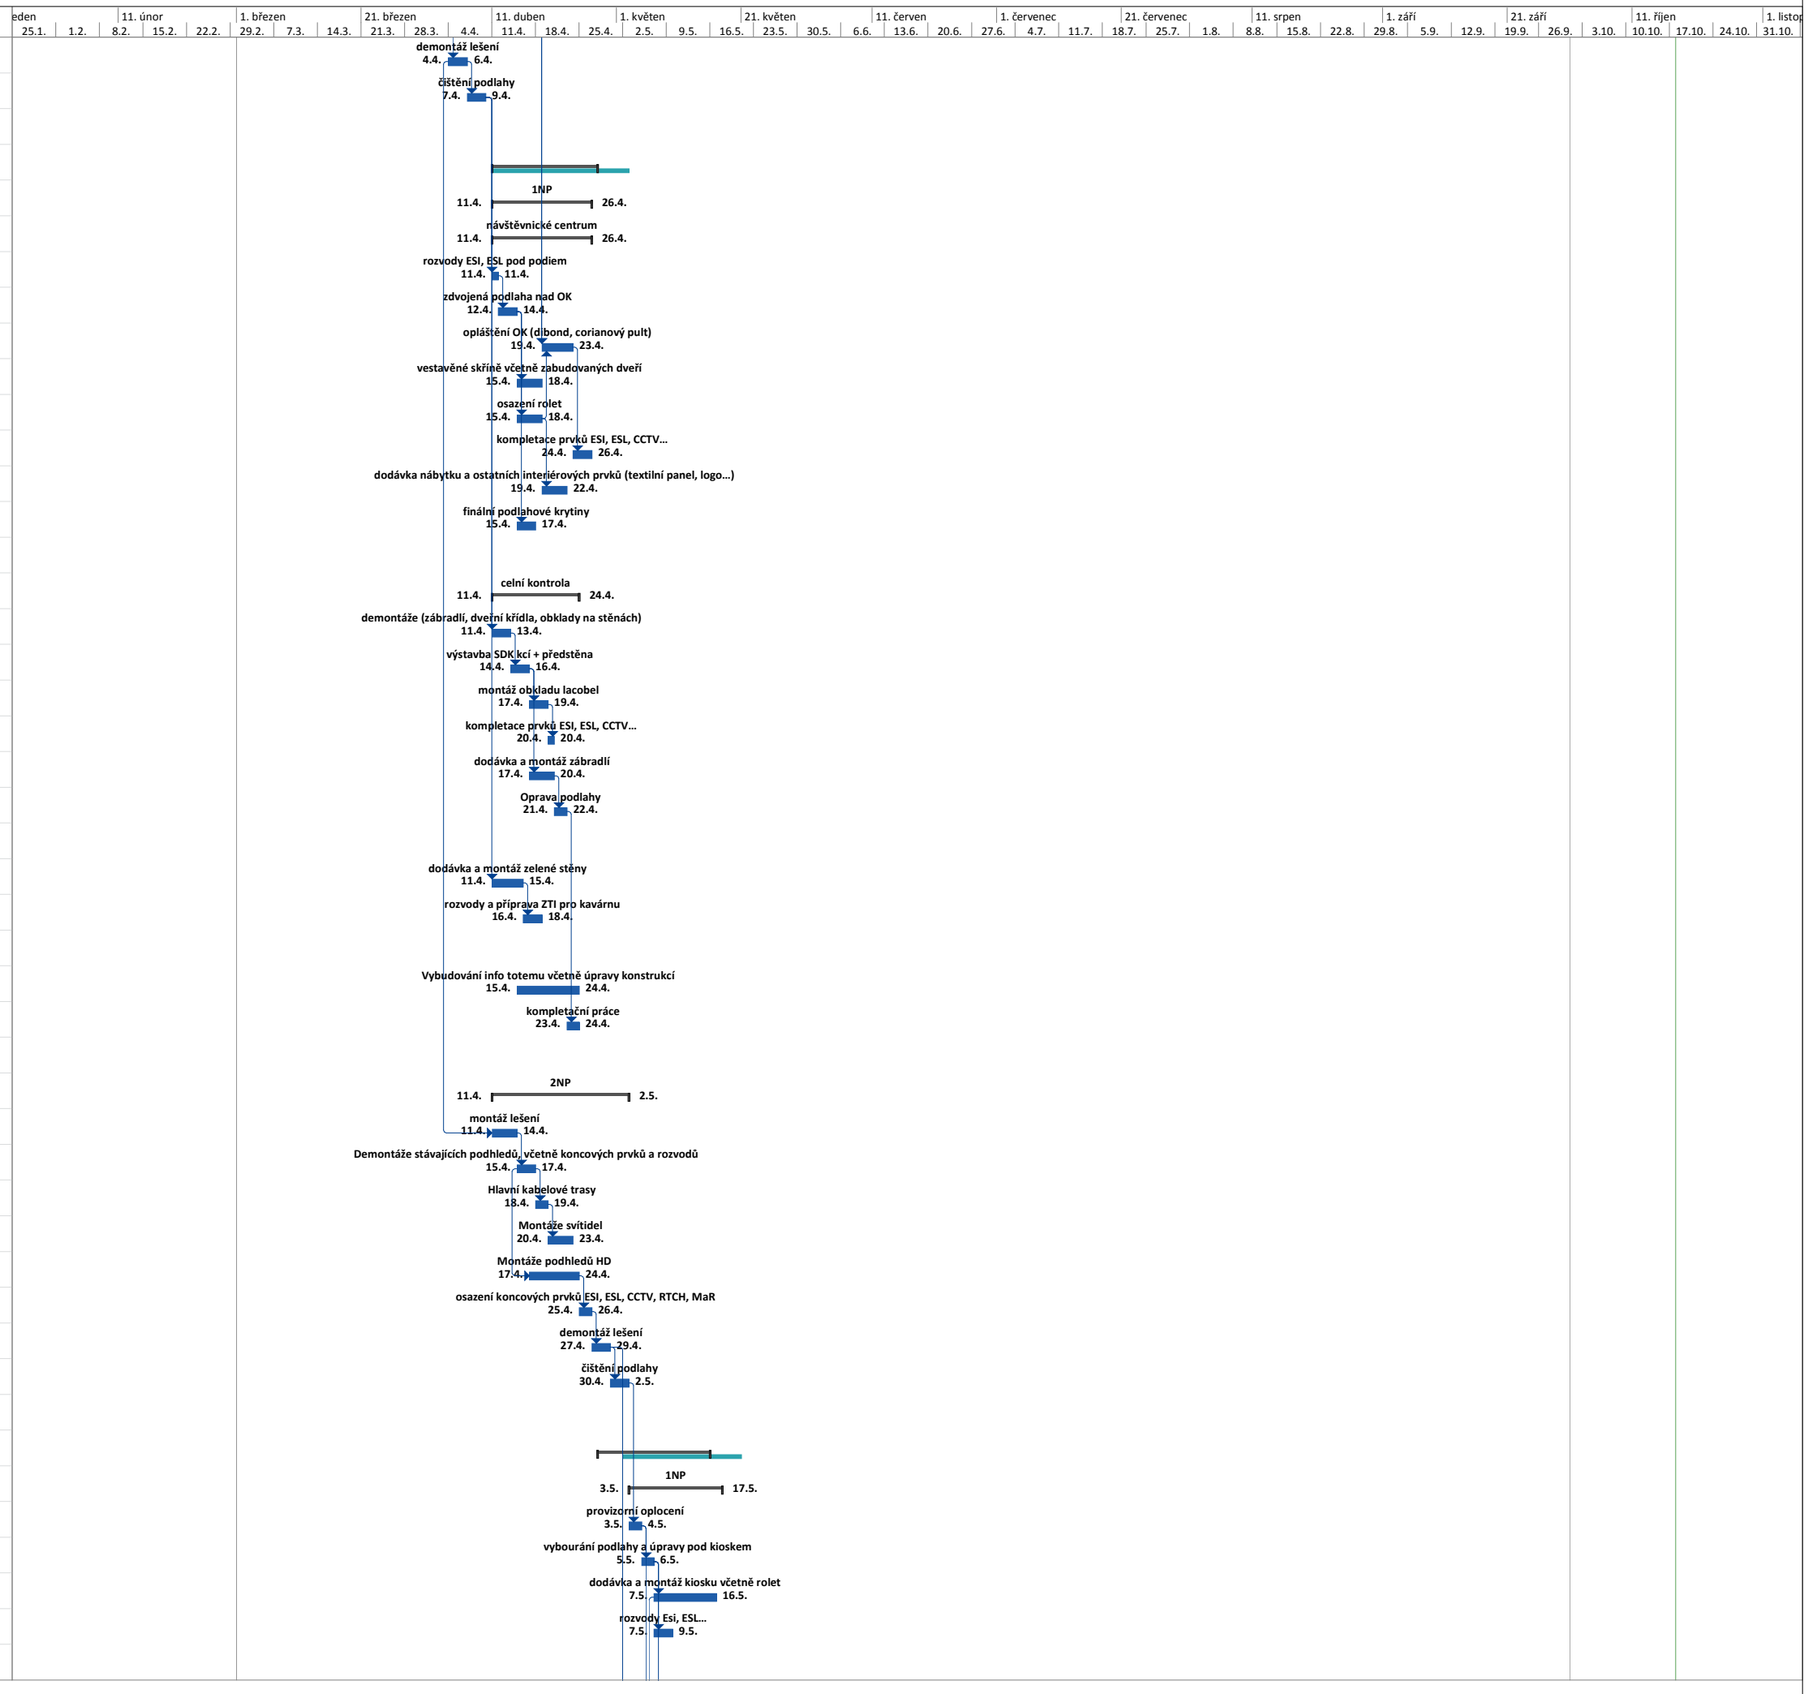

PBW GROUP
stavební a inženýrská činnost
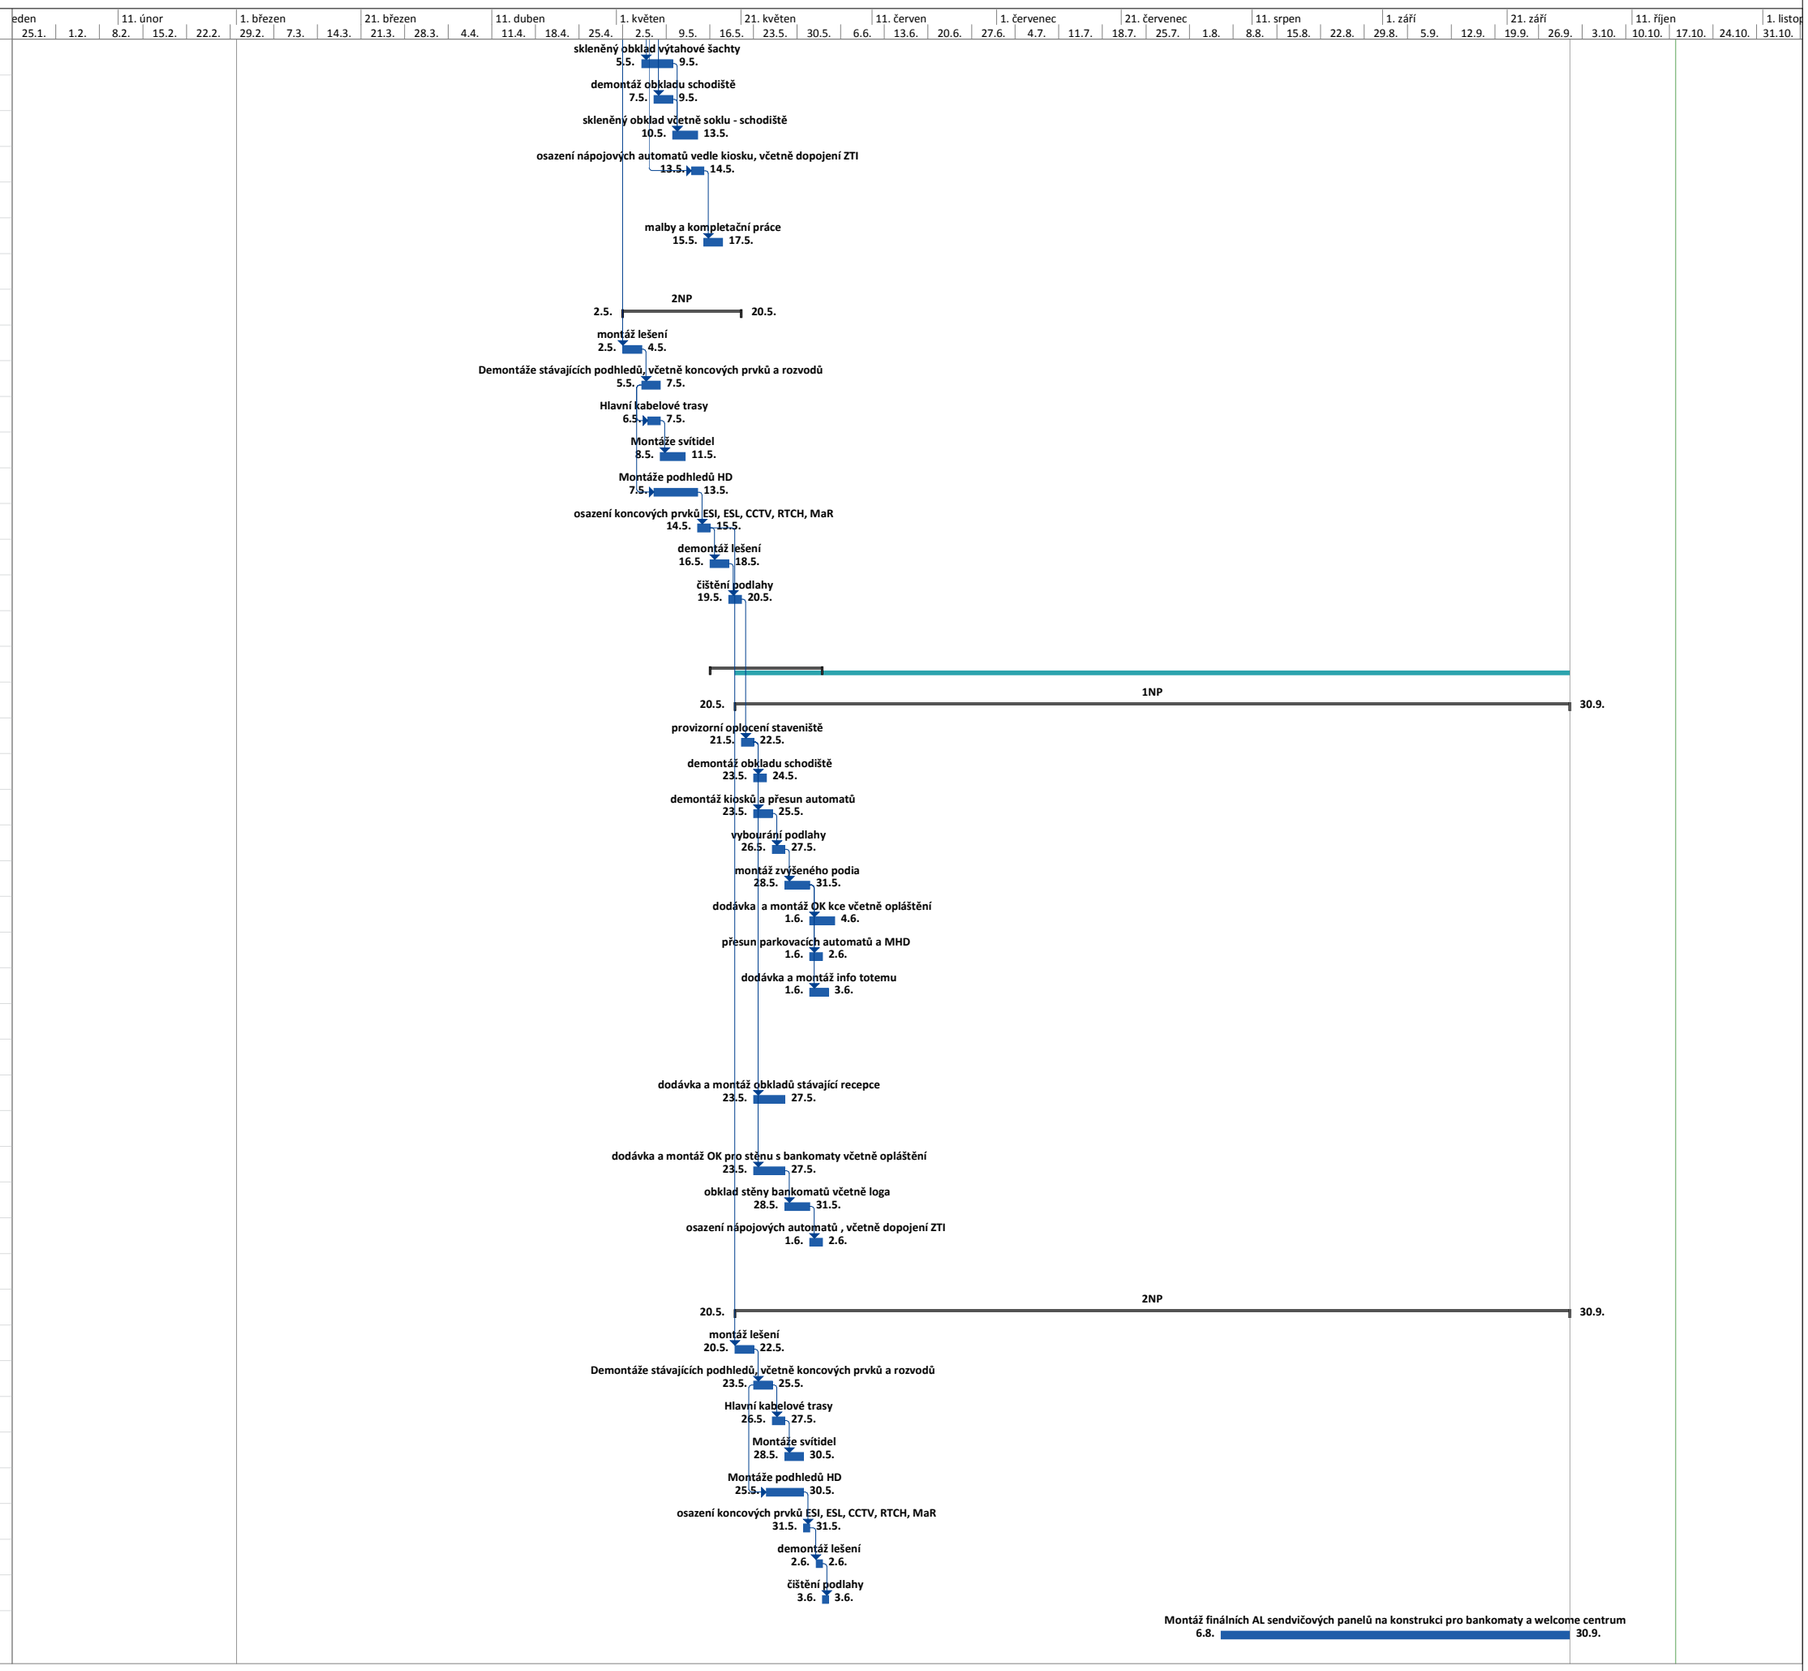
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Kalendář úkolů	Text1
93	skleněný obklad výtahové šachty	5 dny	5.5. 16	9.5. 16	88	PBW	
94	demontáž obkladu schodiště	3 dny	7.5. 16	9.5. 16	89	PBW	
95	skleněný obklad včetně soklu - schodiště	4 dny	10.5. 16	13.5. 16	93;94	PBW	
96	osazení nápojových automatů vedle kiosku, včetně dopojení ZTI	2 dny	13.5. 16	14.5. 16	90SS+6 dny	PBW	
97							
98	malby a kompletační práce	3 dny	15.5. 16	17.5. 16	96	PBW	
99							
100	**2NP**	**19 dny**	**2.5. 16**	**20.5. 16**		**PBW**	
101	montáž lešení	3 dny	2.5. 16	4.5. 16	83FS+2 dny	PBW	
102	Demontáže stávajících podhledů, včetně koncových prvků a rozvodů	3 dny	5.5. 16	7.5. 16	101	PBW	
103	Hlavní kabelové trasy	2 dny	6.5. 16	7.5. 16	102SS+1 den	PBW	
104	Montáže svítidel	4 dny	8.5. 16	11.5. 16	103	PBW	
105	Montáže podhledů HD	7 dny	7.5. 16	13.5. 16	102SS+2 dny	PBW	
106	osazení koncových prvků ESI, ESL, CCTV, RTCH, MaR	2 dny	14.5. 16	15.5. 16	105	PBW	
107	demontáž lešení	3 dny	16.5. 16	18.5. 16	106	PBW	
108	čištění podlahy	2 dny	19.5. 16	20.5. 16	107	PBW	
109							
110	**IV. FÁZE**	**18 dny**	**16.5. 16**	**2.6. 16**		**PBW**	
111	**1NP**	**134 dny?**	**20.5. 16**	**30.9. 16**		**PBW**	
112	provizorní oplocení staveniště	2 dny	21.5. 16	22.5. 16	108	PBW	
113	demontáž obkladu schodiště	2 dny	23.5. 16	24.5. 16	112	PBW	
114	demontáž kiosků a přesun automatů	3 dny	23.5. 16	25.5. 16	112	PBW	
115	vybourání podlahy	2 dny	26.5. 16	27.5. 16	114	PBW	
116	montáž zvýšeného podia	4 dny	28.5. 16	31.5. 16	115	PBW	
117	dodávka a montáž OK kce včetně opláštění	4 dny	1.6. 16	4.6. 16	116	PBW	
118	přesun parkovacích automatů a MHD	2 dny	1.6. 16	2.6. 16	116	PBW	
119	dodávka a montáž info totemu	3 dny	1.6. 16	3.6. 16	116	PBW	
120							
121							
122	dodávka a montáž obkladů stávající recepce	5 dny	23.5. 16	27.5. 16	112	PBW	
123							
124	dodávka a montáž OK pro stěnu s bankomaty včetně opláštění	5 dny	23.5. 16	27.5. 16	112	PBW	
125	obklad stěny bankomatů včetně loga	4 dny	28.5. 16	31.5. 16	124	PBW	
126	osazení nápojových automatů , včetně dopojení ZTI	2 dny	1.6. 16	2.6. 16	125	PBW	
127							
128	**2NP**	**134 dny?**	**20.5. 16**	**30.9. 16**		**PBW**	
129	montáž lešení	3 dny	20.5. 16	22.5. 16	106FS+4 dny	PBW	
130	Demontáže stávajících podhledů, včetně koncových prvků a rozvodů	3 dny	23.5. 16	25.5. 16	129	PBW	
131	Hlavní kabelové trasy	2 dny	26.5. 16	27.5. 16	130	PBW	
132	Montáže svítidel	3 dny	28.5. 16	30.5. 16	131	PBW	
133	Montáže podhledů HD	6 dny	25.5. 16	30.5. 16	130SS+2 dny	PBW	
134	osazení koncových prvků ESI, ESL, CCTV, RTCH, MaR	1 den	31.5. 16	31.5. 16	133	PBW	
135	demontáž lešení	1 den	2.6. 16	2.6. 16	134	PBW	
136	čištění podlahy	1 den	3.6. 16	3.6. 16	135	PBW	
137	Montáž finálních AL sendvičových panelů na konstrukci pro bankomaty a welcome centrum	41 dny?	6.8. 16	30.9. 16		Žádný
