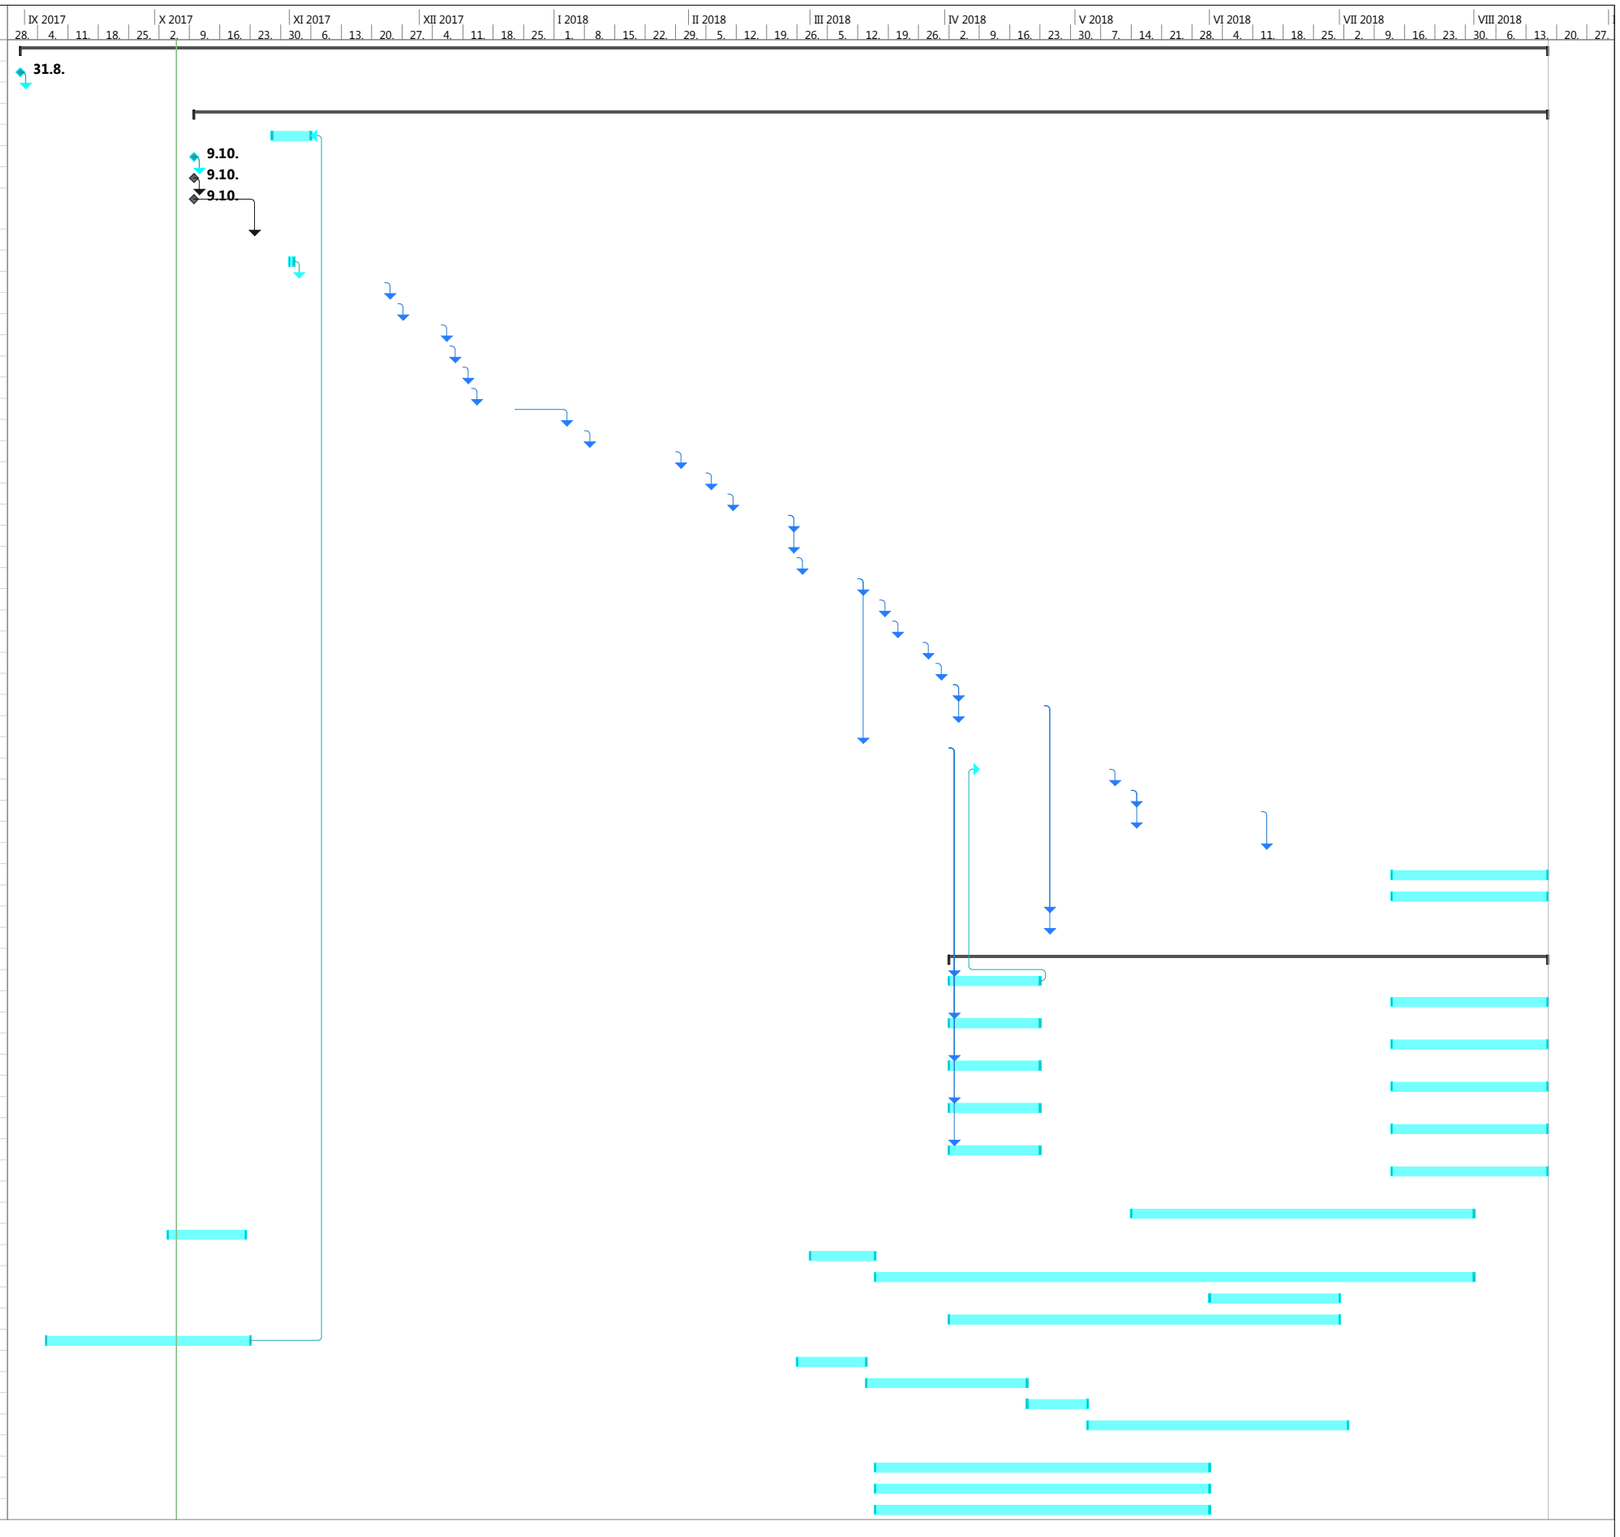ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1		**MŠ Prokopa Holého**	**340 dny?**	**31.8. 17**	**17.8. 18**	
2		Předání staveniště	0 dny	31.8. 17	31.8. 17	
3		Zařízení staveniště	5 dny	31.8. 17	4.9. 17	2
4		**Architektonicko - stavební řešení**	**300 dny**	**9.10. 17**	**17.8. 18**	
5		Zemní práce, HTU	9 dny	28.10. 17	5.11. 17	61FF+14 dny
6		Dokončení PD založení	0 dny	9.10. 17	9.10. 17	
7		Cenová nabídka	0 dny	9.10. 17	9.10. 17	6
8		**Odsouhlasení nového provedení a cenové nabídky**	**0 dny**	**9.10. 17**	**9.10. 17**	7
9		Pilotové založení	14 dny	24.10. 17	6.11. 17	8FS+14 dny
10		Zásypy a úprava pláně pod částí objektu	1 den	1.11. 17	1.11. 17	
11		ŽB prahy + šachty	21 dny	2.11. 17	22.11. 17	10
12		Zásypy a úprava pláně pod objektem	3 dny	23.11. 17	25.11. 17	11
13		Ležatá kanalizace pod objektem	10 dny	26.11. 17	5.12. 17	12
14		Zásypy a úprava pláně pod objektem	2 dny	6.12. 17	7.12. 17	13
15		Větrací potrubí pod deskou	3 dny	8.12. 17	10.12. 17	14
16		Zásypy a úprava pláně pod objektem	2 dny	11.12. 17	12.12. 17	15
17		Základová deska	10 dny	13.12. 17	22.12. 17	16
18		Izolace spodní stavby pod nosné zdivo	4 dny	4.1. 18	7.1. 18	17
19		Obvodové nosné zdivo 1.NP	21 dny	8.1. 18	28.1. 18	18
20		Věnec nad 1.NP	7 dny	29.1. 18	4.2. 18	19
21		Strop nad 1.NP SPIROLL	5 dny	5.2. 18	9.2. 18	20
22		Zmonolitnění stropu nad 1.NP, schodiště	14 dny	10.2. 18	23.2. 18	21
23		Monolitické atiky teras	21 dny	24.2. 18	16.3. 18	22
24		Izolace proti vodě pod nosné zdivo	2 dny	24.2. 18	25.2. 18	22
25		Obvodové nosné zdivo 2.NP	14 dny	26.2. 18	11.3. 18	24
26		Věnec nad 2.NP	5 dny	12.3. 18	16.3. 18	25
27		Strop nad 2.NP SPIROLL	3 dny	17.3. 18	19.3. 18	26
28		Zmonolitnění stropu nad 2.NP	7 dny	20.3. 18	26.3. 18	27
29		Atika vyzdění	3 dny	27.3. 18	29.3. 18	28
30		Věnec atika	4 dny	30.3. 18	2.4. 18	29
31		Střešní plášť	21 dny	3.4. 18	23.4. 18	30
32		Výplně otvorů vnější	14 dny	3.4. 18	16.4. 18	30
33		Příčky	21 dny	12.3. 18	1.4. 18	25
34		Úpravy povrchů vnitřní	30 dny	9.4. 18	8.5. 18	44FS-14 dny
35		Betonové podlahy	5 dny	9.5. 18	13.5. 18	34
36		Obklady, dlažby	30 dny	14.5. 18	12.6. 18	35
37		Podhledy	45 dny	14.5. 18	27.6. 18	35
38		Malby	66 dny	13.6. 18	17.8. 18	36
39		PVC	36 dny	13.7. 18	17.8. 18	
40		Vnitřní výplně otvorů	36 dny	13.7. 18	17.8. 18	
41		Zámečnické prvky	90 dny	24.4. 18	22.7. 18	31
42		Úpravy povrchů vnější - fasáda	60 dny	24.4. 18	22.6. 18	31
43		**Technika prostředí staveb**	**138 dny**	**2.4. 18**	**17.8. 18**	
44		ZTI vnitřní část - rozvody	21 dny	2.4. 18	22.4. 18	33
45		ZTI vnitřní část - kompletace	36 dny	13.7. 18	17.8. 18	
46		VZT - rozvody	21 dny	2.4. 18	22.4. 18	33
47		VZT - kompletace	36 dny	13.7. 18	17.8. 18	
48		Vytápění - rozvody	21 dny	2.4. 18	22.4. 18	33
49		Vytápění - kompletace	36 dny	13.7. 18	17.8. 18	
50		Silnoproud - rozvody	21 dny	2.4. 18	22.4. 18	33
51		Silnoproud - kompletace	36 dny	13.7. 18	17.8. 18	
52		Slaboproud - rozvody	21 dny	2.4. 18	22.4. 18	33
53		Slaboproud - kompletace	36 dny	13.7. 18	17.8. 18	
54						
55		Výtah	79 dny	14.5. 18	31.7. 18	
56		SO 02 Přeložka dešťové kanalizace	18 dny	4.10. 17	21.10. 17	
57		SO 03 Přípojka vodovodu a kanalizace	15 dny	1.3. 18	15.3. 18	
58		SO 04 Zpevněné plochy vnitroareálové	138 dny	16.3. 18	31.7. 18	
59		SO 05 Zahrada mateřské školy	30 dny	1.6. 18	30.6. 18	
60		SO 06 Střešní zahrada mateřské školy	90 dny	2.4. 18	30.6. 18	
61		SO 07 Opěrná zeď - A 104m	47 dny	6.9. 17	22.10. 17	
62		SO 07 Opěrná zeď - B 36m	16 dny	26.2. 18	13.3. 18	
63		SO 07 Opěrná zeď - C 81m	37 dny	14.3. 18	19.4. 18	
64		SO 07 Opěrná zeď - D 5m	14 dny	20.4. 18	3.5. 18	
65		SO 07 Oplocení	60 dny	4.5. 18	2.7. 18	
66						
67		Předpolí - Slaboproud	77 dny	16.3. 18	31.5. 18	
68		Předpolí SO 08 Veřejné osvětlení	77 dny	16.3. 18	31.5. 18	
69		Předpolí SO 09 Dopravní řešení komunikací	77 dny	16.3. 18	31.5. 18
