Příloha č. 2 - harmonogram provádění prací

Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
Muzeum skla a bižuterie Jablonec	**315 dny**	**20.3.2018**	**20.5.2019**
Předání staveniště	1 dny	20.3.2018	20.3.2018
Zařízení staveniště	9 dny	20.3.2018	1.4.2018
Budova muzea	**260 dny**	**2.4.2018**	**31.3.2019**
Bourání opěrné zdi, zemní práce	20 dny	2.4.2018	29.4.2018
okopávky op.zdi a bourání dlažby			
D+M informačního panelu			
výkop pro kanalizační šachtu, stoku a základy			
Základy, izolace spodní stavby, opěrná stěna	40 dny	23.4.2018	17.6.2018
drenážní potrubí, prostupy stěnou, jádrové vrty			
přizdívka opěrné stěny mezerovitým betonem			
základová deska 1.NP			
základové pasy 2.NP			
Monolitický skelet	60 dny	21.5.2018	19.8.2018
stěny 1.NP			
strop 1.np			
stěny 2.NP			
strop 2.NP			
stěny 3.NP			
strop 3.NP			
Střecha vč. světlíku	40 dny	20.8.2018	14.10.2018
Zdivo	30 dny	20.8.2018	30.9.2018
Nosná OK fasády	35 dny	11.6.2018	16.9.2018
uložení prvků do ŽB			
montáž oc.kce			
Prosklená fasáda-montáž rámů	25 dny	10.9.2018	14.10.2018
Prosklená fasáda-montáž skel	25 dny	5.11.2018	9.12.2018
D+M výplní otvorů	20 dny	22.10.2018	11.11.2018
Rozvody TZB	45 dny	16.4.2018	28.10.2018
kanalizační a drenážní potrubí pod deskou, zemnící drát			
hrubé rozvody kanalizace a vody			
hrubé rozvody UT, Elektro, VZT			
Omítky, betonové podlahy	40 dny	22.10.2018	16.12.2018
Sádrokartony, podhledy	65 dny	8.10.2018	20.1.2019
Propojení do stávající budovy	50 dny	24.9.2018	16.12.2018
Propojení 1.NP (vybourání otvoru,začištění následně po vyzrání nátěry, dveře)			
Propojení 2.NP (vybourání otvoru,začištění následně po vyzrání nátěry, dveře)			
Propojení 3.NP (vybourání otvoru,začištění následně po vyzrání nátěry, dveře)			
Finální úpravy povrchů, dveře, skleněné schody	35 dny	7.1.2019	24.2.2019
Kompletace TZB	25 dny	4.2.2019	10.3.2019
Různé dokončovací práce	20 dny	4.3.2019	31.3.2019
Park	**280 dny**	**20.3.2018**	**14.4.2019**
Bourací a zemní práce	70 dny	2.7.2018	7.10.2018
Rozvody elektro	65 dny	6.8.2018	4.11.2018
Nové chodníky, komunikace	75 dny	6.8.2018	18.11.2018
Sadové úpravy	90 dny	20.3.2018	31.3.2019
Kácení dřevin			
zemní práce			
Nová výsatba			
Obnova travnatých ploch, povýsadbová péče, mobiliář			
Vyklizení staveniště	10 dny	1.4.2019	14.4.2019
Předání díla	5 dny	20.5.2019	20.5.2019

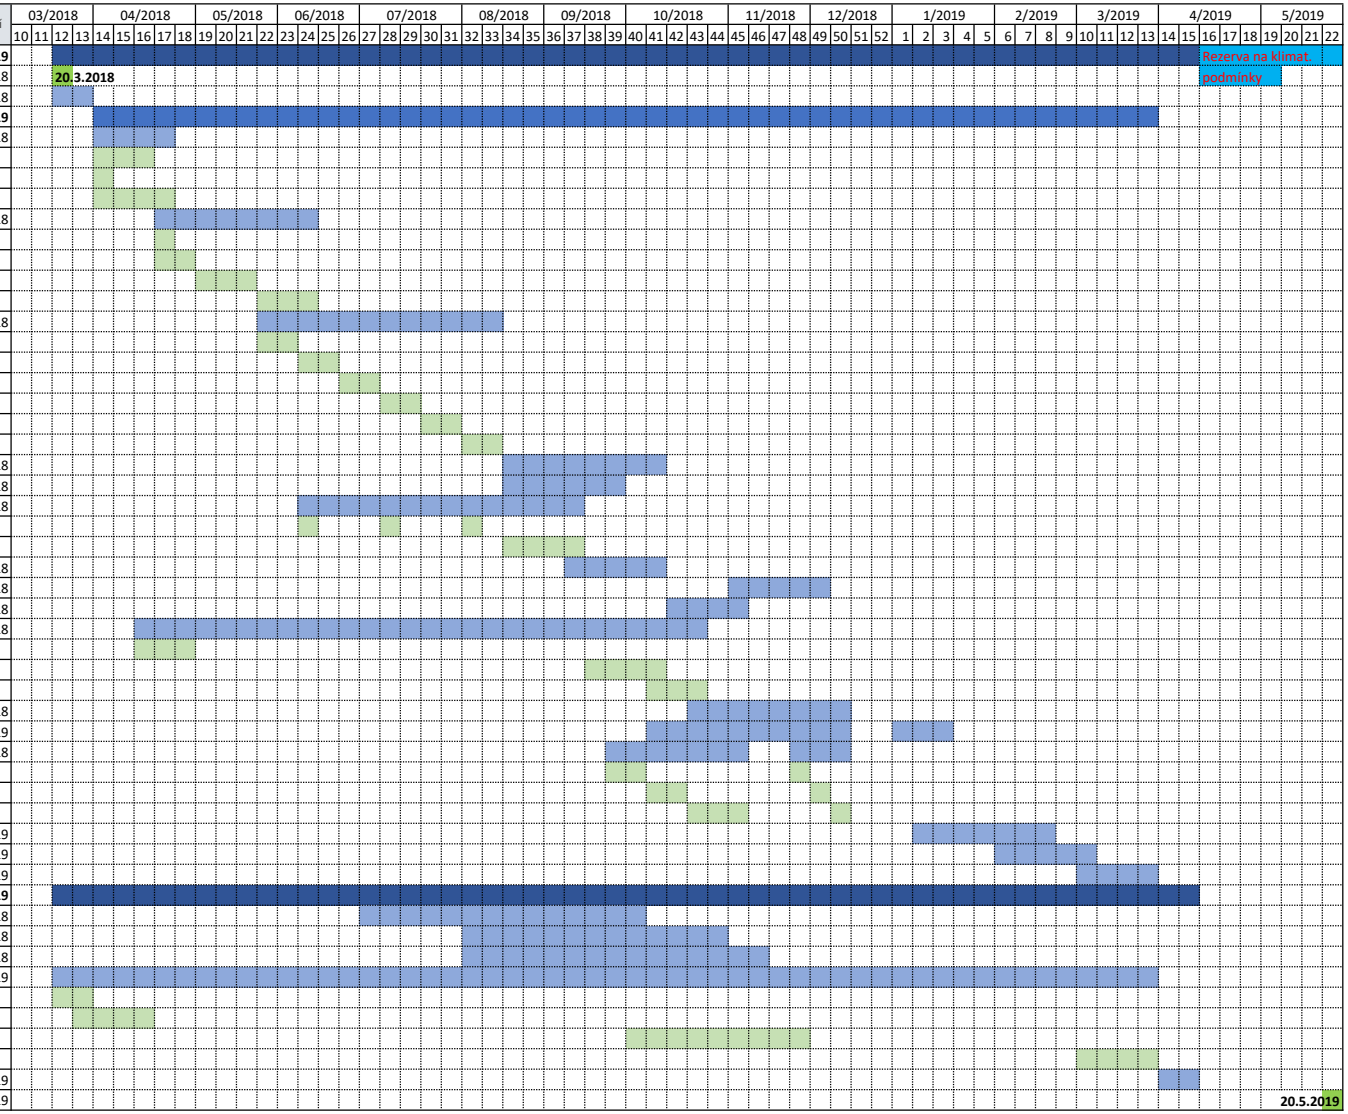

Práce s možností otřesů a vybrací

Obrat (tis.)	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019
	250	500	1000	1000	4000	7000	9000	7000	5000	4000	1500	1500	1000	100	42850
