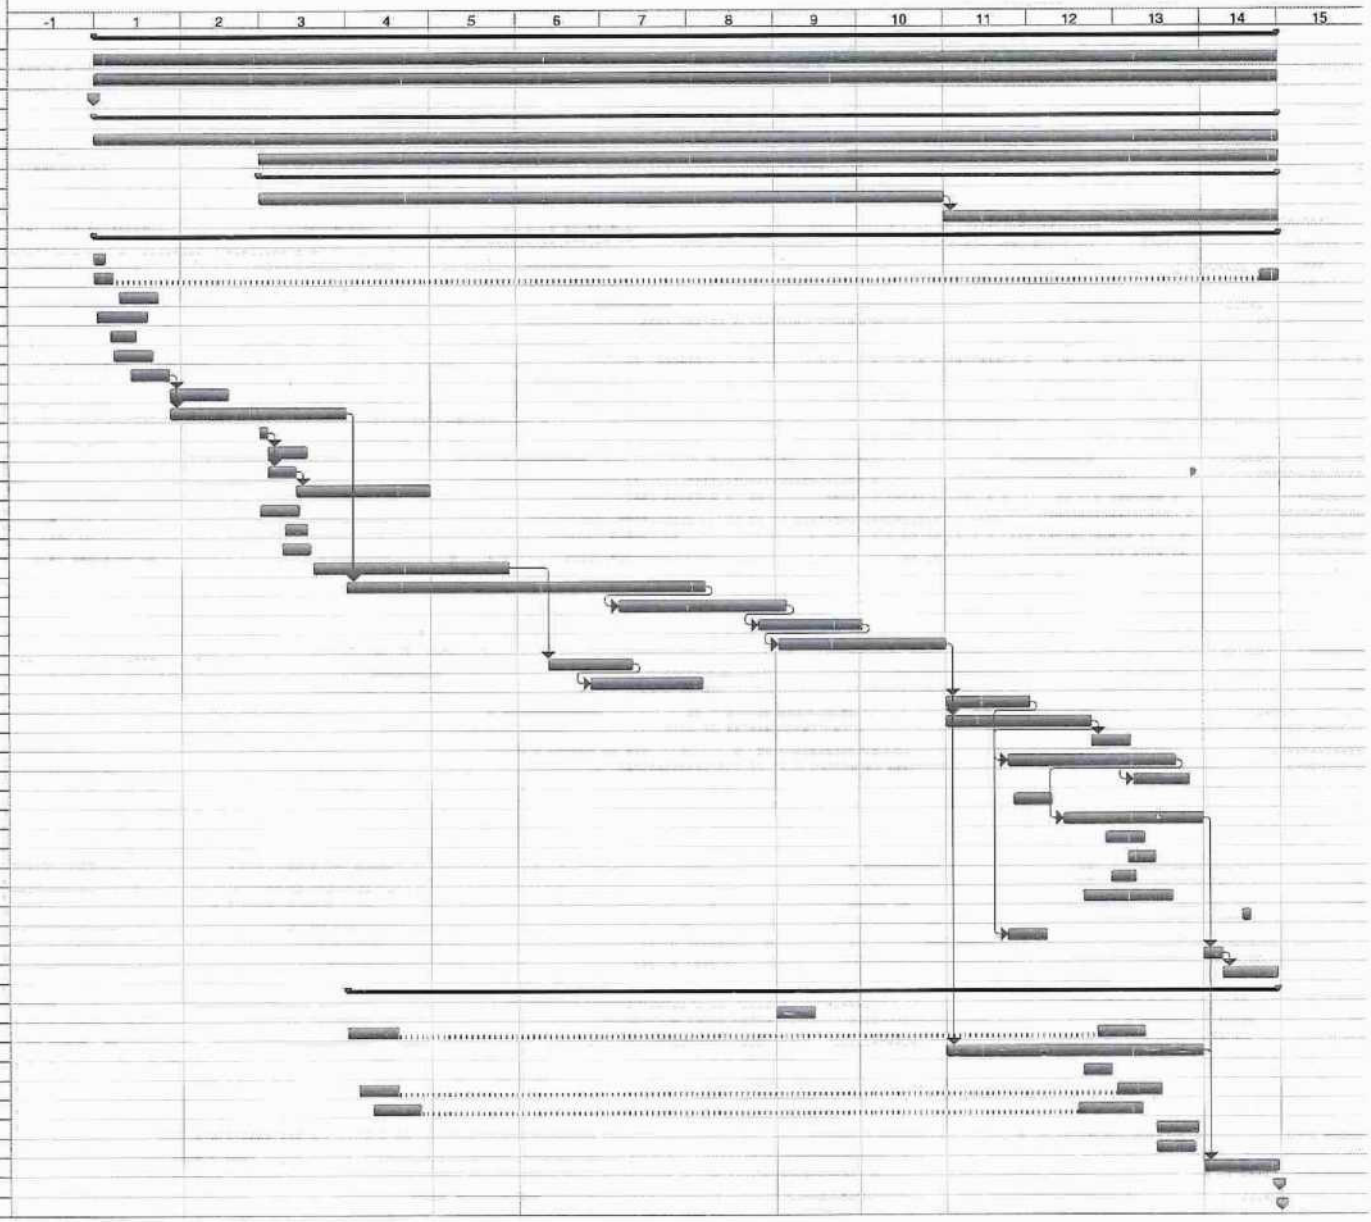ID	SO, PS	Název úkolu	Doba trvání
1		Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí	424 dny
2		Autorský dozor	424 dny
3		Technický dozor investora	424 dny
4		Zahájení stavby	0 dny
5		Zábor - zařízení staveniště - úroveň terénu	424 dny
6		Těžní a montážní šachta	424 dny
7		Výtahová šachta (v chodníku)	365 dny
8		Zábor - zařízení staveniště - úroveň nástupiště	365 dny
9		1. ETAPA	245 dny
10		2. ETAPA	120 dny
11		Stavební objekty	424 dny
12		Příprava území	4 dny
13		Dopravně inženýrská opatření	14 dny
14	SO 07	Komunikace - provizorní úpravy	14 dny
15	SO 08	Vnější kanalizace - provizorní přeložka	18 dny
16	SO 09	Přeložka slaboproudého vedení	9 dny
17	SO 10	Přípojka VN staveniště	14 dny
18		Objekty zařízení staveniště, zpevněná plocha (+ přípojka vody a kanalizace)	14 dny
19		Archeologický průzkum	21 dny
20	SO 03	Šachta 1 - těžní a montážní - ražba + primární ostění	63 dny
21	SO 02	Ve stanici - provizorní informační systém	3 dny
22	SO 06	Ve stanici - osvětlení	14 dny
23	SO 01	Ve stanici - ochrana pěšího provozu	10 dny
24	SO 01	Ve stanici - obklady, demontáž	48 dny
25	SO 01	Objekt č.p. 2068/14 - přípravné práce	14 dny
26	SO 05	Objekt č.p. 2068/14 - vytápění	8 dny
27	SO 04	Objekt č.p. 2068/14 - ZTI	10 dny
28	SO 03	Šachta 2 - výtah na povrch - ražba + primární ostění	70 dny
29	SO 03	Přestupní chodba - ražba + primární ostění	128 dny
30	SO 03	Konstrukce ve stanici	60 dny
31	SO 03	Přestupní chodba - hydroizolace	37 dny
32	SO 03	Přestupní chodba - sekundární ostění	60 dny
33	SO 03	Šachta 2 - výtah na povrch - hydroizolace	30 dny
34	SO 03	Šachta 2 - výtah na povrch - sekundární ostění	40 dny
35	SO 02	Šachta 1 - těžní a montážní - zrušení šachty	30 dny
36	SO 01	Ve stanici - HSV+PSV	52 dny
37	SO 06	Ve stanici - osvětlení	14 dny
38	SO 01	Přestupní chodba - HSV+PSV	60 dny
39	SO 06	Přestupní chodba - osvětlení	20 dny
40	SO 04	Přestupní chodba - ZTI	14 dny
41	SO 01	Objekt č.p. 2068/14 - výtah - HSV+PSV	50 dny
42	SO 05	Objekt č.p. 2068/14 - vytápění	14 dny
43	SO 06	Objekt č.p. 2068/14 - osvětlení	10 dny
44	SO 04	Objekt č.p. 2068/14 - ZTI	9 dny
45	SO 01	Objekt č.p. 2068/14 - obnova obchodu po stavbě - HSV+PSV	32 dny
46	SO 02	Ve stanici - definitivní informační systém	3 dny
47	SO 08	Vnější kanalizace - definitivní přeložka	14 dny
48	SO 10	Přípojka VN staveniště - odstranění	7 dny
49	SO 07	Komunikace - definitivní úpravy	20 dny
50		Provozní soubory	333 dny
51	PS 82	OSM	14 dny
52	PS 91	Silové rozvody	35 dny
53	PS 92	Strojní zařízení	92 dny
54	PS 93-80	EPS	10 dny
55	PS 93	Slaboproudá zařízení	30 dny
56	PS 95	VZT	40 dny
57	PS 96	ASDŘ-T	15 dny
58	PS 97	Tlakové těsnění	14 dny
59		Zkušební provoz, revize, přejímky	27 dny
60		Dokončení stavby, kolaudace	0 dny
61		Uvedení do provozu	0 dny
