Harmonogram stavby: P18-09 Revitalizace PR U Sedmi rybníků - realizace

Zhotovitel : PAS Natura s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
14000 Praha-Nusle
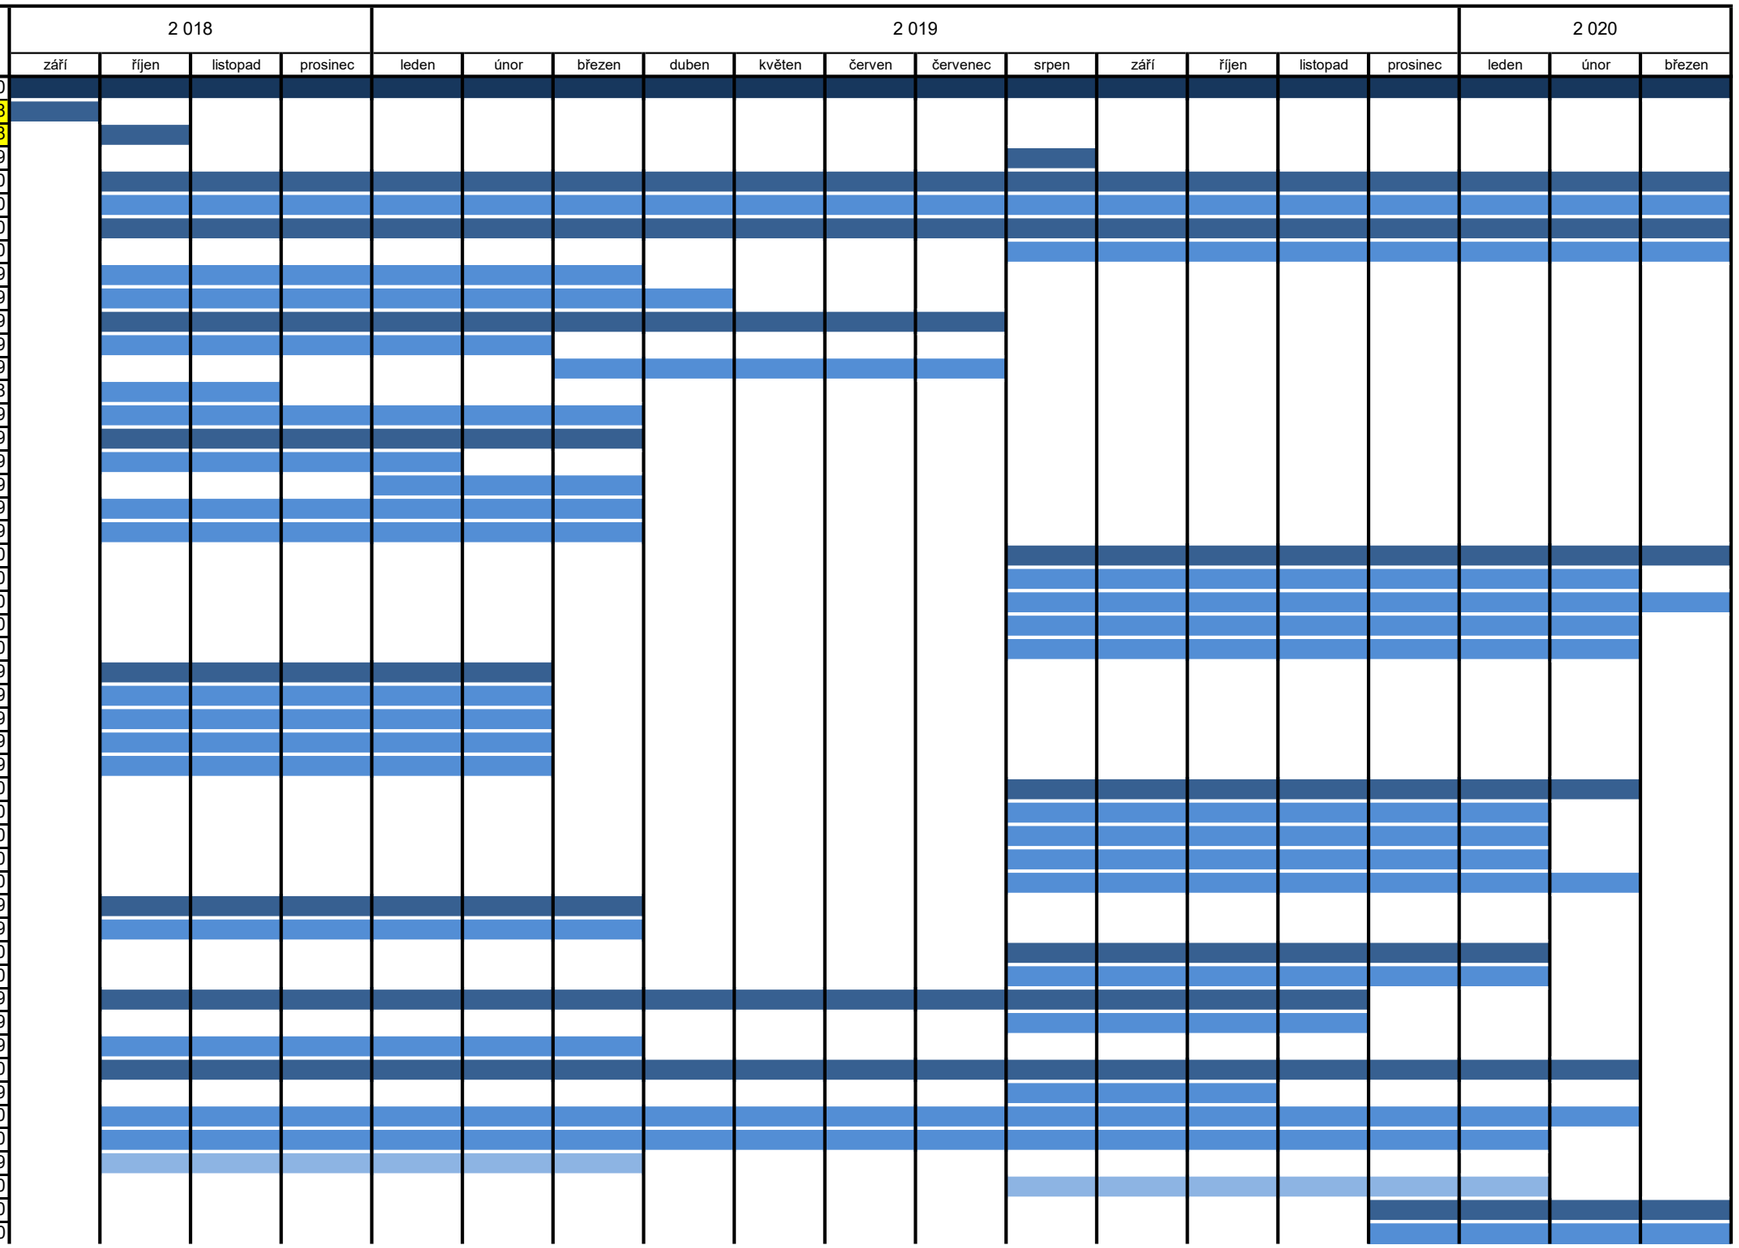
Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti
P18-09	Revitalizace PR U Sedmi rybníků - realiza	03.09.2018	23.03.2020
01	PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ	03.09.2018	03.09.2018
02	ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ I.ETAP	04.10.2018	04.10.2018
03	ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ II.ETAP	15.08.2019	15.08.2019
0VON	Vedlejší a ostatní náklady	05.10.2018	06.03.2020
01	Vedlejší a ostatní náklady	05.10.2018	06.03.2020
SO 00	Bilance odvozů a využití zemin (přísuny r	05.10.2018	20.03.2020
04	SO 00-2 - Etapa 2	16.08.2019	20.03.2020
03	SO 00-1 - Etapa 1	05.10.2018	15.03.2019
02	SO 00-0 - Etapa 0	05.10.2018	05.04.2019
SO 01	Rekonstrukce Velkého Vydýmače	05.10.2018	12.07.2019
05	SO 01-1 - Rekonstrukce hráze VV	05.10.2018	14.02.2019
06	SO 01-2 - Bezpečnostní přeliv VV	27.03.2019	12.07.2019
07	SO 01-3 - Výpustný objekt VV	05.10.2018	30.11.2018
08	SO 01-4 - Úpravy v zátopě VV	05.10.2018	05.03.2019
SO 02	Rekonstrukce Malého Vydýmače	05.10.2018	26.03.2019
09	SO 02-1 - Rekonstrukce hráze MV	05.10.2018	04.01.2019
10	SO 02-2 - Bezpečnostní přeliv MV	07.01.2019	26.03.2019
11	SO 02-3 - Výpustný objekt MV	05.10.2018	21.03.2019
12	SO 02-4 - Úpravy v zátopě MV	05.10.2018	26.03.2019
SO 03	Rekonstrukce Prostředního rybníka	16.08.2019	02.03.2020
13	SO 03-1 - Rekonstrukce hráze ProR	16.08.2019	28.02.2020
14	SO 03-2 - Bezpečnostní přeliv ProR	16.08.2019	02.03.2020
15	SO 03-3 - Výpustný objekt ProR	16.08.2019	18.02.2020
16	SO 03-4 - Úpravy v zátopě ProR	16.08.2019	26.02.2020
SO 04	Rekonstrukce Prázdného rybníka	05.10.2018	22.02.2019
17	SO 04-1 - Rekonstrukce hráze PraR	05.10.2018	22.02.2019
18	SO 04-2 - Bezpečnostní přeliv PraR	05.10.2018	18.02.2019
19	SO 04-3 - Výpustný objekt PraR	05.10.2018	13.02.2019
20	SO 04-4 - Úpravy v zátopě PraR	05.10.2018	04.02.2019
SO 05	Rekonstrukce Hliněného rybníka	16.08.2019	26.02.2020
21	SO 05-1 - Rekonstrukce hráze HliR	16.08.2019	03.01.2020
22	SO 05-2 - Průleh v koruně HliR	16.08.2019	17.01.2020
23	SO 05-3 - Výpustný objekt HliR	16.08.2019	16.01.2020
24	SO 05-4 - Úpravy v zátopě HliR	16.08.2019	26.02.2020
SO 06	Rekonstrukce průtočného zařízení mezi V	05.10.2018	14.03.2019
25	SO 06 - Rekonstrukce průtočného zařízen	05.10.2018	14.03.2019
SO 07	Rekonstrukce průtočného zařízení mezi P	16.08.2019	22.01.2020
26	SO 07 - Rekonstrukce průtočného zařízen	16.08.2019	22.01.2020
SO 08	Vegetační úpravy	05.10.2018	08.11.2019
28	SO 08-2 - Nové výsadby	16.08.2019	08.11.2019
27	SO 08-1.2 - Kácení a mýcení stávajících	05.10.2018	13.03.2019
SO 09	Příjezdy ke stavbě	05.10.2018	04.02.2020
29	SO 09-1 - Úprava sjezdu ze silnice III/213	16.08.2019	02.10.2019
30	SO 09-2 - Příjezdové komunikace	05.10.2018	04.02.2020
31	SO 09-3 - Vnitrostaveništní komunikace	05.10.2018	13.01.2020
31	SO 09-3 - Vnitrostaveništní komunikace	05.10.2018	04.03.2019
31	SO 09-3 - Vnitrostaveništní komunikace	16.08.2019	13.01.2020
SO 99	Ostatní opatření (rekultivace)	16.12.2019	23.03.2020
32	SO 99 - Ostatní opatření (rekultivace)	16.12.2019	23.03.2020
