Metrostav, a.s., DIVIZE 1

oblast Jihomoravský region

Vídeňská 121, 619 00 Brno

BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY - BRNO CEJL

Harmonogram

DOBA REALIZACE - 440 DNÍ

Část	Datum
Předání a převzetí staveniště - zahájení prací	
D.1.1. Sanace - Bourání zděných konstrukcí + vysekání otvorů + demolice části objektu	
D.1.1. Sanace - Otlučení stávajících omítek	
D.1.1.b ASŘ - Demontáž oken, dveří, pavlačí	
D.1.1.b ASŘ - Bourání střešní konstrukce	
D.1.2. SKŘ - Statické zesílení stáv. zdiva	
D.1.1.b ASŘ - Bourání konstrukcí podlah, odstranění násypů	
D.1.1.b ASŘ - Zemní práce	
D.1.2. SKŘ - Základové konstrukce + statické podchycení	
D.1.2. SKŘ - Vodorovné nosné konstrukce	
D.1.1.b ASŘ - Svislé konstrukce - dozdívky	
D.1.1.b ASŘ - Střešní konstrukce + klempířké konstrukce	
Technické zařízení budov	
D.1.1.b ASŘ - Okna, výplně otvorů - exteriér	
D.1.1.b ASŘ - Omítky - interiér	
D.1.1.b ASŘ - Potěry	
D.1.1.b ASŘ - SDK Konstrukce	
D.1.1.b ASŘ - Malby	
D.1.1.b ASŘ - Výplně otvorů - interiér	
D.1.1.b ASŘ - Obklady, nášlapné vrstvy podlah	
D.1.1.b ASŘ - Fasáda	
dokončovací práce	
D.2.1. Komunikace	
D.2.3. Sadové úpravy	

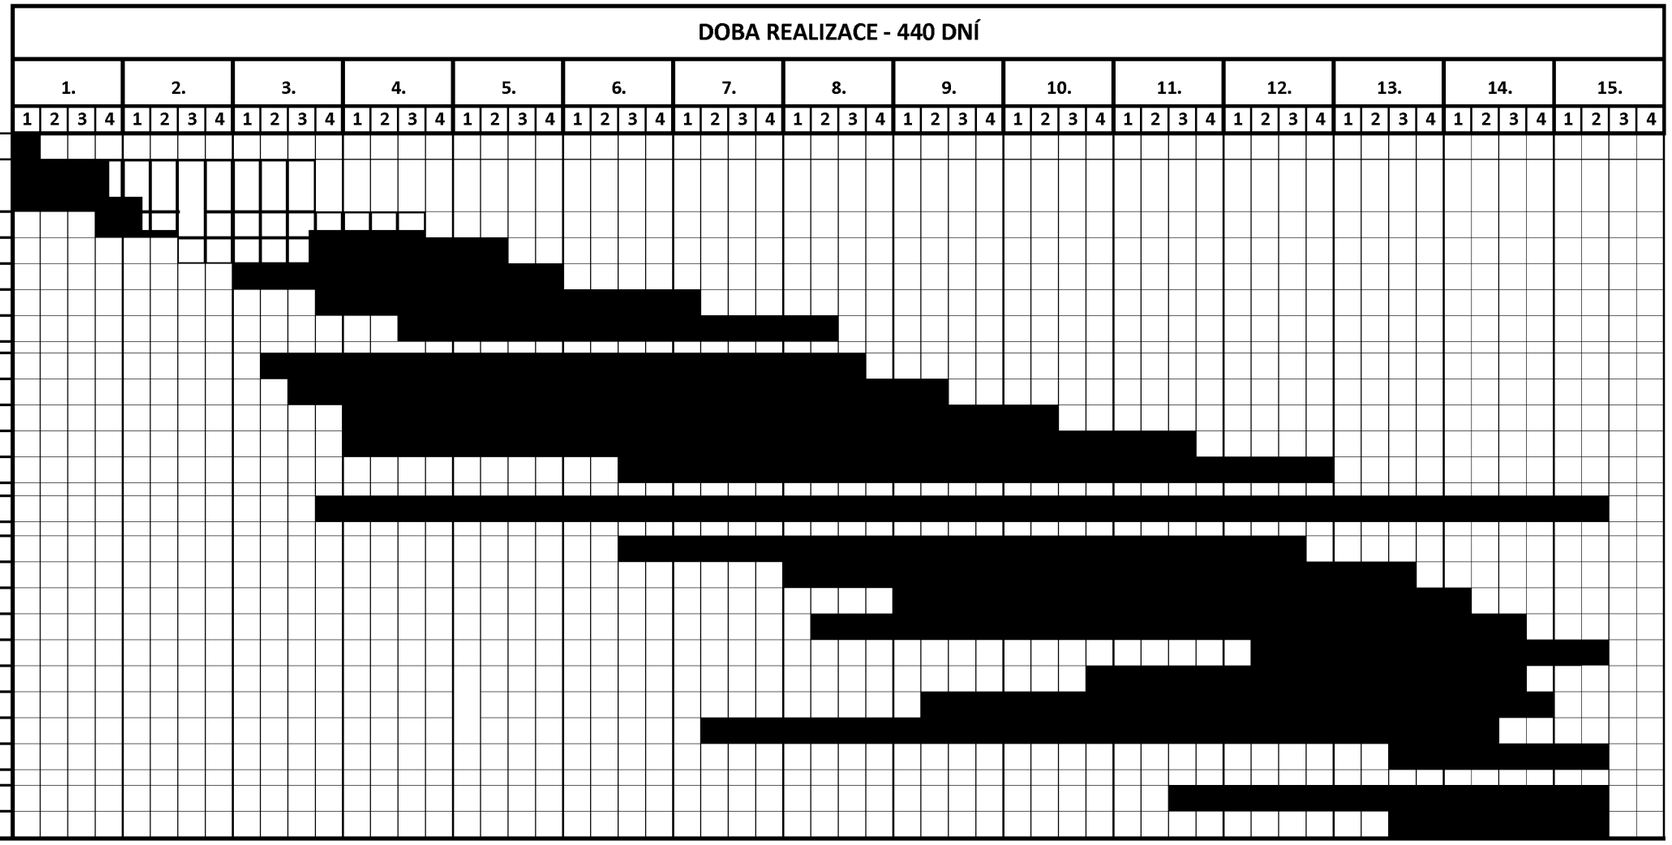

V Brně dne: 14.5.2019
