Časový plán výstavby - Harmonogram postupu prací

18 -016 Rozšíření odbavovacíh přepážek v Terminálu 2- platný k (17.7.2019) - dodatek ke smlouvě č. 1
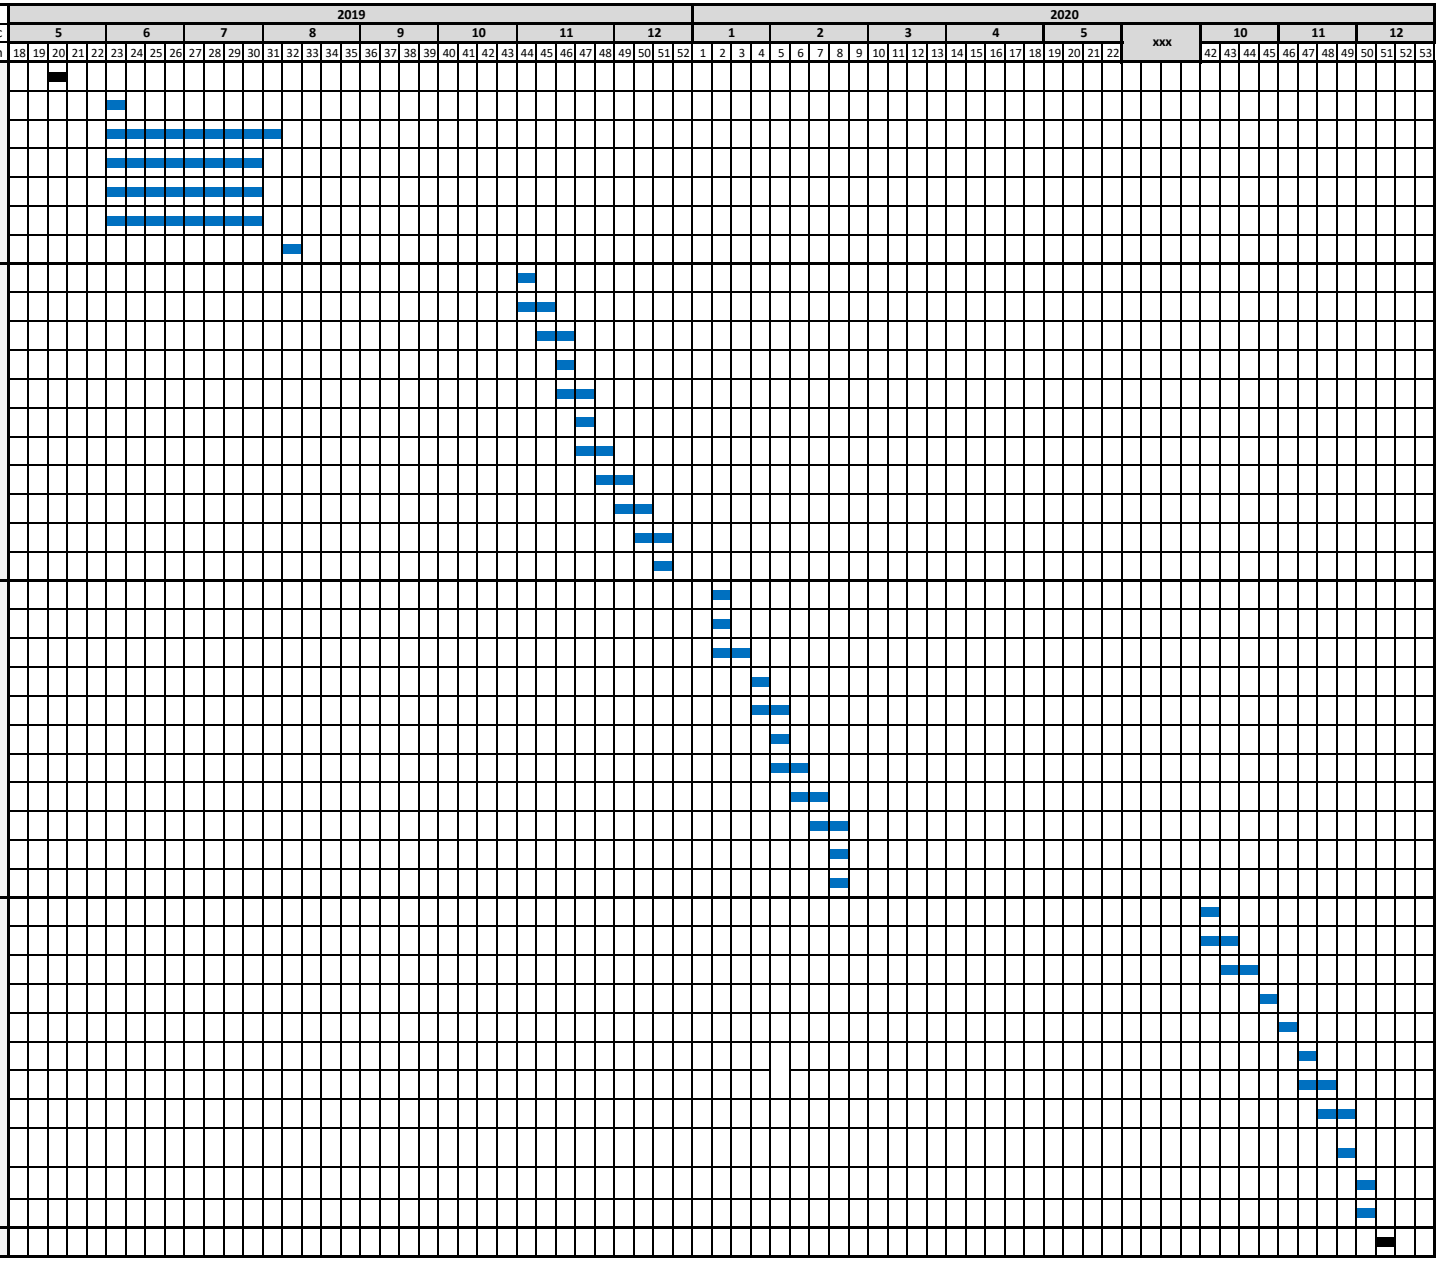
P.č.	Etapa	Položka	Začátek	Konec	Délka trvání
0.		Podpis smlouvy	16.05.2019	16.05.2019	1 den
1.		Kick off meeting	04.06.2019	04.06.2019	1 den
2.		Design, specifikace, inženýring	05.06.2019	30.07.2019	40 dní
3.		Mechanické specifikace	05.06.2019	23.07.2019	35 dní
4.		Funkční specifikace	05.06.2019	23.07.2019	35 dní
5.		Detailní inženýring	05.06.2019	23.07.2019	35 dní
6.		Schválení zákazníkem	06.08.2019	06.08.2019	1 den
0.	Check in island No.1	Dočasný částečný zábor u CIO1	31.10.2019	31.10.2019	1 den
1.		Odpojení silnoproudých a slaboproudých rozvodů	01.11.2019	04.11.2019	2 dny
2.		Demontáž a montáž ocelové konstrukce	05.11.2019	11.11.2019	5 dnů
3.		Zapojení sl. a sil. Rozvodů v návaznosti na OK	12.11.2019	12.11.2019	1 den
4.		Montáž sil. a sl. rozvodů supervizorských stanovišť	13.11.2019	18.11.2019	4 dny
5.		Osazení svítidel a držáků FIDS	19.11.2019	21.11.2019	3 dny
6.		Montáž nábytku supervizorů	22.11.2019	28.11.2019	5 dnů
7.		Montáž zdovejné podlahy	29.11.2019	03.12.2019	3 dny
8.		Technické prohlídky	04.12.2019	09.12.2019	4 dny
9.		Demontáže záborů úklid staveniště	10.12.2019	16.12.2019	5 dnů
10.		Dílčí předání díla Objednateli	17.12.2019	17.12.2019	1 den
0.	Check in island No.2	Dočasný částečný zábor u CIO2	06.01.2020	06.01.2020	1 den
1.		Odpojení silnoproudých a slaboproudých rozvodů	07.01.2020	08.01.2020	2 dny
2.		Demontáž a montáž ocelové konstrukce	09.01.2020	17.01.2020	7 dnů
3.		Zapojení sl. a sil. Rozvodů v návaznosti na OK	20.01.2020	20.01.2020	1 den
4.		Montáž sil. a sl. rozvodů supervizorských stanovišť	21.01.2020	27.01.2020	5 dnů
5.		Osazení svítidel a držáků FIDS	28.01.2020	30.01.2020	3 dny
6.		Montáž nábytku supervizorů	31.01.2020	06.02.2020	5 dnů
7.		Montáž zdovejné podlahy	07.02.2020	12.02.2020	4 dny
8.		Technické prohlídky	13.02.2020	17.02.2020	3 dny
9.		Demontáže záborů úklid staveniště	18.02.2020	20.02.2020	3 dny
10.		Dílčí předání díla Objednateli	21.02.2020	21.02.2020	1 den
0.	Check in island No.3	Dočasný částečný zábor u CIO3	15.10.2020	15.10.2020	1 den
1.		Odpojení silnoproudých a slaboproudých rozvodů	16.10.2020	21.10.2020	4 dny
2.		Demontáž a montáž ocelové konstrukce	22.10.2020	30.10.2020	7 dnů
3.		Zapojení sl. a sil. Rozvodů v návaznosti na OK	02.11.2020	06.11.2020	5 dnů
4.		Montáž sil. a sl. rozvodů supervizorských stanovišť	09.11.2020	13.11.2020	5 dnů
5.		Osazení svítidel a držáků FIDS	16.11.2020	19.11.2020	4 dny
6.		Montáž nábytku supervizorů	20.11.2020	25.11.2020	4 dny
7.		Montáž zdovejné podlahy	26.11.2020	01.12.2020	4 dny
8.		Technické prohlídky	02.12.2020	04.12.2020	3 dny
9.		Demontáže záborů úklid staveniště	07.12.2020	09.12.2020	3 dny
10.		Dílčí předání díla Objednateli	10.12.2020	10.12.2020	1 den
1.		Předání celého díla Objednateli	17.12.2020	17.12.2020	1 den
