ÚVN - VoFN Praha - přístavba pavilonu CH1

předpokládaný HMG - NABÍDKA 26.2.2020

STRABAG

ID	Task Name	Doba trvání	Text2	Zahájení	Dokončení
1	**1 Klíčové termíny - přepoklad**	**410 dny**		**28.02. 20**	**11.05. 21**
2	1.1 Předání nabídek	1 den		28.02. 20	28.02. 20
3	1.2 Potvrzení vybraného dodavatele	1 den		21.03. 20	21.03. 20
4	1.3 Podpis SoD	7 dny		05.04. 20	15.04. 20
5	1.4 Předpokládaný termín předání staveniště	1 den		16.04. 20	16.04. 20
7	1.6 Limitní termín dokončení díla	0 dny		11.05. 21	11.05. 21
10	**2 Milníky**	**358 dny**		**16.04. 20**	**02.05. 21**
11	2.1 Předání staveniště - předpoklad	1 den		16.04. 20	16.04. 20
12	**2.2 Cybre Knife**	**126 dny**		**15.09. 20**	**02.02. 21**
13	2.2.1 Fáze 1 - montáž OK rámu	2 dny		15.09. 20	16.09. 20
14	2.2.2 Fáze II - stavební připravenost pro instalaci CyberKnife	1 den		02.02. 21	02.02. 21
15	2.3 Předání díla	0 dny		02.05. 21	02.05. 21
16	**3 Realizace**	**387 dny**		**25.03. 20**	**15.04. 21**
17	3.1 Zahájení prací	0 dny		20.04. 20	20.04. 20
18	3.2 Vytyčení stávajících sítí	14 dny		20.04. 20	04.05. 20
19	**3.3 Zařízení staveniště**	**78 dny**		**20.04. 20**	**10.07. 20**
23	**3.4 IO 310 Příprava území**	**360 dny**		**25.03. 20**	**15.04. 21**
24	3.4.1 Kácení stromů - předpoklad vykáceno mimo vegeteční obdob	7 dny		25.03. 20	31.03. 20
25	3.4.2 Demolice zpevněných ploch	7 dny		17.04. 20	23.04. 20
26	3.4.3 Sejmutí ornice	4 dny		24.04. 20	27.04. 20
27	**3.4.4 IO 311 HTÚ**	**25 dny**		**28.04. 20**	**24.05. 20**
30	**3.4.5 SO 210 Úpravy podzemní technické chodby**	**35 dny**		**06.05. 20**	**10.06. 20**
32	**3.4.6 SO 220 Úpravy ve stávajících objektech**	**299 dny**		**24.04. 20**	**07.03. 21**
33	**3.4.6.1 Úpravy stávající pavilon CH 1**	**288 dny**		**26.04. 20**	**26.02. 21**
40	**3.4.6.2 Úpravy větrací Kanál**	**49 dny**		**26.05. 20**	**15.07. 20**
44	**3.4.6.3 Úpravy energocentra**	**299 dny**		**24.04. 20**	**07.03. 21**
59	**3.4.7 SO 110 Přístavba pavilonu CH1**	**312 dny**		**06.05. 20**	**31.03. 21**
60	**3.4.7.1 Nosná kce - ŽB vč trubkování**	**131 dny**		**25.05. 20**	**05.10. 20**
77	**3.4.7.2 Vstupní lávka - ŽB**	**59 dny**		**07.09. 20**	**06.11. 20**
84	**3.4.7.3 Ocelové kce**	**42 dny**		**07.09. 20**	**19.10. 20**

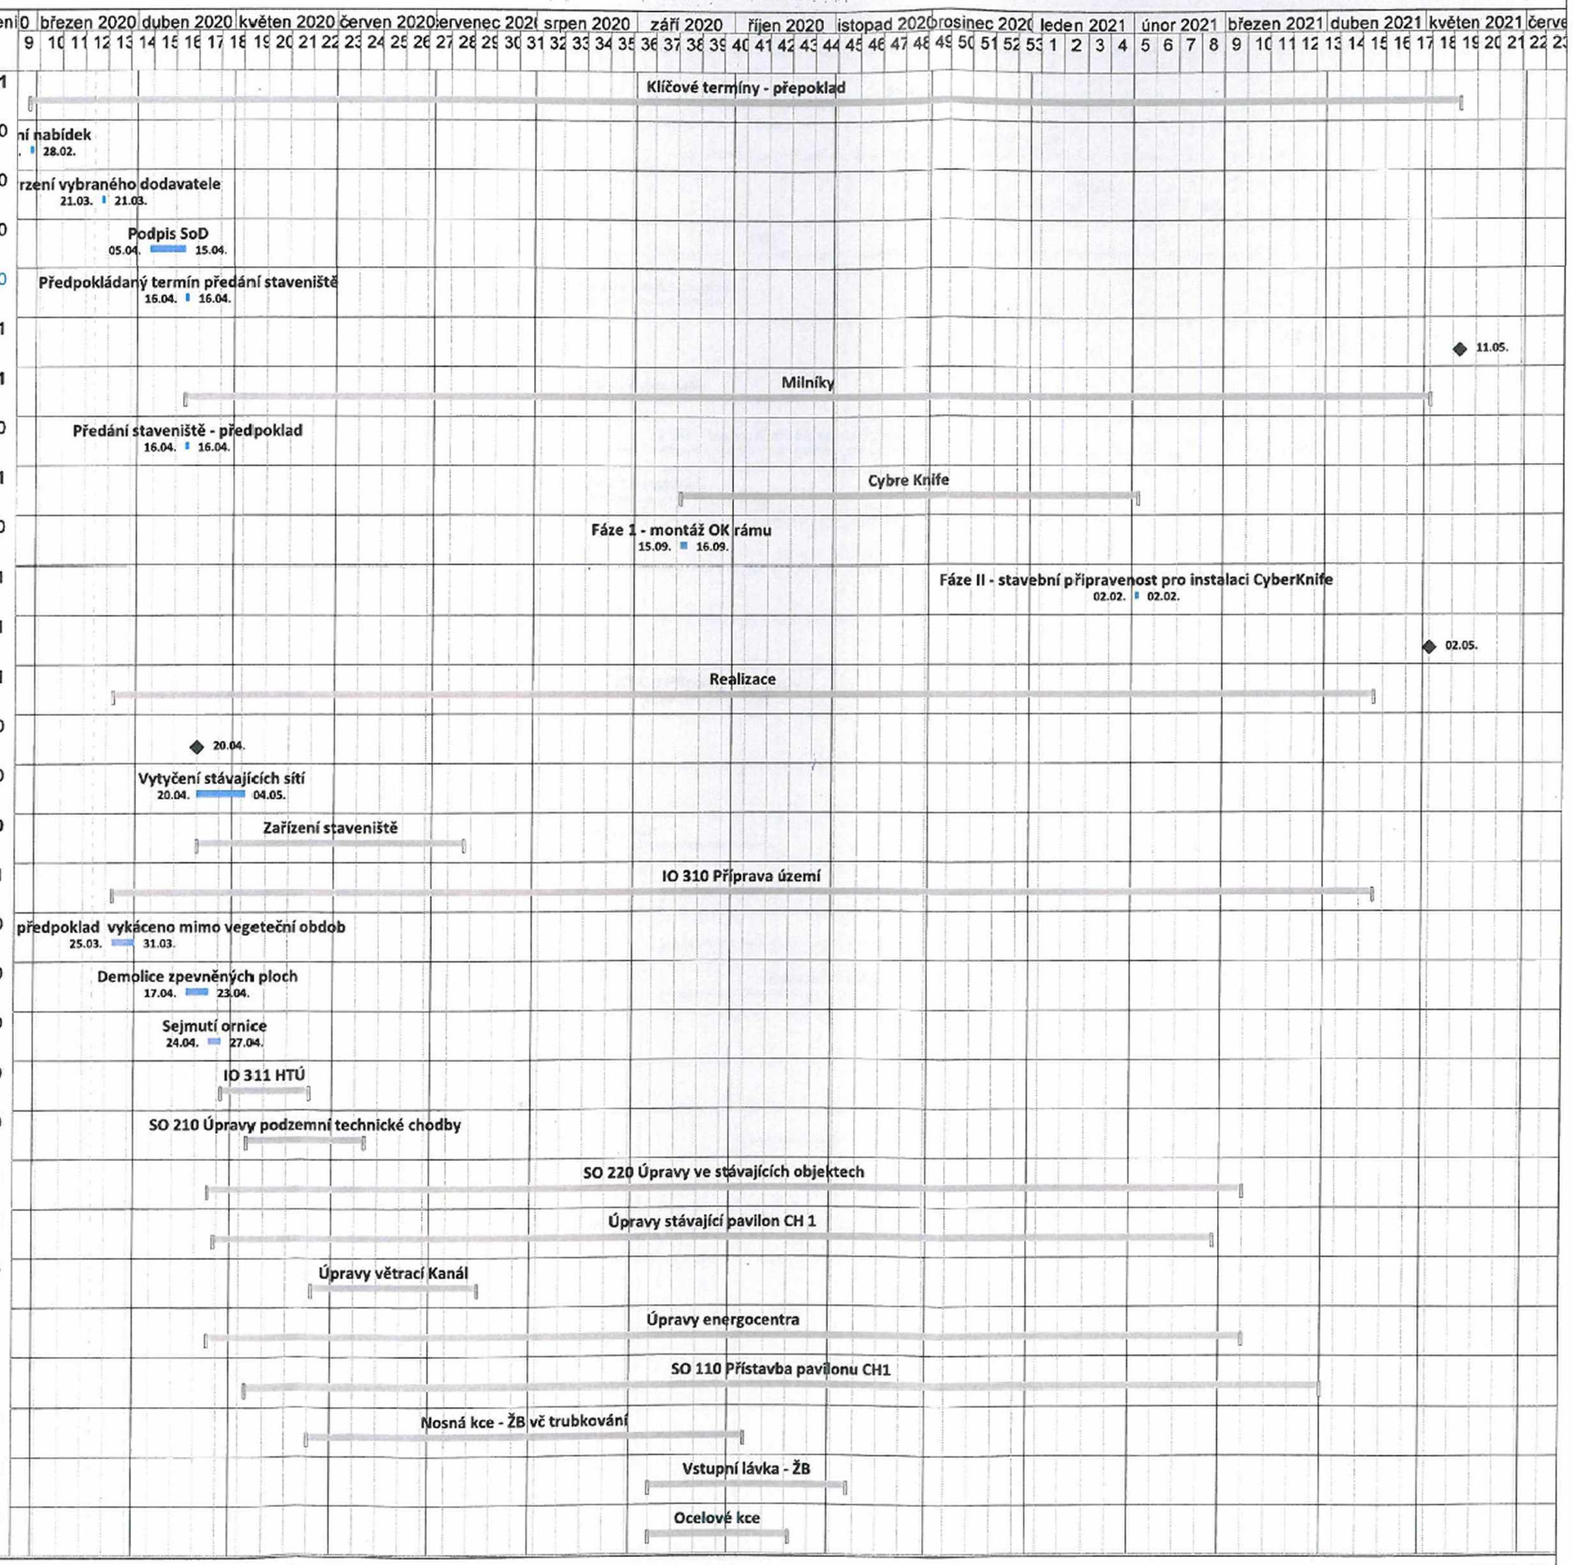

ÚVN - VoFN Praha - přístavba pavilonu CH1

předpokládaný HMG - NABÍDKA 26.2.2020

STRABAG
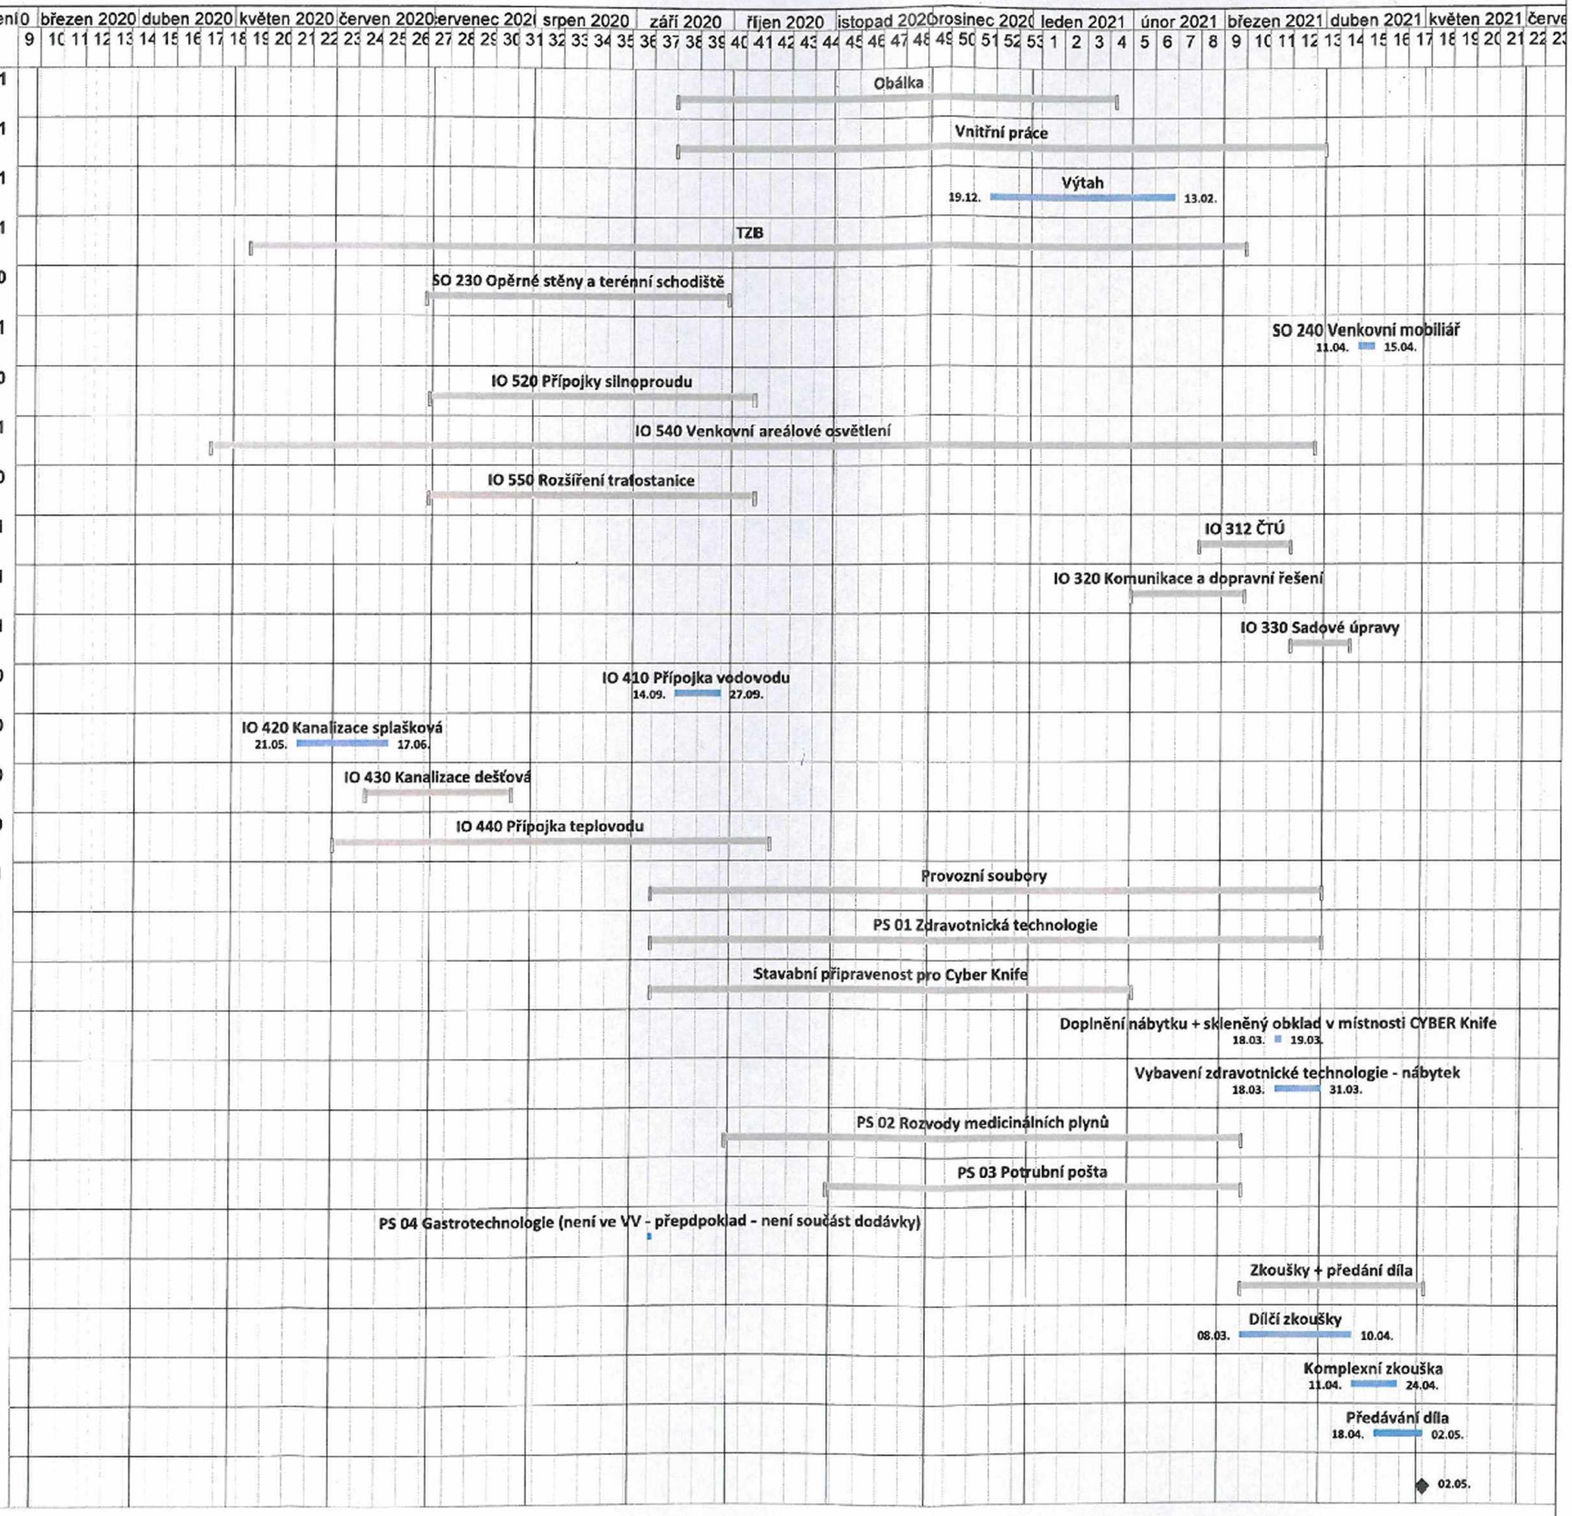
ID	Task Name	Doba trvání	Text2	Zahájení	Dokončení
88	3.4.7.4 Obálka	120 dny		14.09. 20	26.01. 21
91	3.4.7.5 Vnitřní práce	184 dny		14.09. 20	31.03. 21
112	3.4.7.6 Výtah	45 dny		19.12. 20	13.02. 21
113	3.4.7.7 TZB	288 dny		06.05. 20	07.03. 21
119	3.4.8 SO 230 Opěrné stěny a terénní schodiště	90 dny		29.06. 20	29.09. 20
122	3.4.9 SO 240 Venkovní mobiliář	5 dny		11.04. 21	15.04. 21
123	3.4.10 IO 520 Přípojky silnoproudu	97 dny		30.06. 20	07.10. 20
127	3.4.11 IO 540 Venkovní areálové osvětlení	320 dny		24.04. 20	28.03. 21
	3.4.12 IO 550 Rozšíření trafostanice	97 dny		30.06. 20	07.10. 20
136	3.4.13 IO 312 ČTÚ	28 dny		22.02. 21	21.03. 21
139	3.4.14 IO 320 Komunikace a dopravní řešení	35 dny		01.02. 21	07.03. 21
142	3.4.15 IO 330 Sadové úpravy	14 dny		22.03. 21	08.04. 21
145	3.4.16 IO 410 Přípojka vodovodu	14 dny		14.09. 20	27.09. 20
146	3.4.17 IO 420 Kanalizace splašková	28 dny		21.05. 20	17.06. 20
147	3.4.18 IO 430 Kanalizace dešťová	43 dny		11.06. 20	25.07. 20
151	3.4.19 IO 440 Přípojka teplovodu	131 dny		01.06. 20	12.10. 20
154	3.5 Provozní soubory	191 dny		07.09. 20	31.03. 21
155	3.5.1 PS 01 Zdravotnická technologie	191 dny		07.09. 20	31.03. 21
	3.5.1.1 Stavabní připravenost pro Cyber Knife	133 dny		07.09. 20	01.02. 21
166	3.5.1.2 Doplnění nábytku + skleněný obklad v místnosti CYBER Knife	2 dny		18.03. 21	19.03. 21
167	3.5.1.3 Vybavení zdravotnické technologie - nábytek	14 dny		18.03. 21	31.03. 21
168	3.5.2 PS 02 Rozvody medicinálních plynů	145 dny		30.09. 20	07.03. 21
173	3.5.3 PS 03 Potrubní pošta	115 dny		31.10. 20	07.03. 21
176	3.5.4 PS 04 Gastrotechnologie (není ve VV - přepdpoklad - není součást dodávky)				
177	4 Zkoušky + předání díla	51 dny		08.03. 21	02.05. 21
178	4.1 Dílčí zkoušky	30 dny		08.03. 21	10.04. 21
179	4.2 Komplexní zkouška	14 dny		11.04. 21	24.04. 21
180	4.3 Předávání díla	14 dny		18.04. 21	02.05. 21
181	4.4 Předání díla	0 dny		02.05. 21	02.05. 21
