ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1			**Vřídelní kolonáda - oprava**	135 dny	07.07. 20	11.01. 21
2			Předání staveniště	1 den	07.07. 20	07.07. 20
3			Zahájení prací vytyčení, kontrola podepření	5 dny	09.07. 20	15.07. 20
4			Řezání a bourání stropní konstrukce deska	16 dny	16.07. 20	06.08. 20
5			Přestavba podepření stropní konstrukce	5 dny	07.08. 20	13.08. 20
6			Bourání průvlaků, podpěrné konstrukce sloupů	10 dny	14.08. 20	27.08. 20
7			Odstranění betonových sloupů, zajištění ocel sloupů horní stavby	11 dny	28.08. 20	11.09. 20
8			Nové sloupy	14 dny	14.09. 20	01.10. 20
9			Osazení nosníků	5 dny	02.10. 20	08.10. 20
10			Stropní deska	16 dny	09.10. 20	30.10. 20
11			Práce objednatele	31 dny	02.11. 20	14.12. 20
12			Dokončení stropní desky	10 dny	15.12. 20	28.12. 20
13			Základy nádrže	10 dny	29.12. 20	11.01. 21

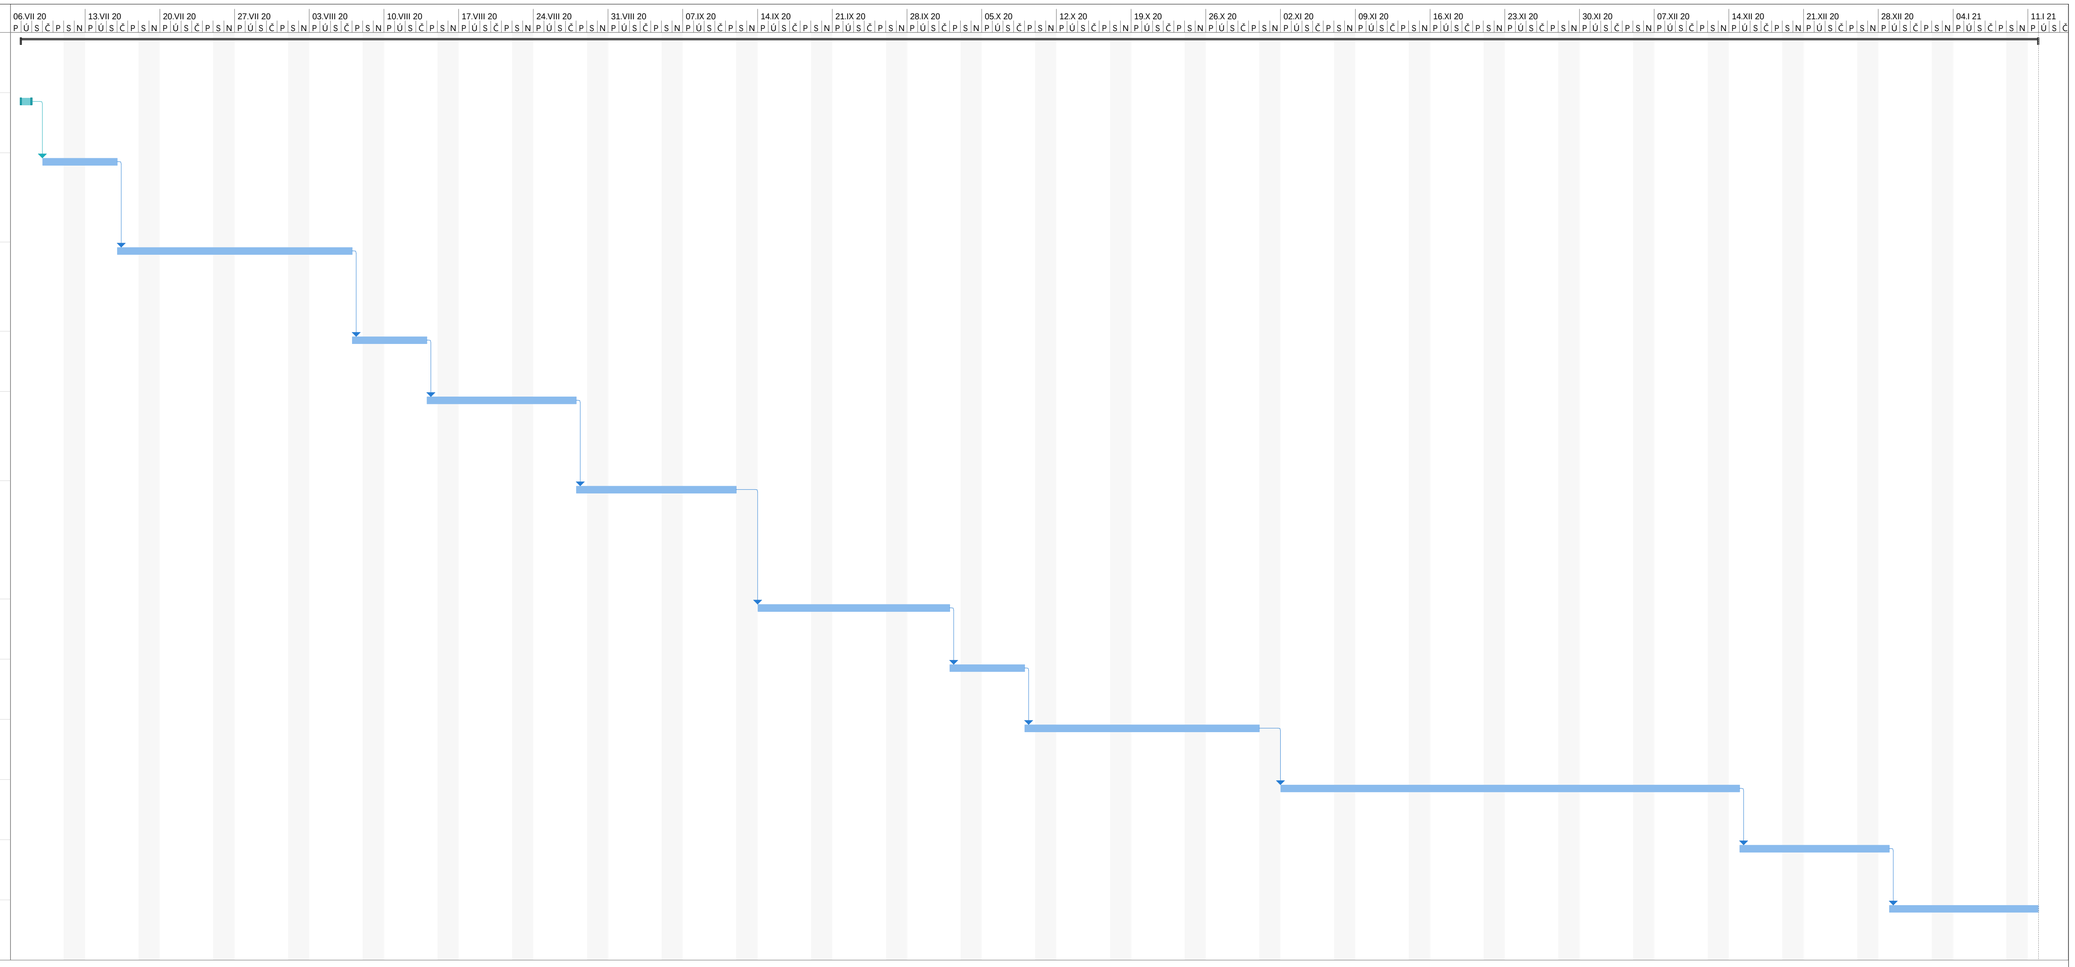

Projekt: harmonogram vridelni
Datum: 24.04. 20

Úkol		Souhrnný		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
Rozdělení		Souhrn projektu		Neaktivní souhrn		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení		Konečný termín			
Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhrn		Vnější úkoly		Průběh			
