Harmonogram stavebních prací (orientační časový harmonogram)

Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice

Popis	Doba trvání (v týdnech)	rok 2022 (předpoklad 10.01.2022 - 15.12.2022) Počet týdnů od zahájení realizace
Převzetí staveniště - zahájení realizace	-	
Zřízení zařízení staveniště, přípravné práce	2	
Demolice stávajícího objektu SO 00	7	
Stavební objekt SO 01	41	
Stavební objekt SO 01 - TZB	27	
SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09	47	
Ostatní související práce, VRN	49	
Dokončovací práce, úklidy	4	
Likvidace zařízení staveniště	2	
Předání stavby - dokončení realizace	-	

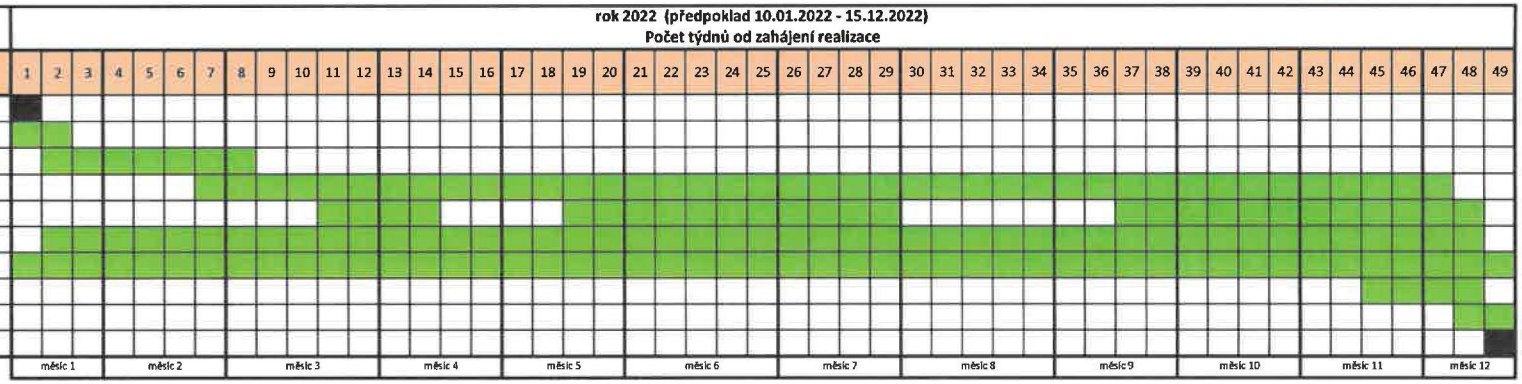

Celková předpokládaná délka realizace v týdnech: **48,6**

Celková předpokládaná délka realizace v kal. dnech: **340**

pozn. včetně převzetí/předání staveniště (stavby)

pozn. časový harmonogram stavebních prací je týdenní a je orientačního charakteru - bude upřesněn v návaznosti na realizační požadavky

pozn. předpoklad zahájení plnění je 10.01.2022 (viz "Lhůty plnění" 5.1 ze ZD)

pozn. předpoklad ukončení plnění je 15.12.2022 (viz "Lhůty plnění" 5.2 ze ZD)

Finanční harmonogram - předpoklad čerpání financí v průběhu stavby (orientační finanční harmonogram)

Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice

	100%	5%	7%	8%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	8%
Cena celkem v Kč bez DPH:	42 981 000 Kč	2 149 050 Kč	3 008 670 Kč	3 438 480 Kč	3 868 290 Kč	3 868 290 Kč	3 868 290 Kč	3 868 290 Kč	3 868 290 Kč	3 868 290 Kč	3 868 290 Kč	3 868 290 Kč	3 438 480 Kč
		měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8	měsíc 9	měsíc 10	měsíc 11	měsíc 12

pozn. finanční harmonogram je rozdělen na jednotlivé měsíce a je orientačního charakteru - bude upřesněn v návaznosti na realizační požadavky

pozn. finanční harmonogram obsahuje čerpání financí bez ohledu na pozastávku, pozastávka (příp. bank. záruka) bude zohledněna v reálném finančním plnění dle SoD

[redacted]

na základě plné moci
MORYS s. r. o.

Příloha č. 2
