Předběžný harmonogram prací Rekonstrukce objektu č.p.200 Strašnice na základní školu
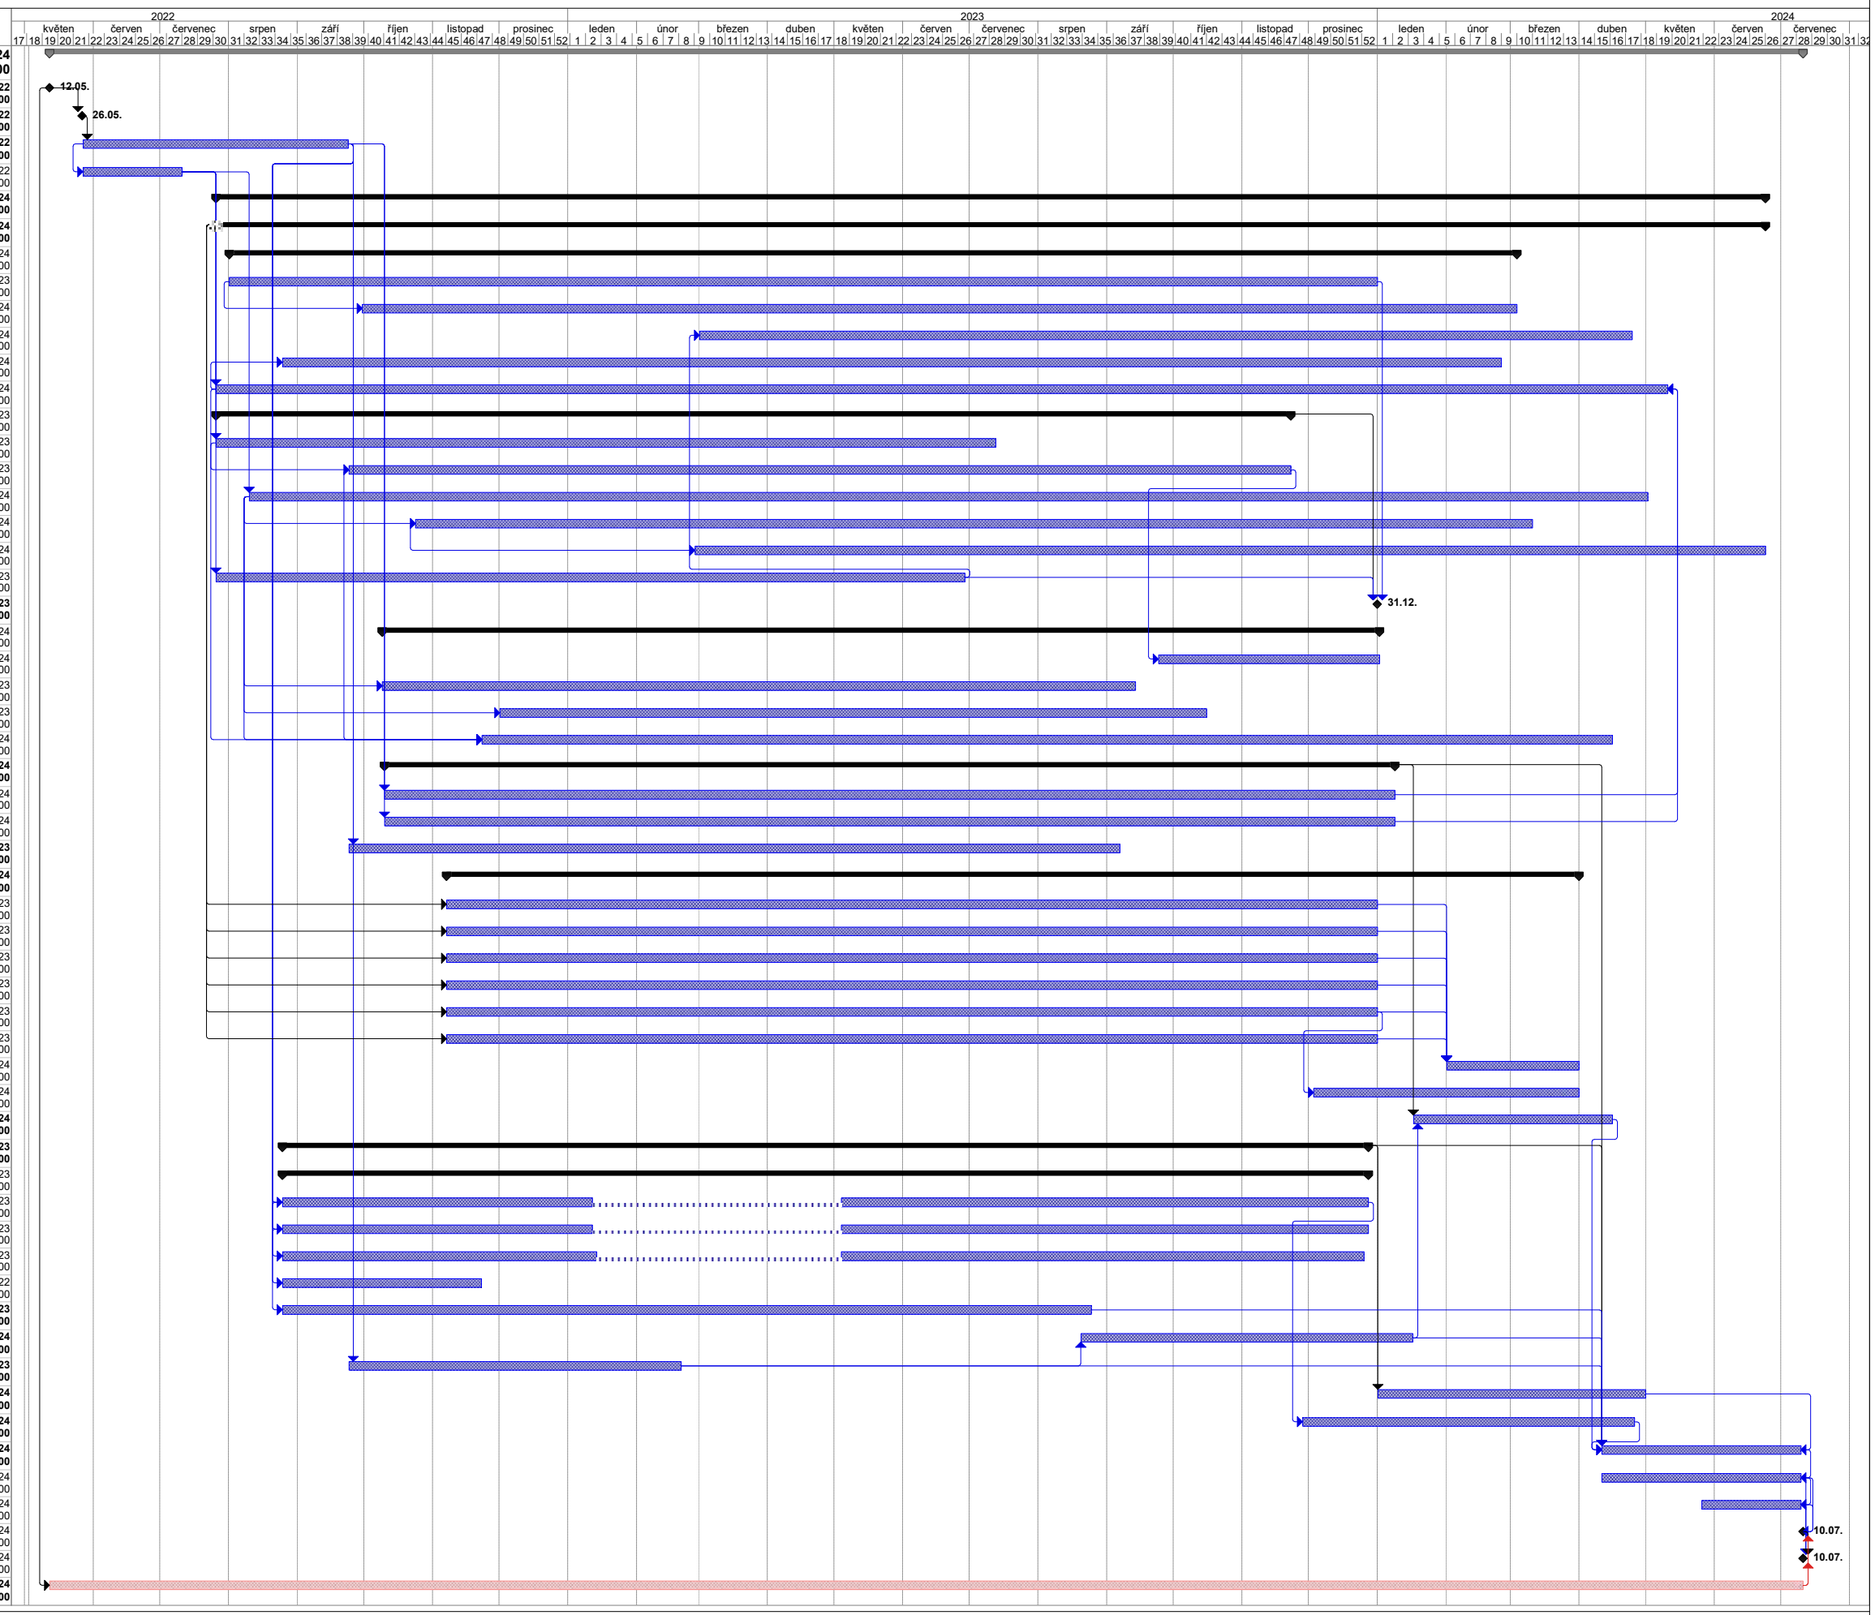
ID	SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0		**Rekonstrukce objektu č.p.200 Strašnice na základní školu**	**791 dny**	**12.05. 2022 8:00**	**10.07. 2024 17:00**
1		**Předání staveniště**	**0 dny**	**12.05. 2022 8:00**	**12.05. 2022 8:00**
2		**Zahájení stavebních prací**	**0 dny**	**26.05. 2022 17:00**	**26.05. 2022 17:00**
3	**01**	**Příprava území**	**120 dny**	**27.05. 2022 8:00**	**23.09. 2022 17:00**
4		Příprava staniště a ZS - připojení kanalizace, elektro, aj.	45 dny	27.05. 2022 8:00	10.07. 2022 17:00
5	**02**	**Stavební objekt ZŠ**	**699 dny**	**26.07. 2022 8:00**	**23.06. 2024 17:00**
6	**02.1**	**Architektonicko-stavební část**	**699 dny**	**26.07. 2022 8:00**	**23.06. 2024 17:00**
7	02.1.1	Podlahy - bourání + nový stav	581 dny	01.08. 2022 8:00	03.03. 2024 17:00
8		Podlahy - bourání	518 dny	01.08. 2022 8:00	31.12. 2023 17:00
9		Podlahy - nový stav	521 dny	30.09. 2022 8:00	03.03. 2024 17:00
10	02.1.2	Konstrukce SDK - podhledy, příčky	421 dny	01.03. 2023 8:00	24.04. 2024 17:00
11	02.1.3	Výplně otvorů - okna, dveře, prosklené stěny, prosklená fasáda	550 dny	25.08. 2022 8:00	25.02. 2024 17:00
12	02.1.4	Omítky vnějších stěn (Restaurátorské práce)	655 dny	26.07. 2022 8:00	10.05. 2024 17:00
13	02.1.5	Střechy - bourání + nový stav	485 dny	26.07. 2022 8:00	22.11. 2023 17:00
14		Střechy - bourání	352 dny	26.07. 2022 8:00	12.07. 2023 17:00
15		Střechy - nový stav	425 dny	24.09. 2022 8:00	22.11. 2023 17:00
16	02.1.6	Konstrukční část + zděné konstrukce	631 dny	10.08. 2022 8:00	01.05. 2024 17:00
17	02.1.7	Povrchy vnitřních stěn a stropů	504 dny	24.10. 2022 8:00	10.03. 2024 17:00
18		Malby	483 dny	27.02. 2023 8:00	23.06. 2024 17:00
19	02.1.8	Bourání (obecně)	338 dny	26.07. 2022 8:00	28.06. 2023 17:00
20	**MILNÍK**	**Dokončení bouracích prací**	**0 dny**	**31.12. 2023 17:00**	**31.12. 2023 17:00**
21	02.1.9	Pohony požárního větrání, záchytný systém, výtahy	450 dny	09.10. 2022 8:00	01.01. 2024 17:00
22		Záchytný systém	100 dny	24.09. 2023 8:00	01.01. 2024 17:00
23		Pohony požárního větrání	340 dny	09.10. 2022 8:00	13.09. 2023 17:00
24		Výtahy	319 dny	01.12. 2022 8:00	15.10. 2023 17:00
25	02.1.10	Truhlářské, klempířské a ostatní konstrukce	510 dny	23.11. 2022 8:00	15.04. 2024 17:00
26	**02.2**	**Sanace vlhkosti**	**456 dny**	**10.10. 2022 8:00**	**08.01. 2024 17:00**
27	02.2	Sanace vlhkosti	456 dny	10.10. 2022 8:00	08.01. 2024 17:00
28	2.01a	Elektroosmóza, injektáže	456 dny	10.10. 2022 8:00	08.01. 2024 17:00
29	**02.3**	**Drobné SO**	**348 dny**	**24.09. 2022 8:00**	**06.09. 2023 17:00**
30	**02.4.**	**TZB / ELE**	**511 dny**	**07.11. 2022 8:00**	**31.03. 2024 17:00**
31	02.4.2	Vytápění	420 dny	07.11. 2022 8:00	31.12. 2023 17:00
32	02.4.3	VZT a chlazení	420 dny	07.11. 2022 8:00	31.12. 2023 17:00
33	02.4.4	MaR	420 dny	07.11. 2022 8:00	31.12. 2023 17:00
34	02.4.5	ZTI	420 dny	07.11. 2022 8:00	31.12. 2023 17:00
35	02.4.7	Silnoproud	420 dny	07.11. 2022 8:00	31.12. 2023 17:00
36	02.4.8	Slaboproud	420 dny	07.11. 2022 8:00	31.12. 2023 17:00
37		Komplexní zkoušy, revize, technické prohlídky	60 dny	01.02. 2024 8:00	31.03. 2024 17:00
38	02.4.9	Gastrotechnologie	120 dny	03.12. 2023 8:00	31.03. 2024 17:00
39	**03**	**Komunikace a zpevněné plochy**	**90 dny**	**17.01. 2024 8:00**	**15.04. 2024 17:00**
40	**04**	**Areálová kanalizace**	**490 dny**	**25.08. 2022 8:00**	**27.12. 2023 17:00**
41	04a	Dešťová kanalizace	490 dny	25.08. 2022 8:00	27.12. 2023 17:00
42	1	Kanalizace	**378 dny**	25.08. 2022 8:00	27.12. 2023 17:00
43	2	Nádrže	**378 dny**	25.08. 2022 8:00	27.12. 2023 17:00
44	04b	Hřiště	**378 dny**	25.08. 2022 8:00	25.12. 2023 17:00
45	04c	Splašková kanalizace	90 dny	25.08. 2022 8:00	22.11. 2022 17:00
46	**05**	**Venkovní rozvody**	**365 dny**	**25.08. 2022 8:00**	**24.08. 2023 17:00**
47	**08**	**Areálové rozvody NN a osvětlení**	**150 dny**	**20.08. 2023 8:00**	**16.01. 2024 17:00**
48	**09**	**Přeložka VO**	**150 dny**	**24.09. 2022 8:00**	**20.02. 2023 17:00**
49	**11**	**Oplocení**	**121 dny**	**01.01. 2024 8:00**	**30.04. 2024 17:00**
50	**12**	**Hřiště**	**150 dny**	**28.11. 2023 8:00**	**25.04. 2024 17:00**
51	**13**	**Sadové úpravy**	**90 dny**	**11.04. 2024 8:00**	**09.07. 2024 17:00**
52		dokončovací práce	90 dny	11.04. 2024 8:00	09.07. 2024 17:00
53		Vyklizení staveniště (ZS)	45 dny	26.05. 2024 8:00	09.07. 2024 17:00
54		Ukončení prací	0 dny	10.07. 2024 17:00	10.07. 2024 17:00
55		Předání stavby	0 dny	10.07. 2024 17:00	10.07. 2024 17:00
56	**VON**	**VRN+ON**	**791 dny**	**12.05. 2022 8:00**	**10.07. 2024 17:00**
