metrostav

"Karlovarská krajská nemocnice, a.s.-nemocnice v Chebu-Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu-pavilon B"

Realizační harmonogram prací

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení
1	**KKN - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B**	**01.03. 22**	**18.09. 22**
2	**5. ETAPA REKONSTRUKCE PAVILONU B**	**01.03. 22**	**18.09. 22**
3	**D1.02 PAVILON B**	**01.03. 22**	**18.09. 22**
4	**Stavební část - s výjimkou střední části**	**01.03. 22**	**18.09. 22**
5	**1.PP**	**01.03. 22**	**18.09. 22**
6	Zdivo nosné i příčkové	01.03. 22	25.03. 22
7		01.03. 22	31.03. 22
8	Omítky	01.03. 22	26.03. 22
9		24.04. 22	25.06. 22
10	SDK konstrukce a podhledy	01.03. 22	04.07. 22
11		10.06. 22	28.08. 22
12	Podlahy hrubé vč. hydroizolace	01.03. 22	04.04. 22
13		10.03. 22	31.03. 22
14	Obklady a dlažby	31.03. 22	27.04. 22
15		26.07. 22	17.08. 22
16	Malby	15.04. 22	15.06. 22
17		26.07. 22	28.08. 22
18	Podlahy čisté	30.04. 22	30.06. 22
19		20.07. 22	28.08. 22
20	Dveře interiérové	15.03. 22	15.04. 22
21		07.08. 22	28.08. 22
22	Dokončovací a kompletační činnost	01.06. 22	15.07. 22
23		26.07. 22	18.09. 22
24	Rozvody instalací TZB	01.03. 22	10.07. 22
25		01.03. 22	26.08. 22
26	Kompletace TZB a provozní zkoušky	15.05. 22	10.07. 22
27		23.07. 22	17.09. 22
28			
29			
30	**1.Np**	**01.03. 22**	**18.09. 22**
31	Omítky	01.03. 22	03.04. 22
32		01.03. 22	01.05. 22
33	SDK konstrukce a podhledy	01.03. 22	17.06. 22
34		01.03. 22	31.08. 22
35	Podlahy hrubé	01.03. 22	15.03. 22
36		01.03. 22	25.03. 22
37	Obklady a dlažby	01.03. 22	30.04. 22
38		09.04. 22	09.08. 22
39	Malby	15.03. 22	25.06. 22
40		26.05. 22	28.08. 22
41	Podlahy čisté	15.04. 22	25.06. 22
42		20.06. 22	28.08. 22
43	Dveře interiérové	30.03. 22	18.06. 22
44		04.08. 22	28.08. 22
45	Dokončovací a kompletační činnost	01.06. 22	15.07. 22
46		29.07. 22	18.09. 22
47	Rozvody instalací TZB	01.03. 22	25.06. 22
48		01.03. 22	05.08. 22
49	Kompletace TZB a provozní zkoušky	30.05. 22	10.07. 22
50		04.08. 22	18.09. 22
51			
52	**2.Np**	**01.03. 22**	**18.09. 22**
53	Omítky	01.03. 22	24.03. 22
54		01.03. 22	31.05. 22
55	SDK konstrukce a podhledy	01.03. 22	30.06. 22
56		01.03. 22	10.09. 22
57	Podlahy hrubé	01.03. 22	30.03. 22
58		01.03. 22	30.03. 22
59	Obklady a dlažby	01.03. 22	15.05. 22
60		01.03. 22	08.08. 22
61	Malby	01.03. 22	30.06. 22
62		12.04. 22	28.08. 22
63	Podlahy čisté	01.04. 22	10.07. 22
64		01.04. 22	17.08. 22
65	Dveře interiérové	15.04. 22	30.06. 22
66		15.04. 22	28.08. 22
67	Dokončovací a kompletační činnost	01.06. 22	15.07. 22
68		26.07. 22	18.09. 22
69	Rozvody instalací TZB	01.03. 22	25.06. 22
70		01.03. 22	25.06. 22
71	Kompletace TZB a provozní zkoušky	30.05. 22	10.07. 22
72		07.07. 22	18.09. 22
73			
74	**3.Np**	**01.03. 22**	**18.09. 22**
75	Omítky	01.03. 22	05.04. 22
76		01.03. 22	28.04. 22
77	SDK konstrukce a podhledy	01.03. 22	25.05. 22
78		01.03. 22	14.08. 22
79	Podlahy hrubé	01.03. 22	15.03. 22
80		01.03. 22	30.03. 22
81	Obklady a dlažby	01.03. 22	15.06. 22
82		01.03. 22	04.08. 22

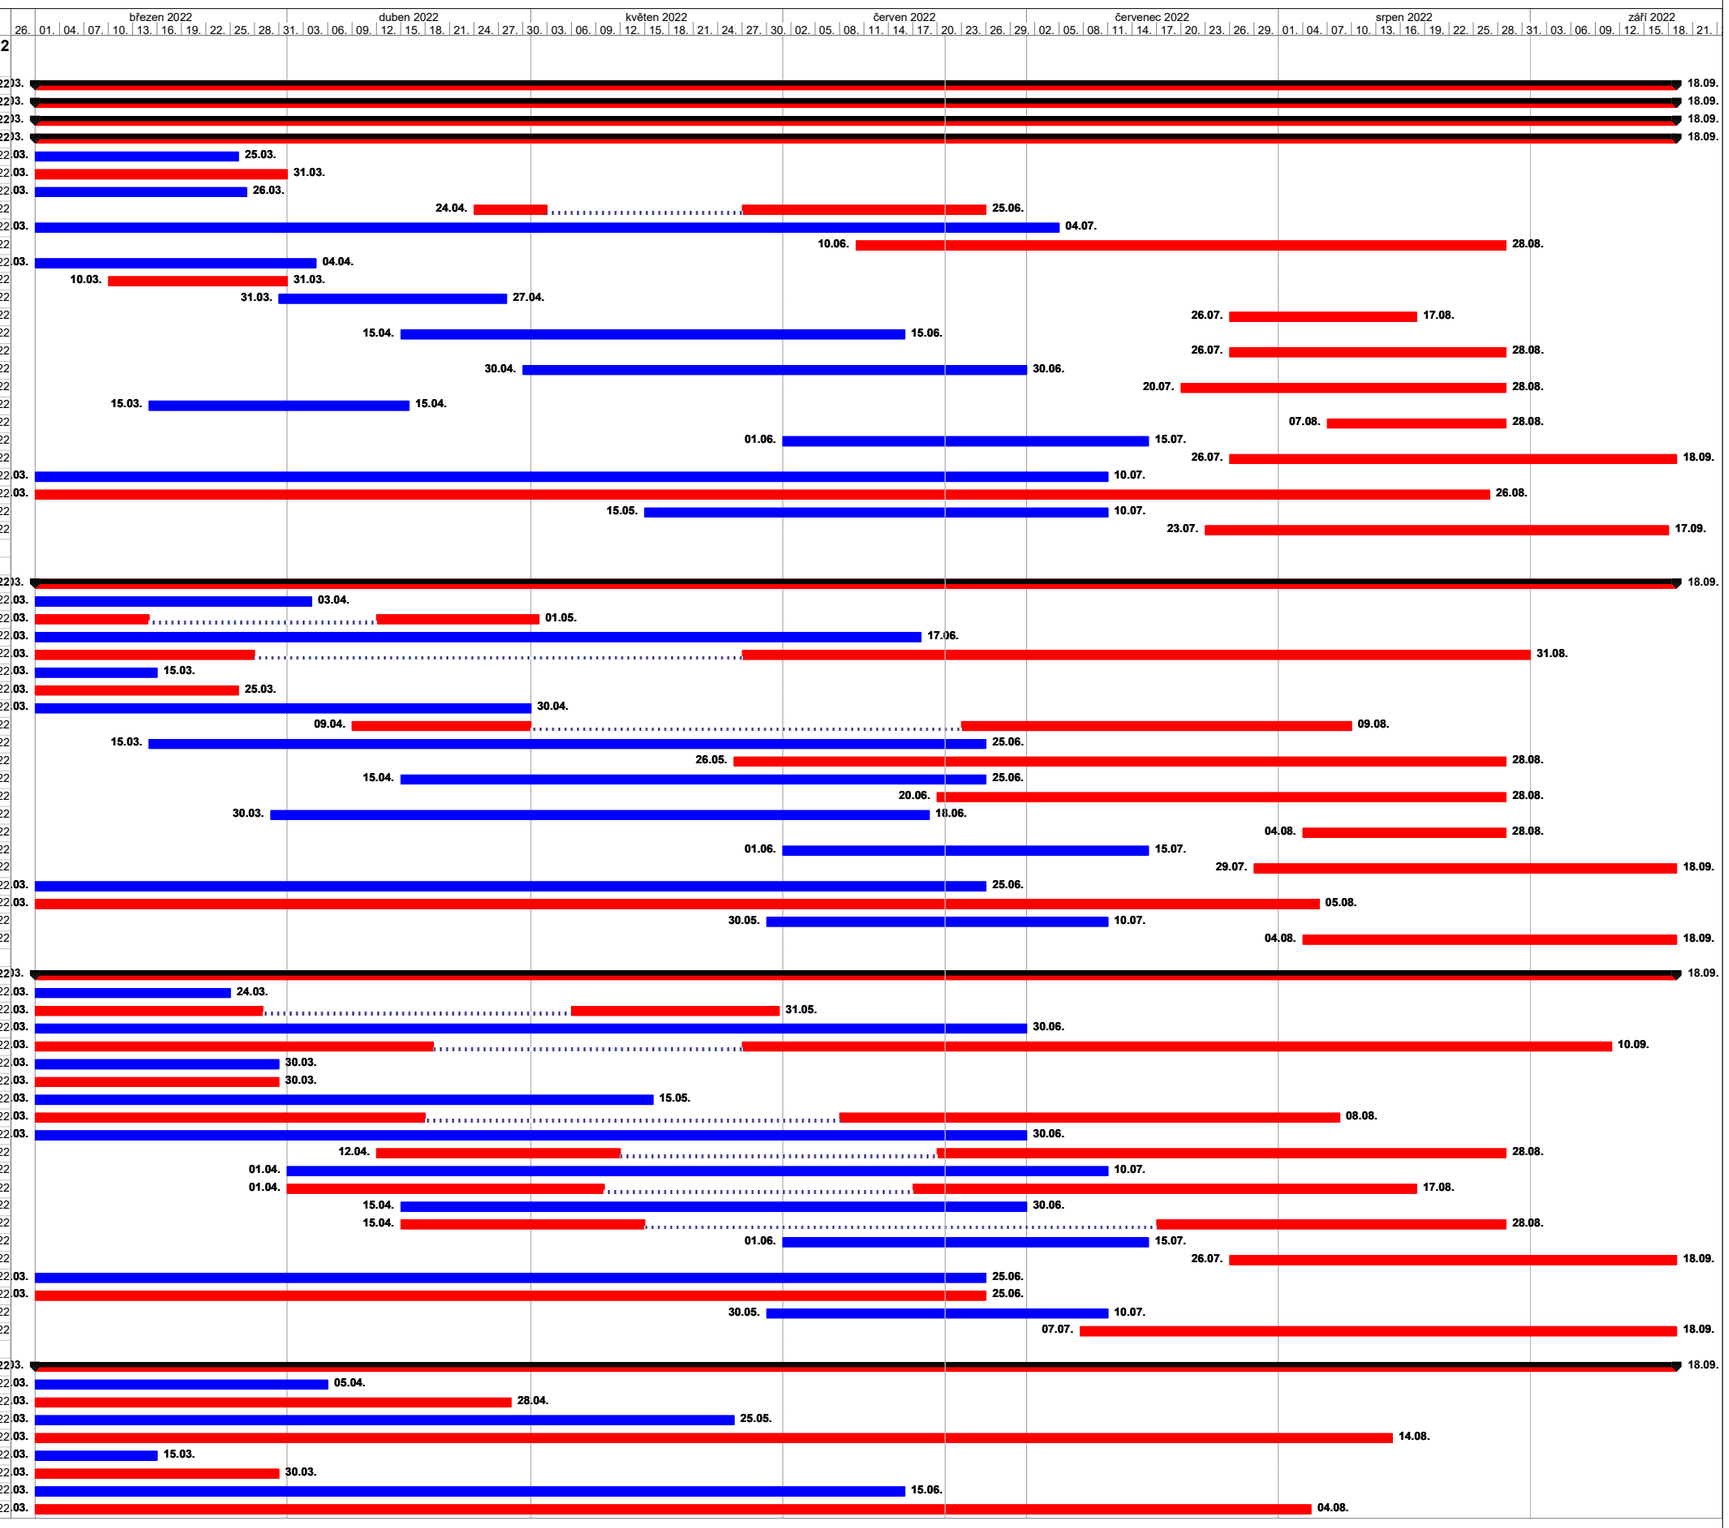

Projekt: Harmonogram
Datum: 21.06. 22

Plán provádění prací | Úpravený plán provádění prací | Rozdělení | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení
83	Malby	25.04. 22	30.06. 22
84		17.06. 22	22.08. 22
85	Podlahy čisté	10.05. 22	10.07. 22
86		08.06. 22	29.08. 22
87	Dveře interiérové	20.04. 22	30.05. 22
88		11.06. 22	21.07. 22
89	Dokončovací a kompletační činnost	01.06. 22	15.07. 22
90		23.07. 22	18.09. 22
91	Rozvody instalací TZB	01.03. 22	25.06. 22
92		01.03. 22	27.07. 22
93	Kompletace TZB a provozní zkoušky	30.05. 22	10.07. 22
94		23.07. 22	18.09. 22
95			
96			
97	**4.Np**	**01.03. 22**	**18.09. 22**
98	Omítky	20.03. 22	10.04. 22
99		03.04. 22	28.05. 22
100	SDK konstrukce	01.03. 22	10.06. 22
101		01.03. 22	08.09. 22
102	Podlahy hrubé	01.03. 22	15.03. 22
103		01.03. 22	30.03. 22
104	Obklady a dlažby	01.03. 22	01.07. 22
105		06.05. 22	05.08. 22
106	Malby	01.04. 22	30.06. 22
107		24.05. 22	22.08. 22
108	Podlahy čisté	15.04. 22	10.07. 22
109		14.06. 22	28.08. 22
110	Dveře interiérové	25.04. 22	30.06. 22
111		17.07. 22	28.08. 22
112	Dokončovací a kompletační činnost	01.06. 22	15.07. 22
113		01.08. 22	14.09. 22
114	Rozvody instalací TZB	01.03. 22	20.06. 22
115		01.03. 22	21.07. 22
116	Kompletace TZB a provozní zkoušky	30.05. 22	10.07. 22
117		26.07. 22	18.09. 22
118			
119			
120	**5.Np**	**01.03. 22**	**17.09. 22**
121	Omítky	10.03. 22	30.03. 22
122		15.04. 22	16.05. 22
123	SDK konstrukce vč. podhledů	01.03. 22	15.06. 22
124		06.04. 22	14.08. 22
125	Obklady dlažby	30.04. 22	30.05. 22
126		23.07. 22	22.08. 22
127	Malby	30.04. 22	30.05. 22
128		26.07. 22	25.08. 22
129	Podlahy čisté	15.05. 22	30.06. 22
130		20.07. 22	28.08. 22
131	Dveře interiérové	01.05. 22	30.05. 22
132		07.08. 22	28.08. 22
133	Dokončovací a kompletací činnost	01.06. 22	15.07. 22
134		04.08. 22	17.09. 22
135	Rozvody instalaci TZB	01.03. 22	21.06. 22
136		01.03. 22	17.08. 22
137	Kompletace TZB a provozní zkoušky	01.06. 22	15.07. 22
138		29.07. 22	11.09. 22
139			
140	**D2.51 LT/B Lékařská technologie**	**01.04. 22**	**10.07. 22**
141		**11.06. 22**	**28.08. 22**
142			
143	**D2.52 TS/B Technologie stravování**	**01.04. 22**	**10.07. 22**
144		**10.08. 22**	**28.08. 22**
145			
146	**Kompletace a dokončení díla**	01.06. 22	15.07. 22
147		04.08. 22	18.09. 22
148			
149			
150			
151	Fasáda a obvodový plášť	01.03. 22	30.04. 22
152		08.05. 22	28.08. 22
153			
154			
155			
156	D2.02 Komunikace a chodníky - dokončení	01.03. 22	30.03. 22
157		01.03. 22	28.08. 22
158			
159	D2.06 Sadové úpravy - dokončení	30.03. 22	30.05. 22
160		06.04. 22	28.08. 22
161			
162	D2.09 Venkovní osvětlení - dokončení	01.03. 22	30.03. 22
163		01.03. 22	27.08. 22

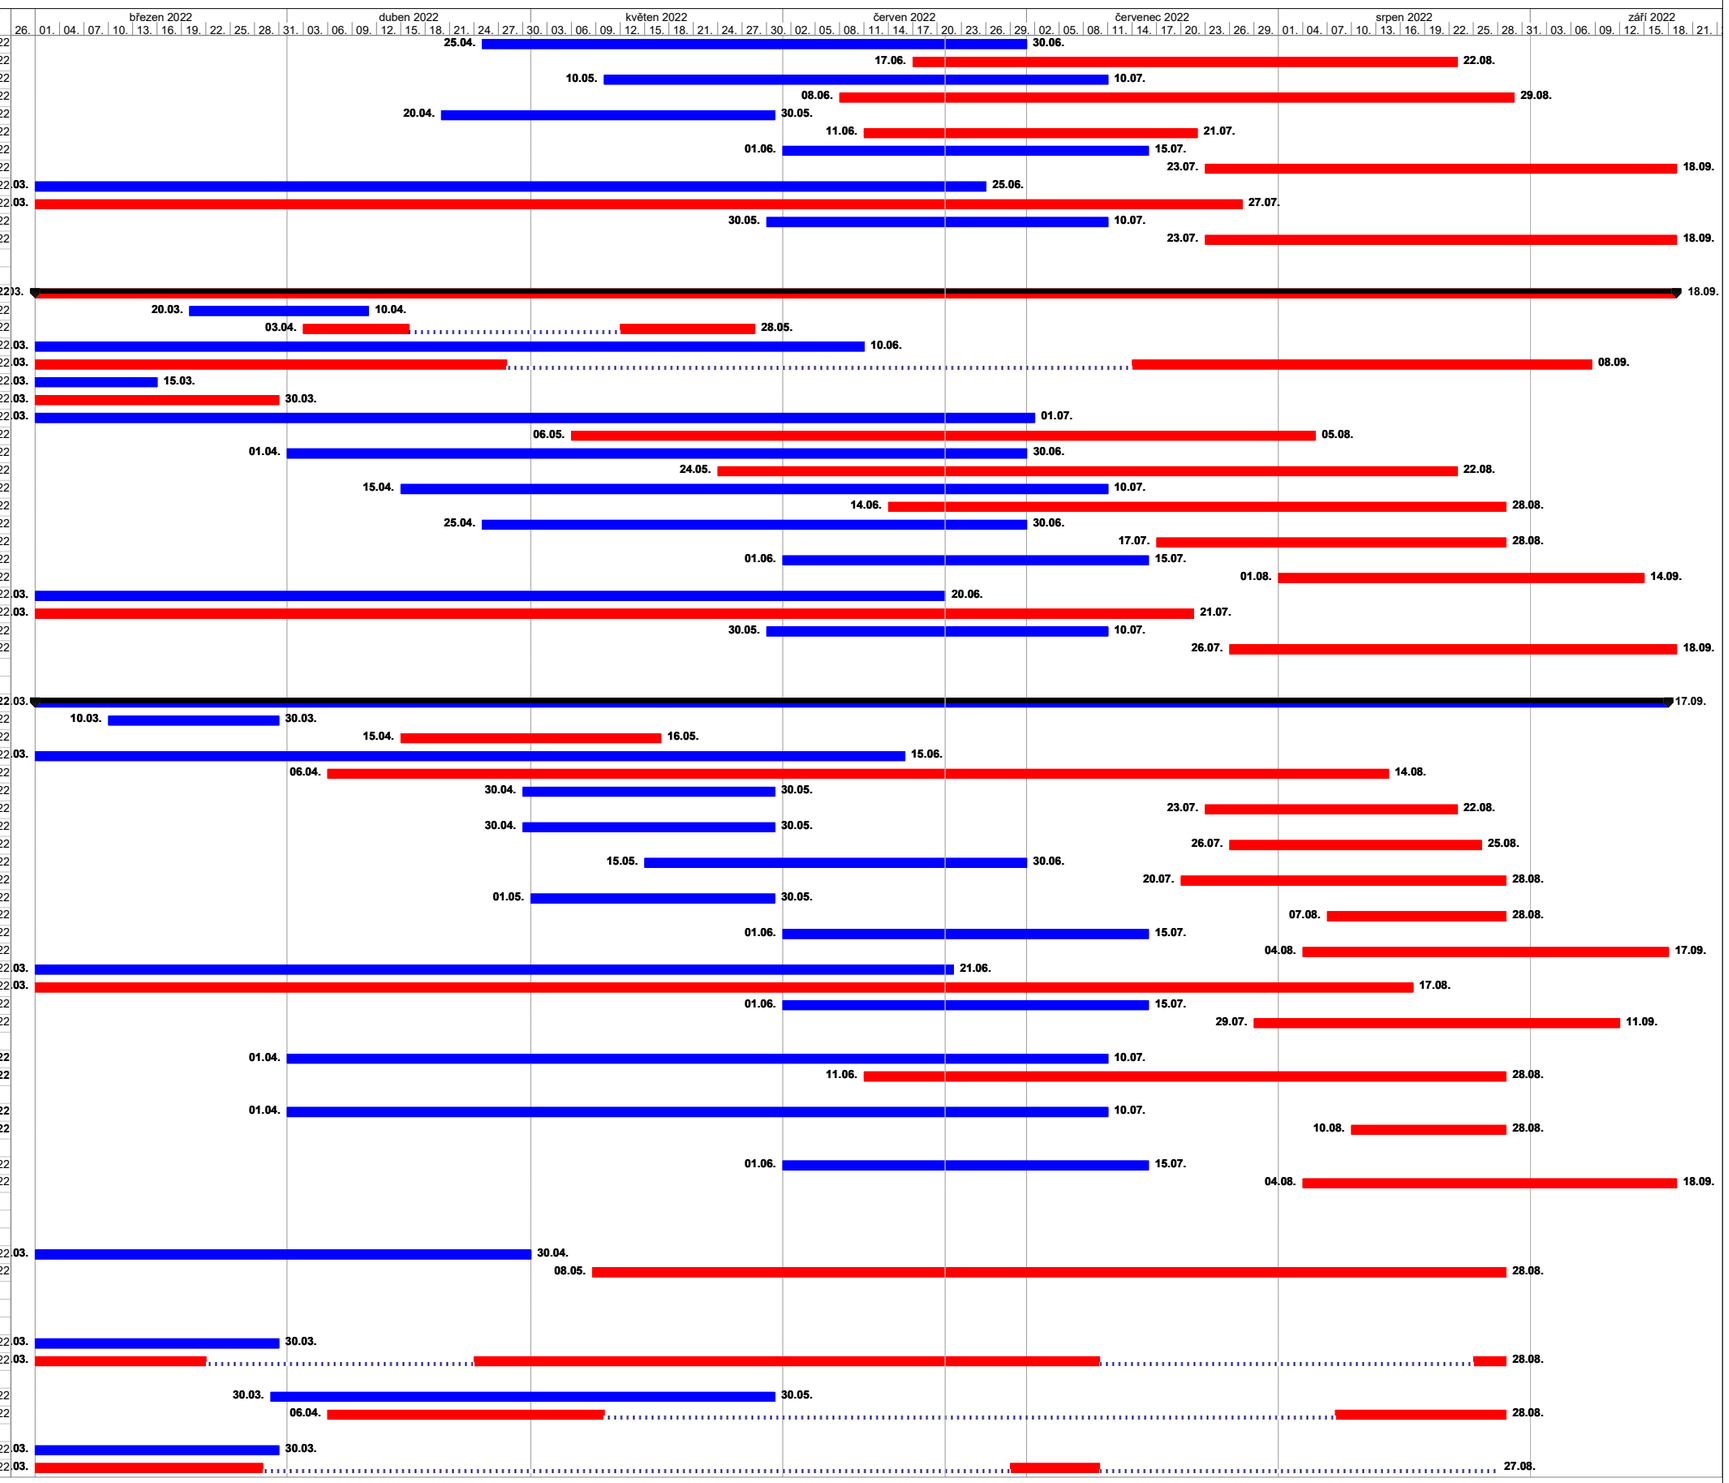

Projekt: Harmonogram
Datum: 21.06. 22

Plán provádění prací | Úpravený plán provádění prací | Rozdělení | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu
