Střední umělecká průmyslová škola KV; předpoklad - neřešíme oznámení vlivu na ŽP klasický postup = DUR, poté DSP = postup dle původní SoD:			harmonogram / měs. od podpisu SoD	dnů
zahájení projektování DUR:	***04.03.2022***	*= uveřejnění sml. v registru*	***0***	
lhůta na projekt DUR:	150 dní	= vč. úpravy ARC studie	5	
zahájení projednávání DUR (DUR pro DOSSy)	*01.08.2022*	*= 5 měsíců od podpisu SoD*	*5 měsíců od p.SoD*	
projednávání DOSS / DUR:	53 dní		1,8	
Zapracování požadavků DOSS do DUR	7 dní		0,2	
podání žádosti o UR	*30.09.2022*	*= DUR čistopis*	*7 měsíců od p.SoD*	
			zároveň zahájení DSP	
lhůta na zahájení územ.řízení:	15 dní		0,5	
Zahájení územ.řízení:	*15.10.2022*		*7,5 měsíců od p.SoD*	
Územní řízení:	60 dní		2	
Vyvěšení ÚR:	*14.12.2022*		*9,5 měsíců od p.SoD*	
nabývání práv. moci:	40 dní		1,3	
pravomocné ÚR:	*23.01.2023*		*10,8 měsíců od p.SoD*	
Zahájení projektování bouracích prací	*03.04.2022*		*1*	868
Lhůta na vypracování PD bouracích prací	120		4	
Zahájení projednávání PD bouracích prací	*01.08.2022*	*= PDB pro DOSSy*	*5 měsíců od p.SoD*	
projednávání PDB s DOSS:	53 dní		1,8	
Zapracování požadavků DOSS do PDB	7		0,2	
podání Ohlášení odstranění stavby:	*30.09.2022*	*= PDB čistopis*	*7 měsíců od p.SoD*	
Lhůta na zahájení řízení	15 dní		0,5	
Usnesení SÚ, že ohlášený záměr projedná ve spr	*15.10.2022*		*7,5 měsíců od p.SoD*	
Řízení o odstranění stavby	60 dní		2	
Vyvěšení Rozhodnutí o odstranění stavby	*14.12.2022*		*9,5 měsíců od p.SoD*	
nabývání práv. moci:	40 dní		1,3	
pravomocné Rozhodnutí o odstranění stavby:	*23.01.2023*		*10,8 měsíců od p.SoD*	
Zahájení projektování DSP:	*30.09.2022*	*= v den podání žádosti o ÚR*	*7 měsíců od p.SoD*	
lhůta na projekt DSP, vč. vodopr.obj.:	295		9,8	
Zahájení projednávání DSP (DSP pro DOSSy):	*22.07.2023*	*= 6 měsíců od NPM ÚR*	*16,8 měsíců od p.SoD*	
projednávání DOSS / DSP:	53 dní		1,8	
Zapracování požadavků DOSS do DSP	7		0,2	
podání žádosti o SP	20.09.2023	*= DSP čistopis*	*18,8 měsíců od p.SoD*	
			zároveň zahájení DPS	
lhůta na zahájení stav.řízení:	15 dní		0,5	
Zahájení stavebního řízení:	05.10.2023		*19,3 měsíců od p.SoD*	
stavební řízení:	60 dní		2	
vyvěšení SP:	04.12.2023		*21,3 měsíců od p.SoD*	
nabývání práv. moci:	40 dní		1,3	
pravomocné SP:	*13.01.2024*		*22,6 měsíců od p.SoD*	
Zahájení projektování DPS:	*20.09.2023*	*= den podání žádosti o SP*	*18,8 měsíců od p.SoD*	
lhůta na DPS všech SO, vč. certifikace SBTool:	295		9,8	
Předání DPS všech SO, vč. certifikátu SBTool:	***11.07.2024***	*= 6 měsíců od NPM SP*	***28,6 měsíců od p.SoD***	
Celkem projekční práce:	740 dní			

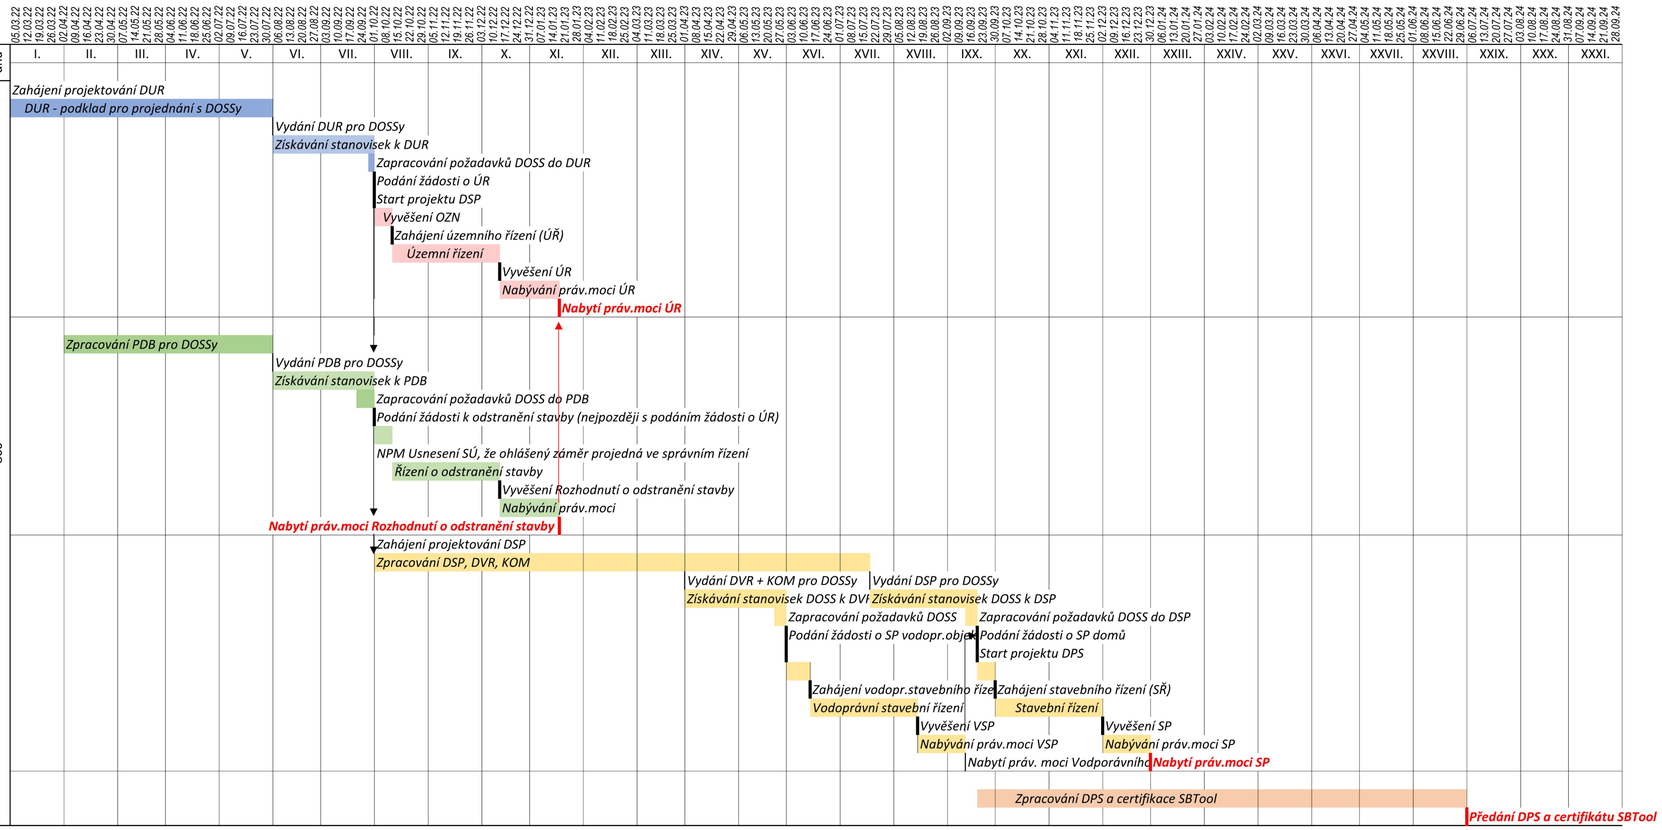

Střední umělecká průmyslová škola KV; předpoklad - neřešíme oznámení vlivu na ŽP postup s využitím společného povolení = UR+SP najednou = postup dle dodatku č.1 SoD:			harmonogram / měs. od podpisu SoD	dnů
zahájení projektování DUR:	***04.03.2022***	*= uveřejnění sml. v registru*	***0***	
lhůta na projekt DUR:	150 dní	= vč. úpravy ARC studie	5	
Vydání DUR pro DOSSy	*01.08.2022*	*= 5 měsíců od p. SoD*	*5 měsíců od p.SoD*	
Zahájení projektování bouracích prací	*07.07.2022*		*4,2*	775
Lhůta na vypracování PD bouracích prací	150		5	
Zahájení projednávání PD bouracích prací	*04.12.2022*	*= PDB pro DOSSy*	*9,2 měsíců od p.SoD*	
projednávání PDB s DOSS:	53 dní		1,8	
Zapracování požadavků DOSS do PDB	7		0,2	
podání Ohlášení odstranění stavby:	*02.02.2023*	*= PDB čistopis*	*11,2 měsíců od p.SoD*	
Lhůta na zahájení řízení	15 dní		0,5	
Usnesení SÚ, že ohlášený záměr projedná ve spr	*17.02.2023*		*11,7 měsíců od p.SoD*	
Řízení o odstranění stavby	60 dní		2	
Vyvěšení Rozhodnutí o odstranění stavby	*18.04.2023*		*13,7 měsíců od p.SoD*	
nabývání práv. moci:	40 dní		1,3	
pravomocné Rozhodnutí o odstranění stavby:	*28.05.2023*		*15 měsíců od p.SoD*	
Zahájení projektování DUR+DSP:	*01.08.2022*		*5 měsíců od p.SoD*	
lhůta na projekt DUR+DSP:	240		8	
Zahájení projednávání DUR+DSP (PD pro DOSSy)	*29.03.2023*	*= 8 měsíců od DUR pro DOSSy*	*13 měsíců od p.SoD*	
projednávání DOSS / DSP:	53 dní		1,8	
Zapracování požadavků DOSS do DSP	7		0,2	
podání žádosti o SP	28.05.2023	*= DSP čistopis*	*15 měsíců od p.SoD*	
			zároveň zahájení DPS	
lhůta na zahájení stav.řízení:	15 dní		0,5	
Zahájení stavebního řízení:	12.06.2023		*15,5 měsíců od p.SoD*	
Společné řízení:	90 dní		3	
vyvěšení Společného povolení:	10.09.2023		*18,5 měsíců od p.SoD*	
nabývání práv. moci:	40 dní		1,3	
pravomocné SP:	*20.10.2023*		*19,8 měsíců od p.SoD*	
Zahájení projektování DPS:	*28.05.2023*	*= podání žádosti o ÚR+SP*	*15 měsíců od p.SoD*	
lhůta na DPS všech SO, vč. certifikace SBTool:	325		10,8	
Předání DPS všech SO, vč. certifikátu SBTool:	***17.04.2024***	*= 6 měsíců od NPM SP*	***25,8 měsíců od p.SoD***	
Celkem projekční práce:	715 dní			

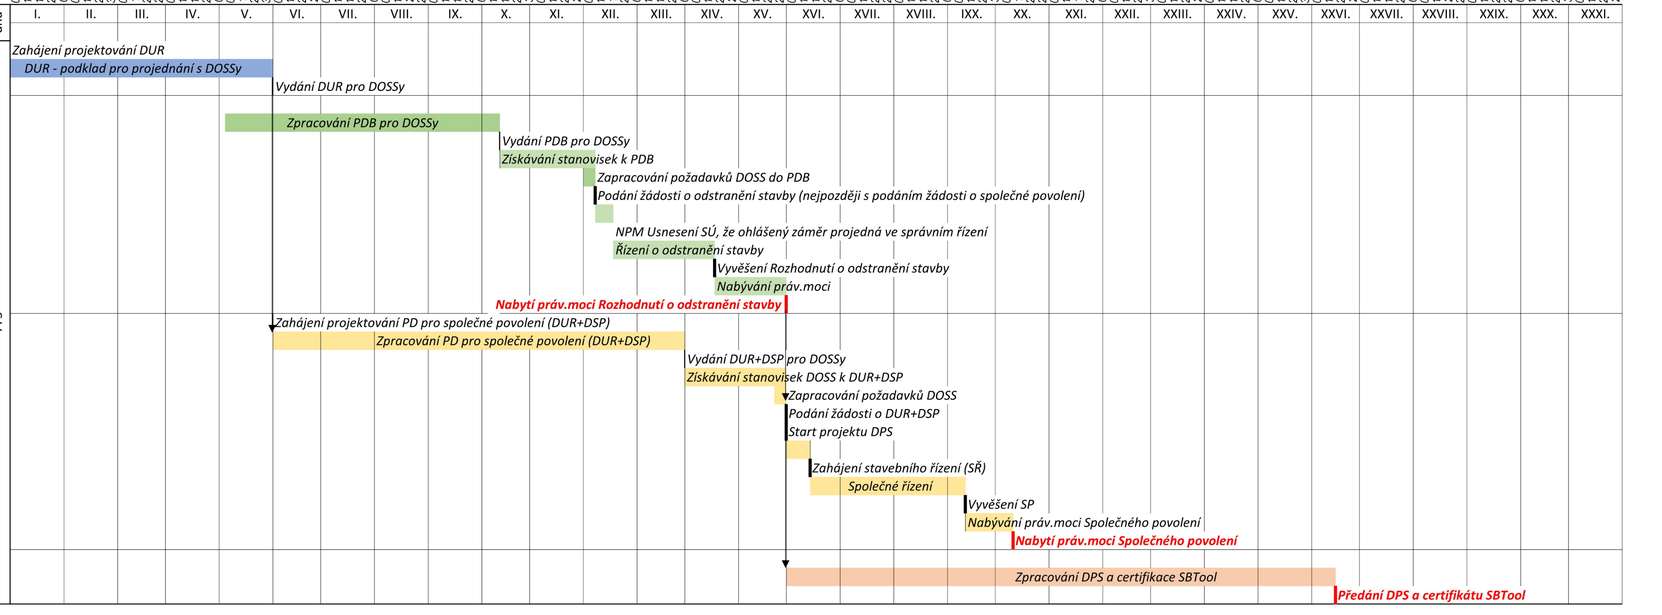

..úpravou data takto zvýrazněné buňky dojde k přepočtení zbývajících termínů

...milníky

XYZ ...lhůty definované SoD

Výše uvedené termíny lze garantovat puze v případě, že se do řízení nikdo neodvolá.

Zároveň nesmí nastat komplikace majetkoprávní - soukromí majitelé garáží, ČEZ.

[redacted]
