Harmonogram stavby: 073_2021 SSL OZP p.o. - TÝDENNÍ STACIONÁŘ NA HRÁDKU, FRYŠTÁK - Aktualizace na základě ZL 01 1.7.2022

Zhotovitel : **EKON ST spol. s r.o.**
Palackého 1278
76901 Holešov

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)
073_202	**SSL OZP p.o. - TÝDENNÍ STACIO**	**14.02.2022**	**30.09.2022**	**14 447 632**
3 MNP/V0	***ZMĚNA 3 - STATICKÉ ÚPRAVY KON***	***02.05.2022***	***31.05.2022***	***129 660***
3.2	**Méněpráce 3**	**02.05.2022**	**21.05.2022**	**-13 725**
4	Vodorovné konstrukce	09.05.2022	21.05.2022	-12 815
99	Staveništní přesun hmot	09.05.2022	21.05.2022	-910
3.1	**Vícepráce 3**	**02.05.2022**	**31.05.2022**	**143 385**
3	Svislé a kompletní konstrukce	09.05.2022	21.05.2022	1 681
4	Vodorovné konstrukce	09.05.2022	21.05.2022	29 895
96	Bourání konstrukcí	04.05.2022	07.05.2022	4 256
99	Staveništní přesun hmot	09.05.2022	21.05.2022	1 490
767	Konstrukce zámečnické	02.05.2022	31.05.2022	101 176
783	Nátěry	02.05.2022	31.05.2022	1 581
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	04.05.2022	07.05.2022	3 307
4 MNP/V0	***ZMĚNA 4 - STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY***	***25.07.2022***	***30.07.2022***	***-113 000***
4.1	**Méněpráce 4**	**25.07.2022**	**30.07.2022**	**-113 000**
64	Výplně otvorů	25.07.2022	30.07.2022	-113 000
5 MNP/V0	***ZMĚNA 5 - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH***	***06.06.2022***	***25.06.2022***	***230 924***
5.2	**Méněpráce 5**	**06.06.2022**	**25.06.2022**	**-53 466**
767	Konstrukce zámečnické	06.06.2022	25.06.2022	-13 302
783	Nátěry	06.06.2022	25.06.2022	-40 164
5.1	**Vícepráce 5**	**06.06.2022**	**25.06.2022**	**284 390**
766	Konstrukce truhlářské	06.06.2022	25.06.2022	284 390
2 MNP/V0	***ZMĚNA 2 - VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO***	***21.02.2022***	***26.02.2022***	***61 406***
2.1	**Vícepráce 2**	**21.02.2022**	**26.02.2022**	**61 406**
1	Zemní práce	21.02.2022	26.02.2022	61 406
099	***Ostatní a vedlejší náklady***	***14.02.2022***	***29.09.2022***	***182 001***
01	**ON, VN**	**14.02.2022**	**29.09.2022**	**182 001**
VN	Vedlejší náklady	14.02.2022	29.09.2022	74 000
ON	Ostatní náklady	14.02.2022	29.09.2022	108 001
01	***Objekt***	***16.02.2022***	***30.09.2022***	***13 735 732***
05_b	**Elektroinstalace - Osvětlení**	**30.06.2022**	**13.09.2022**	**418 100**
M21s	Svítidla	30.06.2022	13.09.2022	418 100
05_a	**Elektroinstalace - Silnoproud**	**28.02.2022**	**19.09.2022**	**1 032 990**
61	Úpravy povrchů vnitřní	02.06.2022	15.07.2022	61 000
96	Bourání konstrukcí	02.06.2022	15.07.2022	65 271
M21	Elektromontáže	28.02.2022	13.09.2022	885 714
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	15.09.2022	19.09.2022	14 875
M23	Montáže potrubí	28.02.2022	19.04.2022	2 970
M46	Zemní práce při montážích	02.06.2022	14.07.2022	3 160
05_d	**Elektroinstalace - Bleskosvod**	**28.02.2022**	**19.09.2022**	**513 074**
M21	Elektromontáže	28.02.2022	13.09.2022	449 469
M23	Montáže potrubí	28.02.2022	19.03.2022	840
M799	Ostatní	28.02.2022	19.09.2022	62 765
05_c	**Elektroinstalace - Slaboproud**	**02.06.2022**	**13.09.2022**	**1 224 882**
M22a	DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM	30.06.2022	13.09.2022	41 760
M22d	DATOVÉ ROZVODY	02.06.2022	13.09.2022	319 089
M22p	SYSTÉM SESTRA PACIENT	30.06.2022	13.09.2022	354 991
M22s	STA	02.06.2022	13.09.2022	65 968
M22t	TELEFON VoIP	30.06.2022	13.09.2022	96 984
M22z	ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA (PZTS)	30.06.2022	13.09.2022	91 746
M799	Ostatní	02.06.2022	14.07.2022	254 344
04	**Vytápění**	**02.06.2022**	**20.09.2022**	**721 227**
91	Doplňující práce na komunikaci	02.06.2022	25.07.2022	5 600
96	Bourání konstrukcí	02.06.2022	25.07.2022	5 092
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	02.06.2022	25.07.2022	1 149
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby	15.09.2022	20.09.2022	27 500
713	Izolace tepelné	02.06.2022	25.07.2022	11 464
722	Vnitřní vodovod	02.06.2022	25.07.2022	33 914
724	Strojní vybavení	18.08.2022	13.09.2022	31 949
731	Kotelny	18.08.2022	13.09.2022	67 214
731-1	Odtah spalin	18.08.2022	13.09.2022	13 940
732	Strojovny	18.08.2022	13.09.2022	42 074
733	Rozvod potrubí	02.06.2022	25.07.2022	190 953
734	Armatury	18.08.2022	13.09.2022	70 089
735	Otopná tělesa	18.08.2022	13.09.2022	214 762
767	Konstrukce zámečnické	18.08.2022	13.09.2022	4 202
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	02.06.2022	25.07.2022	1 324
02	**Vzduchotechnika a chlazení**	**15.07.2022**	**20.09.2022**	**444 280**
01	Zař. č. 1 - Větrání hygienických místností I	15.07.2022	31.08.2022	68 950
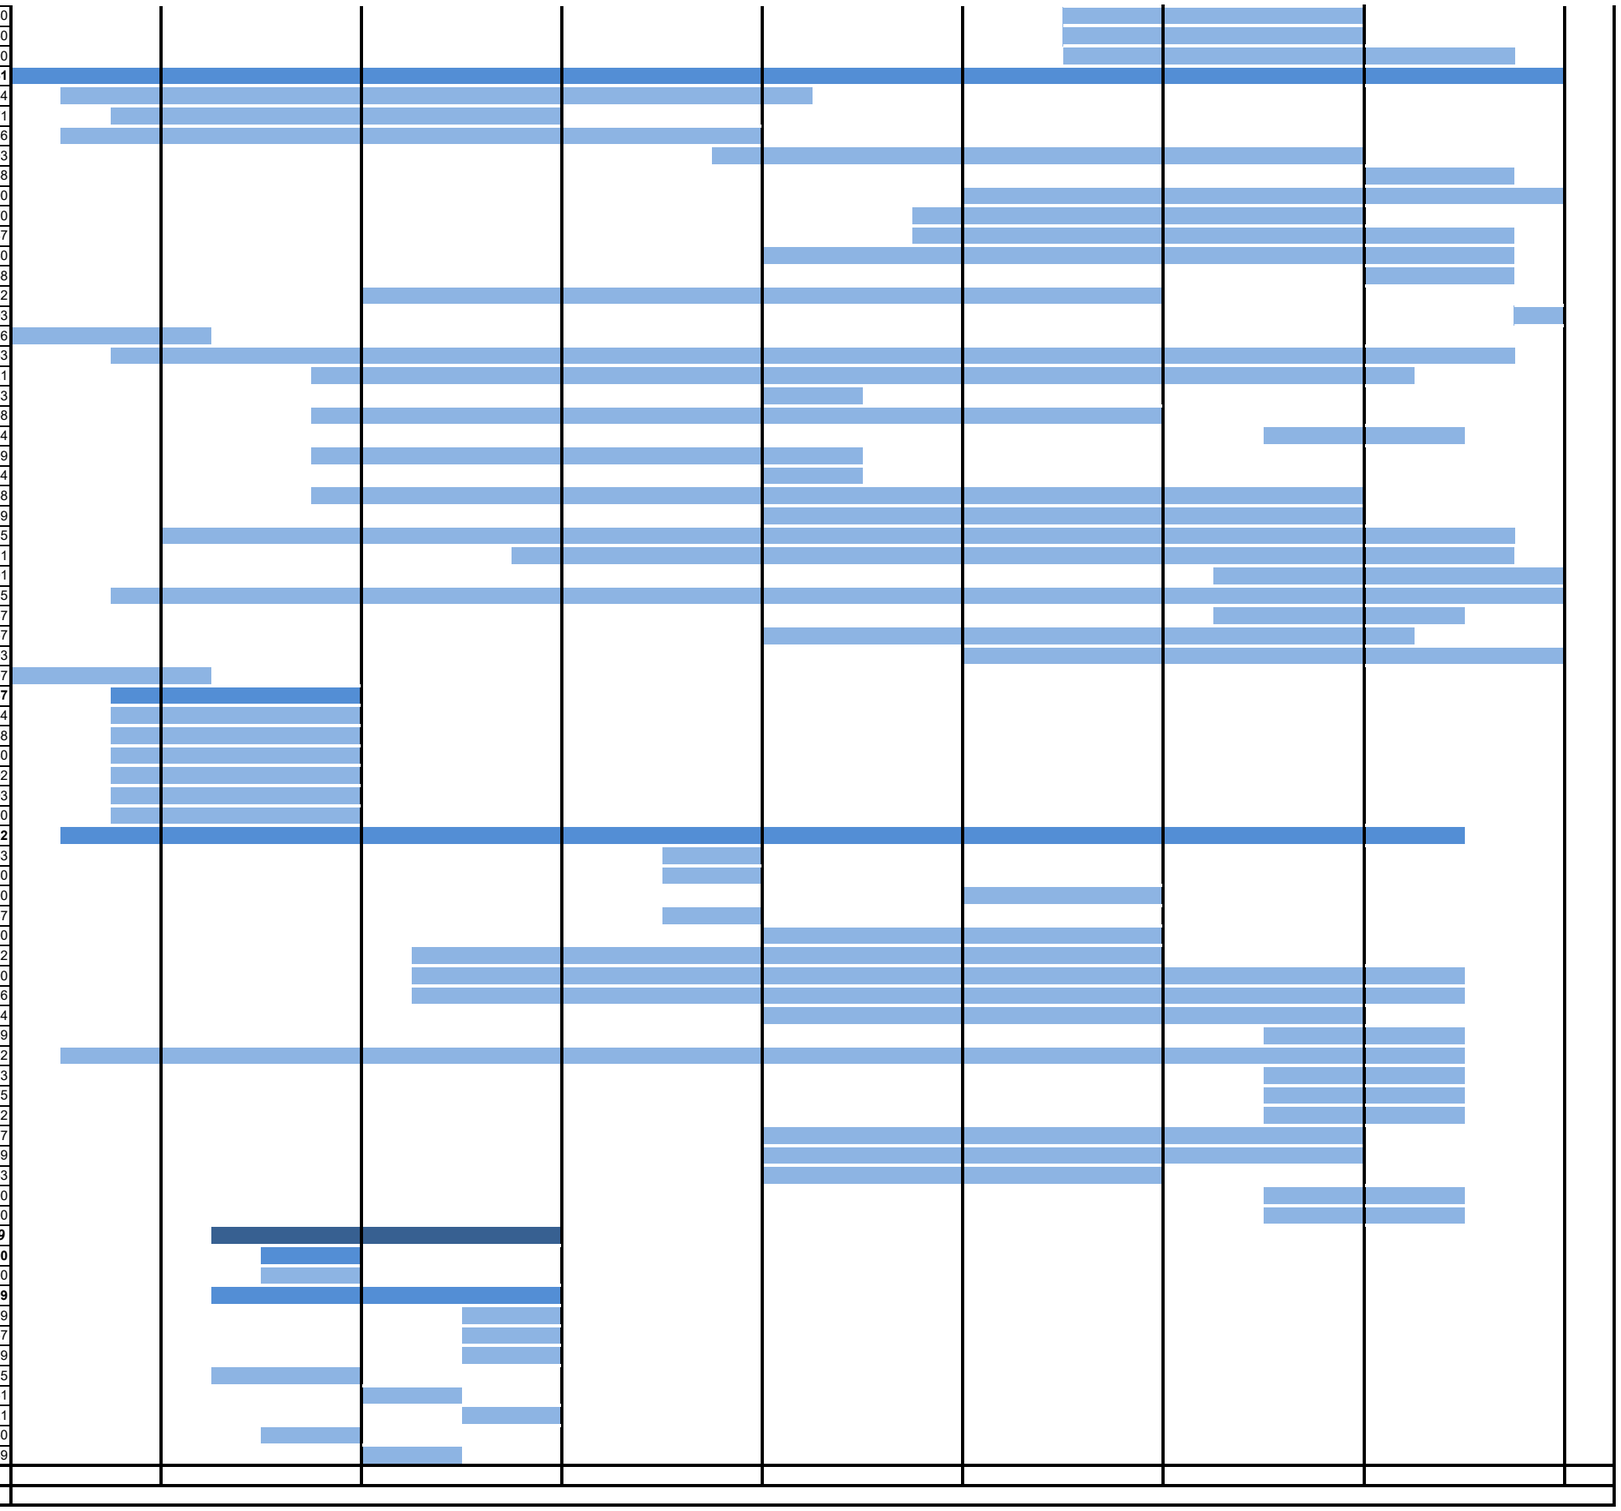
02	Zař. č. 2 - Digestoře	15.07.2022	31.08.2022	12 580
03	Zař. č. 3 - Chlazení bytů	15.07.2022	31.08.2022	268 750
04	Zař. č. O - Ostatní	15.07.2022	20.09.2022	94 000
01	**ASŘ, SKŘ, PBŘ**	**16.02.2022**	**30.09.2022**	**8 111 361**
1	Zemní práce	21.02.2022	04.06.2022	164 624
2	Základy a zvláštní zakládání	25.02.2022	30.04.2022	206 471
3	Svislé a kompletní konstrukce	21.02.2022	31.05.2022	1 093 886
4	Vodorovné konstrukce	25.05.2022	23.08.2022	37 703
5	Komunikace	01.09.2022	19.09.2022	4 488
61	Úpravy povrchů vnitřní	06.07.2022	30.09.2022	546 090
62	Úpravy povrchů vnější	23.06.2022	31.08.2022	342 770
63	Podlahy a podlahové konstrukce	23.06.2022	19.09.2022	203 287
64	Výplně otvorů	02.06.2022	19.09.2022	638 130
91	Doplňující práce na komunikaci	01.09.2022	19.09.2022	21 158
94	Lešení a stavební výtahy	07.04.2022	30.07.2022	182 232
95	Dokončovací konstrukce na pozemních st	22.09.2022	29.09.2022	29 593
96	Bourání konstrukcí	16.02.2022	01.03.2022	300 426
99	Staveništní přesun hmot	25.02.2022	19.09.2022	158 553
711	Izolace proti vodě	28.03.2022	06.09.2022	320 621
712	Povlakové krytiny	02.06.2022	14.06.2022	13 633
713	Izolace tepelné	28.03.2022	25.07.2022	643 898
725	Zařizovací předměty	18.08.2022	13.09.2022	65 714
762	Konstrukce tesařské	28.03.2022	14.06.2022	72 809
763	Dřevostavby	02.06.2022	14.06.2022	43 754
764	Konstrukce klempířské	28.03.2022	31.08.2022	184 338
765	Krytiny tvrdé	02.06.2022	31.08.2022	23 769
766	Konstrukce truhlářské	07.03.2022	19.09.2022	1 405 335
767	Konstrukce zámečnické	25.04.2022	19.09.2022	56 511
771	Podlahy z dlaždic a obklady	11.08.2022	24.09.2022	92 701
776	Podlahy povlakové	28.02.2022	24.09.2022	451 145
781	Obklady keramické	11.08.2022	10.09.2022	224 447
783	Nátěry	06.06.2022	06.09.2022	50 167
784	Malby	06.07.2022	24.09.2022	177 003
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	16.02.2022	01.03.2022	356 107
03_b	**Zdravotechnická instalace - Venkovní r**	**28.02.2022**	**22.03.2022**	**77 187**
1	Zemní práce	28.02.2022	22.03.2022	49 034
4	Vodorovné konstrukce	28.02.2022	22.03.2022	2 388
5	Komunikace	28.02.2022	22.03.2022	12 180
8	Trubní vedení	28.02.2022	22.03.2022	6 292
99	Staveništní přesun hmot	28.02.2022	22.03.2022	2 793
VN	Vedlejší náklady	28.02.2022	22.03.2022	4 500
03_a	**Zdravotechnická instalace**	**21.02.2022**	**13.09.2022**	**1 192 632**
1	Zemní práce	18.05.2022	25.05.2022	41 153
3	Svislé a kompletní konstrukce	18.05.2022	25.05.2022	3 540
61	Úpravy povrchů vnitřní	06.07.2022	27.07.2022	69 400
8	Trubní vedení	18.05.2022	25.05.2022	5 547
9	Ostatní konstrukce, bourání	02.06.2022	25.07.2022	7 400
96	Bourání konstrukcí	14.04.2022	25.07.2022	159 522
721	Vnitřní kanalizace	14.04.2022	13.09.2022	289 000
722	Vnitřní vodovod	14.04.2022	13.09.2022	311 826
723	Vnitřní plynovod	02.06.2022	31.08.2022	15 014
724	Strojní vybavení	18.08.2022	13.09.2022	8 969
725	Zařizovací předměty	21.02.2022	13.09.2022	170 762
726	Předstěnové systémy	18.08.2022	13.09.2022	85 813
732	Strojovny	18.08.2022	13.09.2022	375
734	Armatury	18.08.2022	13.09.2022	442
767	Konstrukce zámečnické	02.06.2022	31.08.2022	4 377
783	Nátěry	02.06.2022	31.08.2022	1 139
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	02.06.2022	25.07.2022	9 353
VN	Vedlejší náklady	18.08.2022	13.09.2022	5 000
ON	Ostatní náklady	18.08.2022	13.09.2022	4 000
1 MNP/V0	***ZMĚNA 1 - STAV ZÁKLADŮ A PODL***	***14.03.2022***	***22.04.2022***	***220 909***
1.2	**Méněpráce 1**	**21.03.2022**	**25.03.2022**	**-19 000**
M21	Elektromontáže	21.03.2022	25.03.2022	-19 000
1.1	**Vícepráce 1**	**14.03.2022**	**22.04.2022**	**239 909**
1	Zemní práce	18.04.2022	22.04.2022	4 019
2	Základy a zvláštní zakládání	18.04.2022	22.04.2022	30 767
3	Svislé a kompletní konstrukce	18.04.2022	22.04.2022	23 219
9	Ostatní konstrukce, bourání	14.03.2022	23.03.2022	72 415
96	Bourání konstrukcí	01.04.2022	14.04.2022	58 761
99	Staveništní přesun hmot	18.04.2022	22.04.2022	5 421
M21	Elektromontáže	21.03.2022	25.03.2022	6 150
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.04.2022	14.04.2022	39 159
