TECHNIKA BUDOV, s.r.o.

PROJEKCE, REALIZACE A SERVIS V OBLASTI TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV
tel./fax. 543 255 094, technikabudov@gmail.com, www.TECHNIKABUDOV.cz

HARMONOGRAM PRACÍ PRO ZAKÁZKU - Klimatizace budovy Burešova

den číslo:
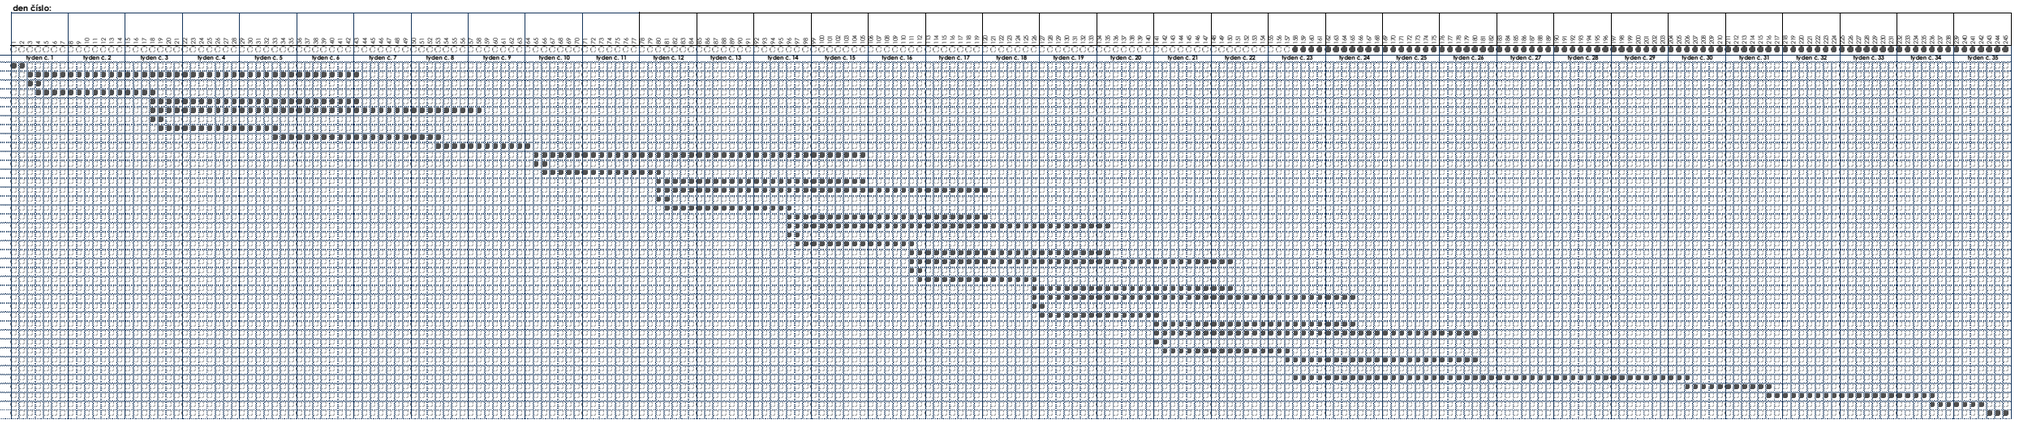
Popis činností	od	do
Předání staveniště	1	2
1.PP	3	43
Demont dílů podhledu	3	4
M ont díl vnitřních klimatizačních jednotek vč. navazujících profesí	4	18
Stavební práce - zpětná mont díl podhledu,SDK, opravy a omítek, malba apo	18	43
1.NP	18	58
Demont dílů podhledu	18	19
M ont díl vnitřních klimatizačních jednotek vč. navazujících profesí	19	33
Stavební práce - zpětná mont díl podhledu,SDK, opravy a omítek, malba apo	33	53
Přerušení prací	53	64
2.NP	65	105
Demont dílů podhledu	65	66
M ont díl vnitřních klimatizačních jednotek vč. navazujících profesí	66	80
Stavební práce - zpětná mont díl podhledu,SDK, opravy a omítek, malba apo	80	105
3.NP	80	120
Demont dílů podhledu	80	81
M ont díl vnitřních klimatizačních jednotek vč. navazujících profesí	81	96
Stavební práce - zpětná mont díl podhledu,SDK, opravy a omítek, malba apo	96	120
4.NP	96	135
Demont dílů podhledu	96	97
M ont díl vnitřních klimatizačních jednotek vč. navazujících profesí	97	111
Stavební práce - zpětná mont díl podhledu,SDK, opravy a omítek, malba apo	111	135
5.NP	111	150
Demont dílů podhledu	111	112
M ont díl vnitřních klimatizačních jednotek vč. navazujících profesí	112	126
Stavební práce - zpětná mont díl podhledu,SDK, opravy a omítek, malba apo	126	150
6.NP	126	165
Demont dílů podhledu	126	127
M ont díl vnitřních klimatizačních jednotek vč. navazujících profesí	127	141
Stavební práce - zpětná mont díl podhledu,SDK, opravy a omítek, malba apo	141	165
7.NP	141	180
Demont dílů podhledu	141	142
M ont díl vnitřních klimatizačních jednotek vč. navazujících profesí	142	157
Stavební práce - zpětná mont díl podhledu,SDK, opravy a omítek, malba apo	157	180
Společné pro všechny podlaží		
Pád etní rozvod ze střechy k jednotlivým podlažím	158	206
Ocelová konstrukce střešní plášť	206	216
Osazení venkovních klimatických jenot ek vč. připojení	216	236
K ompletní vyzkoušení a zprovoznění	236	242
Předání díla	243	245
