ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Poznámky
1	**HARMONOGRAM PRACÍ - SOUSTROJÍ GG4**				
2	**Zahájení projektu - Nabytí účinnosti kupní smlouvy**	1 den	18. prosinec 2023	18. prosinec 2023	Předpoklad
3	**Příprava projektové dokumentace - Milník 0**	**70 dny**	**19. prosinec 2023**	**25. březen 2024**	
4	Příprava dokumentace Zhotovitele - Milník 1	4 týdny	19. prosinec 2023	15. leden 2024	
5	Příprava dokumentace Zhotovitele - Milník 2	4 týdny	19. prosinec 2023	15. leden 2024	
6	Příprava dokumentace Podzhotovitele - Milník 3	14 týdny	19. prosinec 2023	25. březen 2024	
7	**Schválení projektové dokumentace ÚFP AV ČR, v.v.i.**	**25 dny**	**26. březen 2024**	**29. duben 2024**	
8	Předání projektové dokumentace ke schválení	1 týden	26. březen 2024	01. duben 2024	
9	Schválení projektové dokumentace ÚFP AV ČR, v.v.i.	2 týdny	02. duben 2024	15. duben 2024	
10	Časová rezerva na možné doplnění dokumentace k hodnocení "A"	1 týden	16. duben 2024	22. duben 2024	
11	Finální předání projektové dokumentace	1 týden	23. duben 2024	29. duben 2024	
12	**Rozběhové zařízení rázového generátoru (motor, frekvenční měnič, příslušenství) - Milník 1**	**220 dny**	**19. prosinec 2023**	**21. říjen 2024**	
13	**Výrobní fáze (sestávající z: Technická příprava výroby, objednání subdodávek, výroba a zkoušky ve výrobním závodě)**	**215 dny**	**19. prosinec 2023**	**14. říjen 2024**	
14	Frekvenční měnič rozběhového motoru vč. příslušenství	43 týdny	19. prosinec 2023	14. říjen 2024	
15	Synchronní motor s permanentními magnety	43 týdny	19. prosinec 2023	14. říjen 2024	
16	Transformátor rozběhového měniče	43 týdny	19. prosinec 2023	14. říjen 2024	
17	Brzdný rezistor	43 týdny	19. prosinec 2023	14. říjen 2024	
18	**Předání Milníku 1**	**5 dny**	**15. říjen 2024**	**21. říjen 2024**	
19	FAT ve výrobním závodě	1 týden	15. říjen 2024	21. říjen 2024	FAT v TES Vsetín
20	**Systém buzení rázového generátoru - Milník 2**	**140 dny**	**19. prosinec 2023**	**01. červenec 2024**	
21	**Výrobní fáze (sestávající z: Technická příprava výroby, objednání subdodávek, výroba a zkoušky ve výrobním závodě)**	**135 dny**	**19. prosinec 2023**	**24. červen 2024**	
22	Budící transformátory	27 týdny	19. prosinec 2023	24. červen 2024	
23	Měnič buzení VARIANT	27 týdny	19. prosinec 2023	24. červen 2024	
24	**Předání Milníku 2**	**5 dny**	**25. červen 2024**	**01. červenec 2024**	
25	FAT ve výrobním závodě	1 týden	25. červen 2024	01. červenec 2024	FAT v ELEKTROTECHNIKA
26	**Kompletní soustrojí setrvačníkového rázového generátoru - Milník 3**	**285 dny**	**19. prosinec 2023**	**20. leden 2025**	
27	**Výrobní fáze (sestávající z: Technická příprava výroby, objednání subdodávek, výroba a zkoušky ve výrobním závodě)**	**275 dny**	**19. prosinec 2023**	**06. leden 2025**	
28	Soustrojí rázového generátoru GG4 (dílce, rám, setrvačník, výměník, ložiska, mazací a chladicí agregát) vč. montáže	55 týdny	19. prosinec 2023	06. leden 2025	
29	Řídicí rozváděče pomocných pohonů	48 týdny	19. prosinec 2023	18. listopad 2024	
30	Napájení pomocných pohonů	48 týdny	19. prosinec 2023	18. listopad 2024	
31	Rozváděč vlastní spotřeby	48 týdny	19. prosinec 2023	18. listopad 2024	
32	Záložní zdroj energie	48 týdny	19. prosinec 2023	18. listopad 2024	
33	**Předání Milníku 3**	**10 dny**	**07. leden 2025**	**20. leden 2025**	
34	FAT ve výrobním závodě	2 týdny	07. leden 2025	20. leden 2025	FAT v TES Vsetín
35	**Instalace, zprovoznění a přejímací zkoušky SAT - Milník 4**	**84 dny**	**21. leden 2025**	**16. květen 2025**	
36	Demontáž	2 týdny	21. leden 2025	03. únor 2025	
37	Lakování dílů soustrojí	2 týdny	04. únor 2025	17. únor 2025	
38	Balení a přeprava	2 týdny	18. únor 2025	03. březen 2025	
39	Montáž	4 týdny	04. březen 2025	31. březen 2025	
40	Uvádění do provozu	4 týdny	01. duben 2025	28. duben 2025	
41	Zkoušky SAT	2 týdny	29. duben 2025	12. květen 2025	
42	Předání dokumentace skutečného provedení stavby - Milník 4	2 týdny	29. duben 2025	12. květen 2025	
43	Dokončovací práce	3 dny	13. květen 2025	15. květen 2025	
44	Finální předání soustrojí GG4	1 den	16. květen 2025	16. květen 2025	

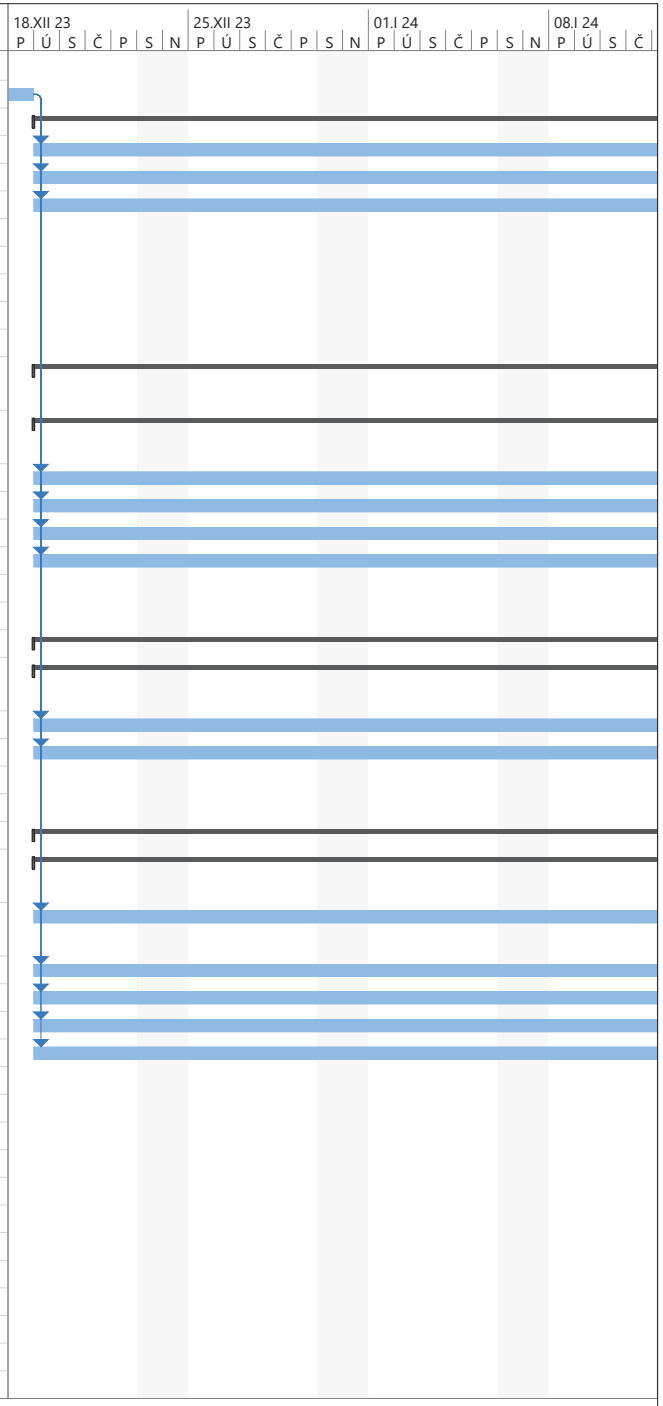

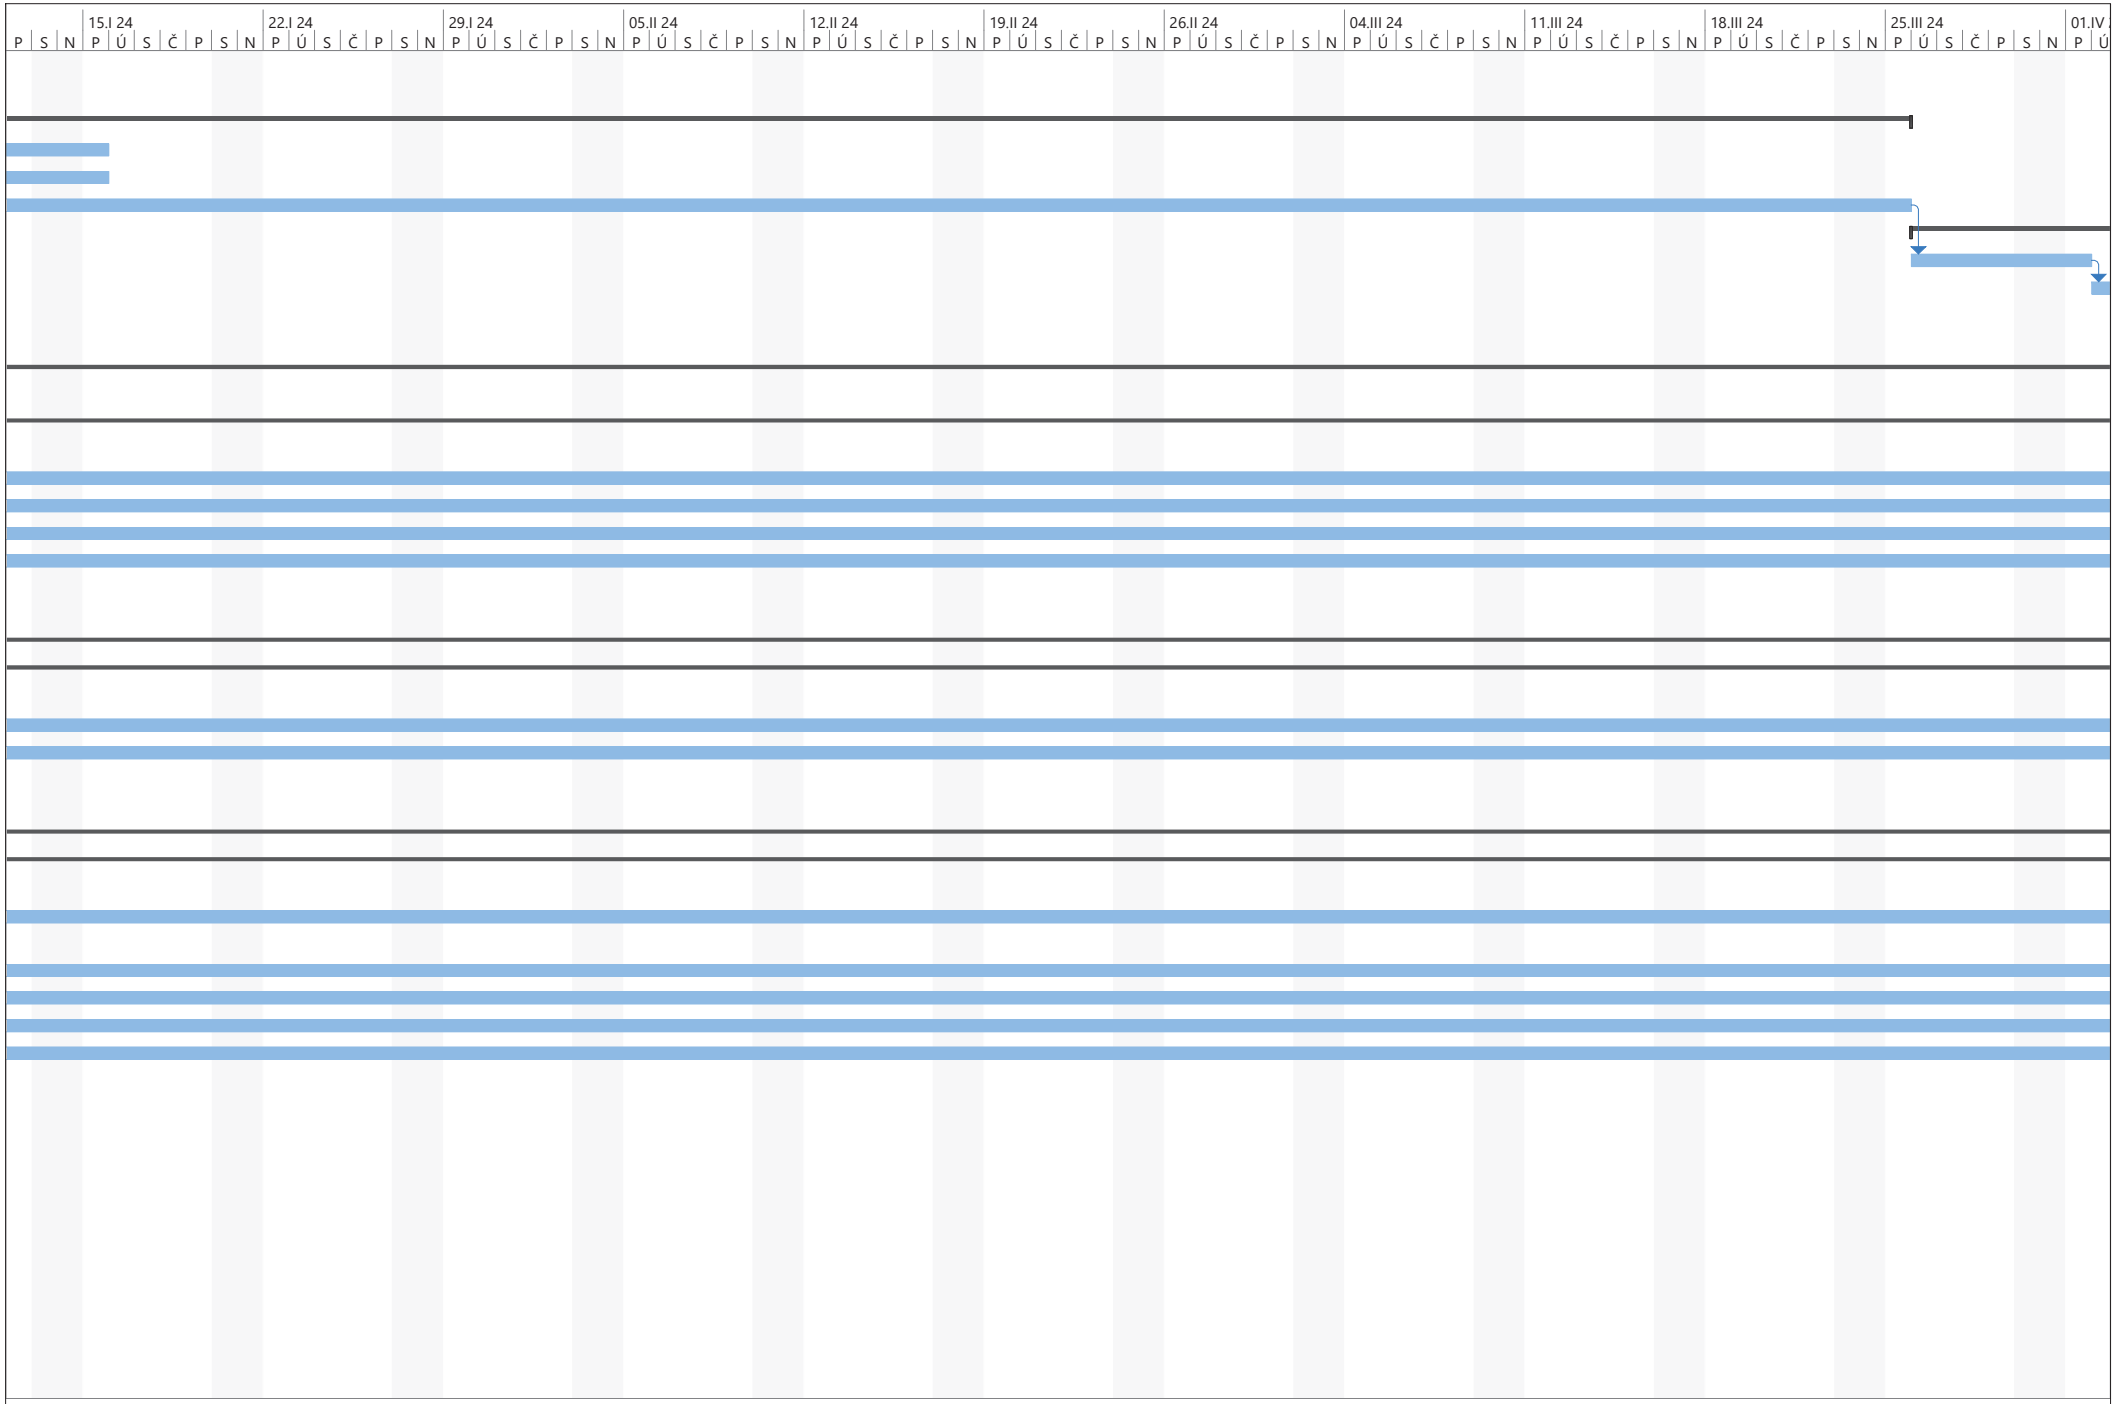
15.I 24
22.I 24
29.I 24
05.II 24
12.II 24
19.II 24
26.II 24
04.III 24
11.III 24
18.III 24
25.III 24
01.IV
P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú

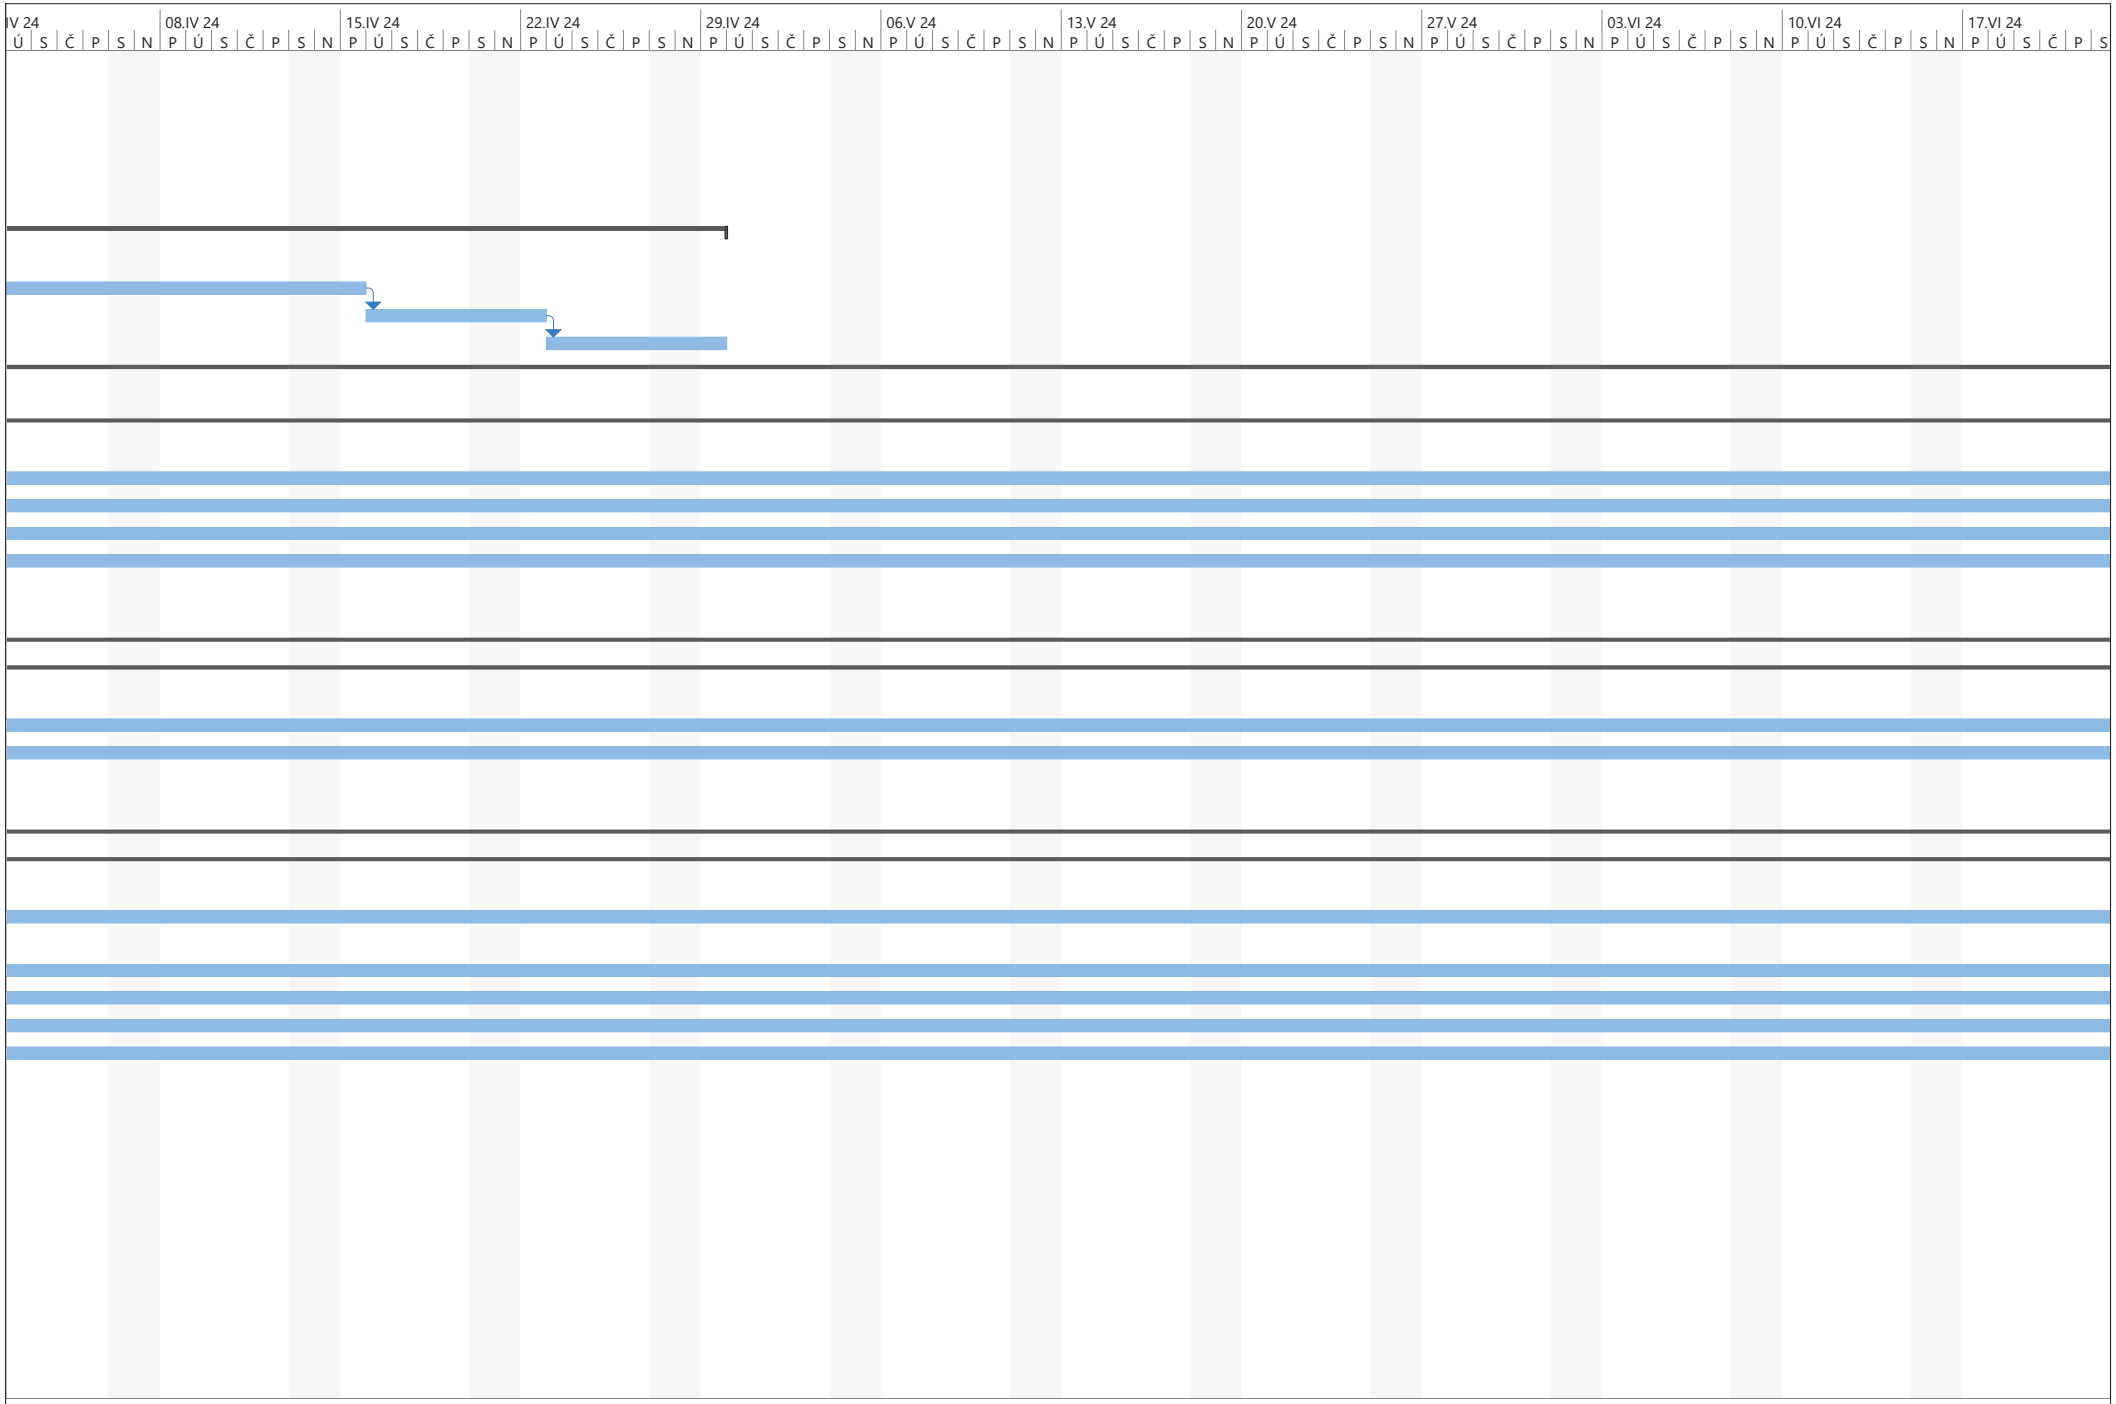
IV 24
08.IV 24
15.IV 24
22.IV 24
29.IV 24
06.V 24
13.V 24
20.V 24
27.V 24
03.VI 24
10.VI 24
17.VI 24
Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S

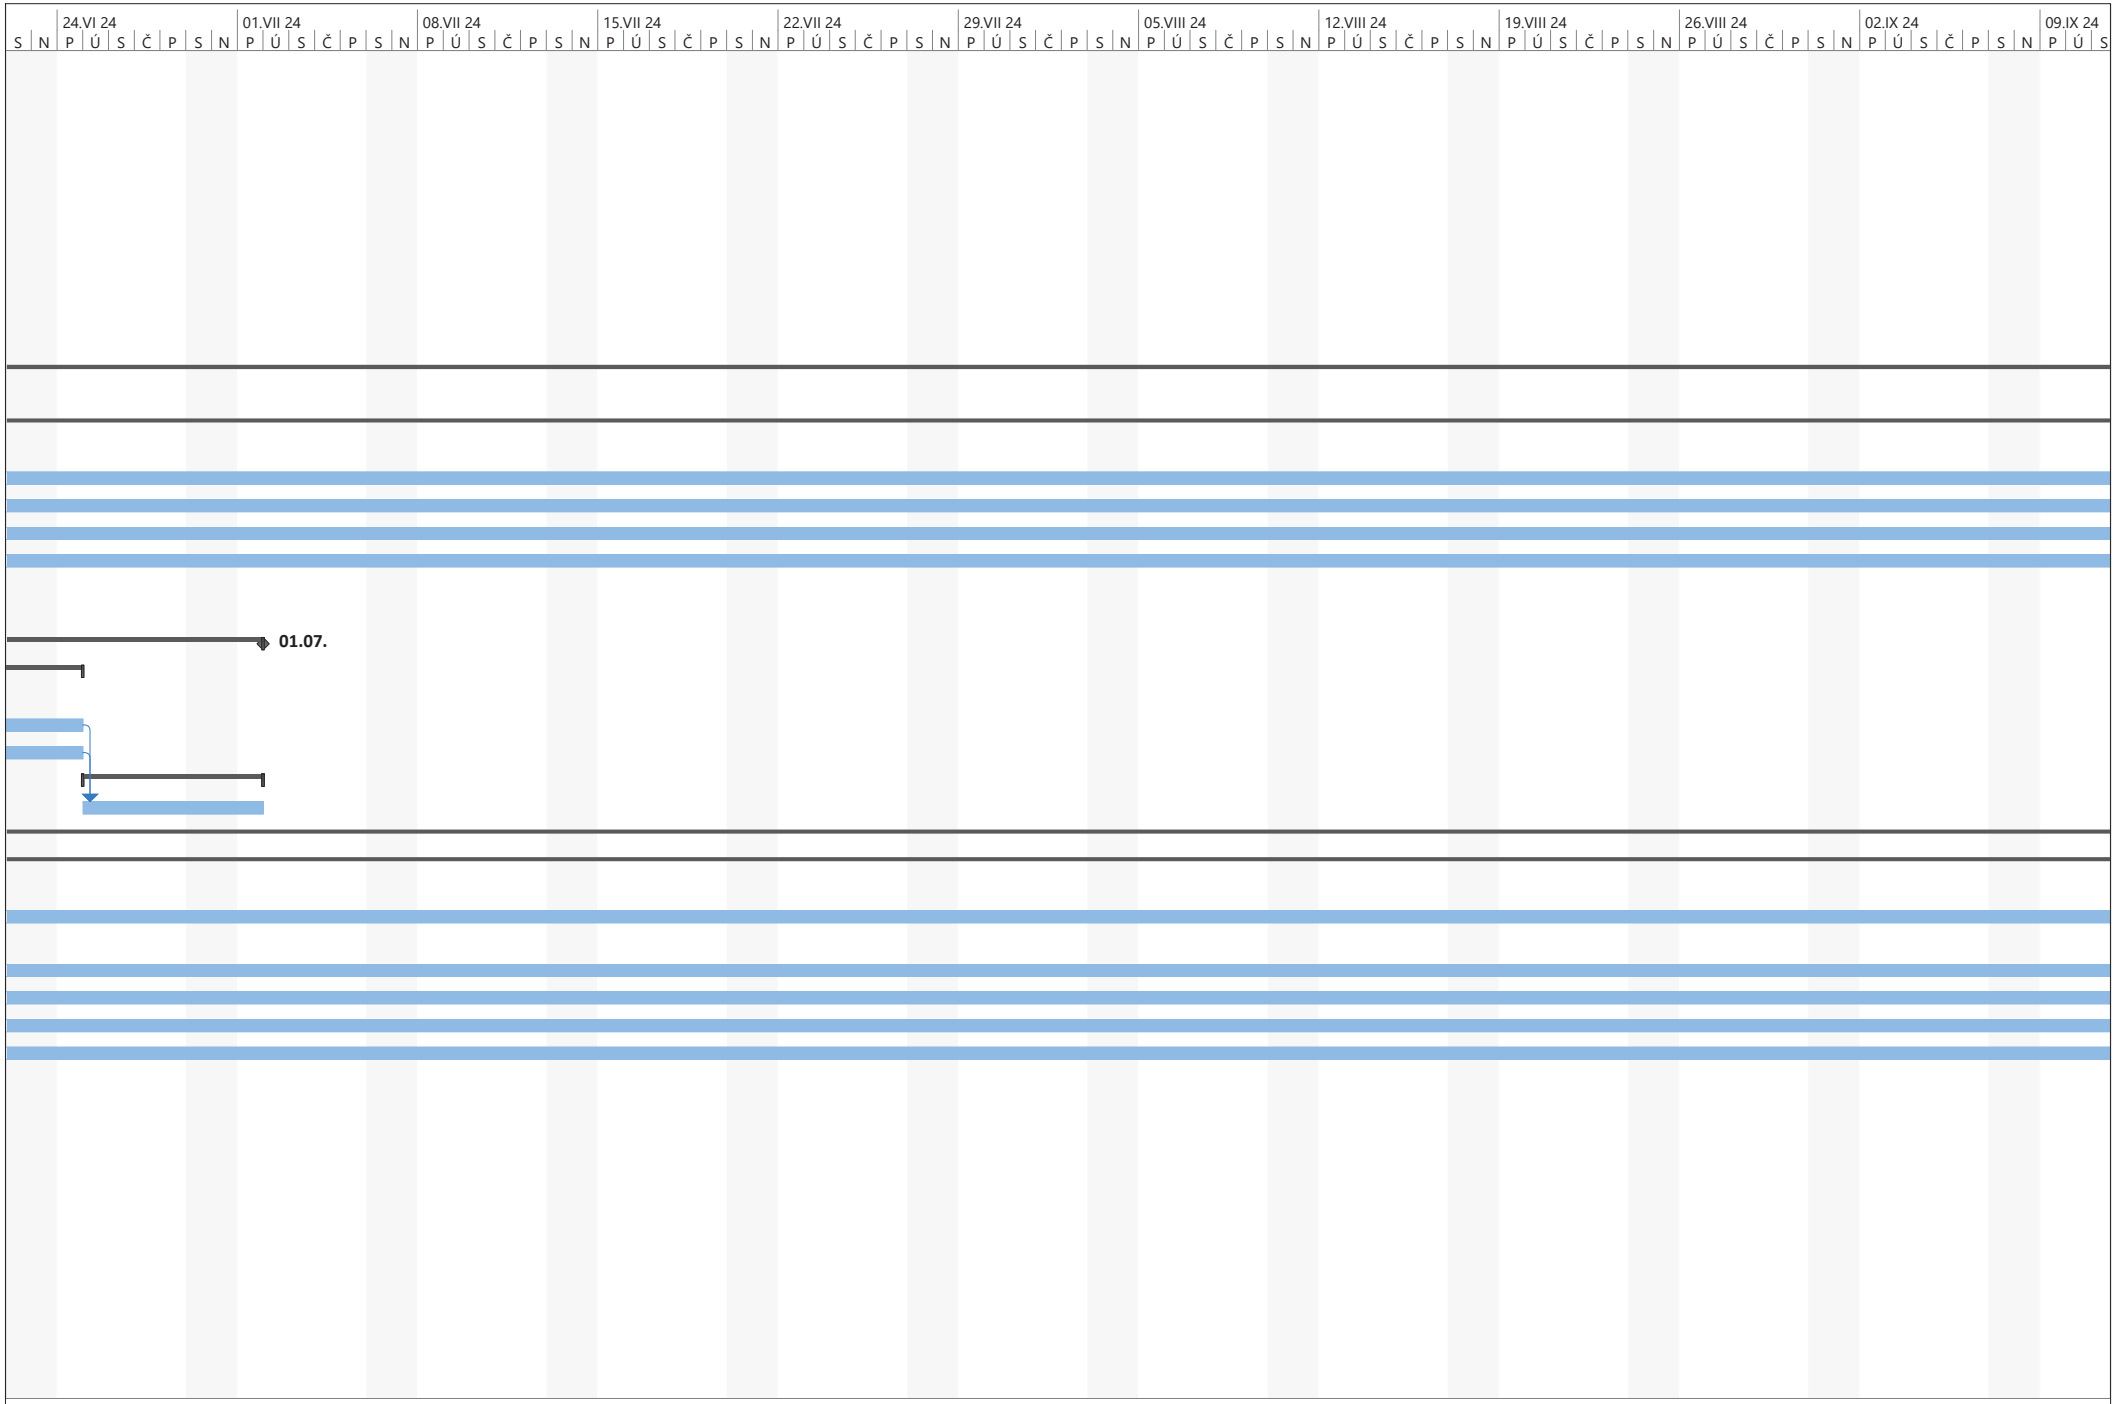
24.VI 24
01.VII 24
08.VII 24
15.VII 24
22.VII 24
29.VII 24
05.VIII 24
12.VIII 24
19.VIII 24
26.VIII 24
02.IX 24
09.IX 24
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S
01.07.

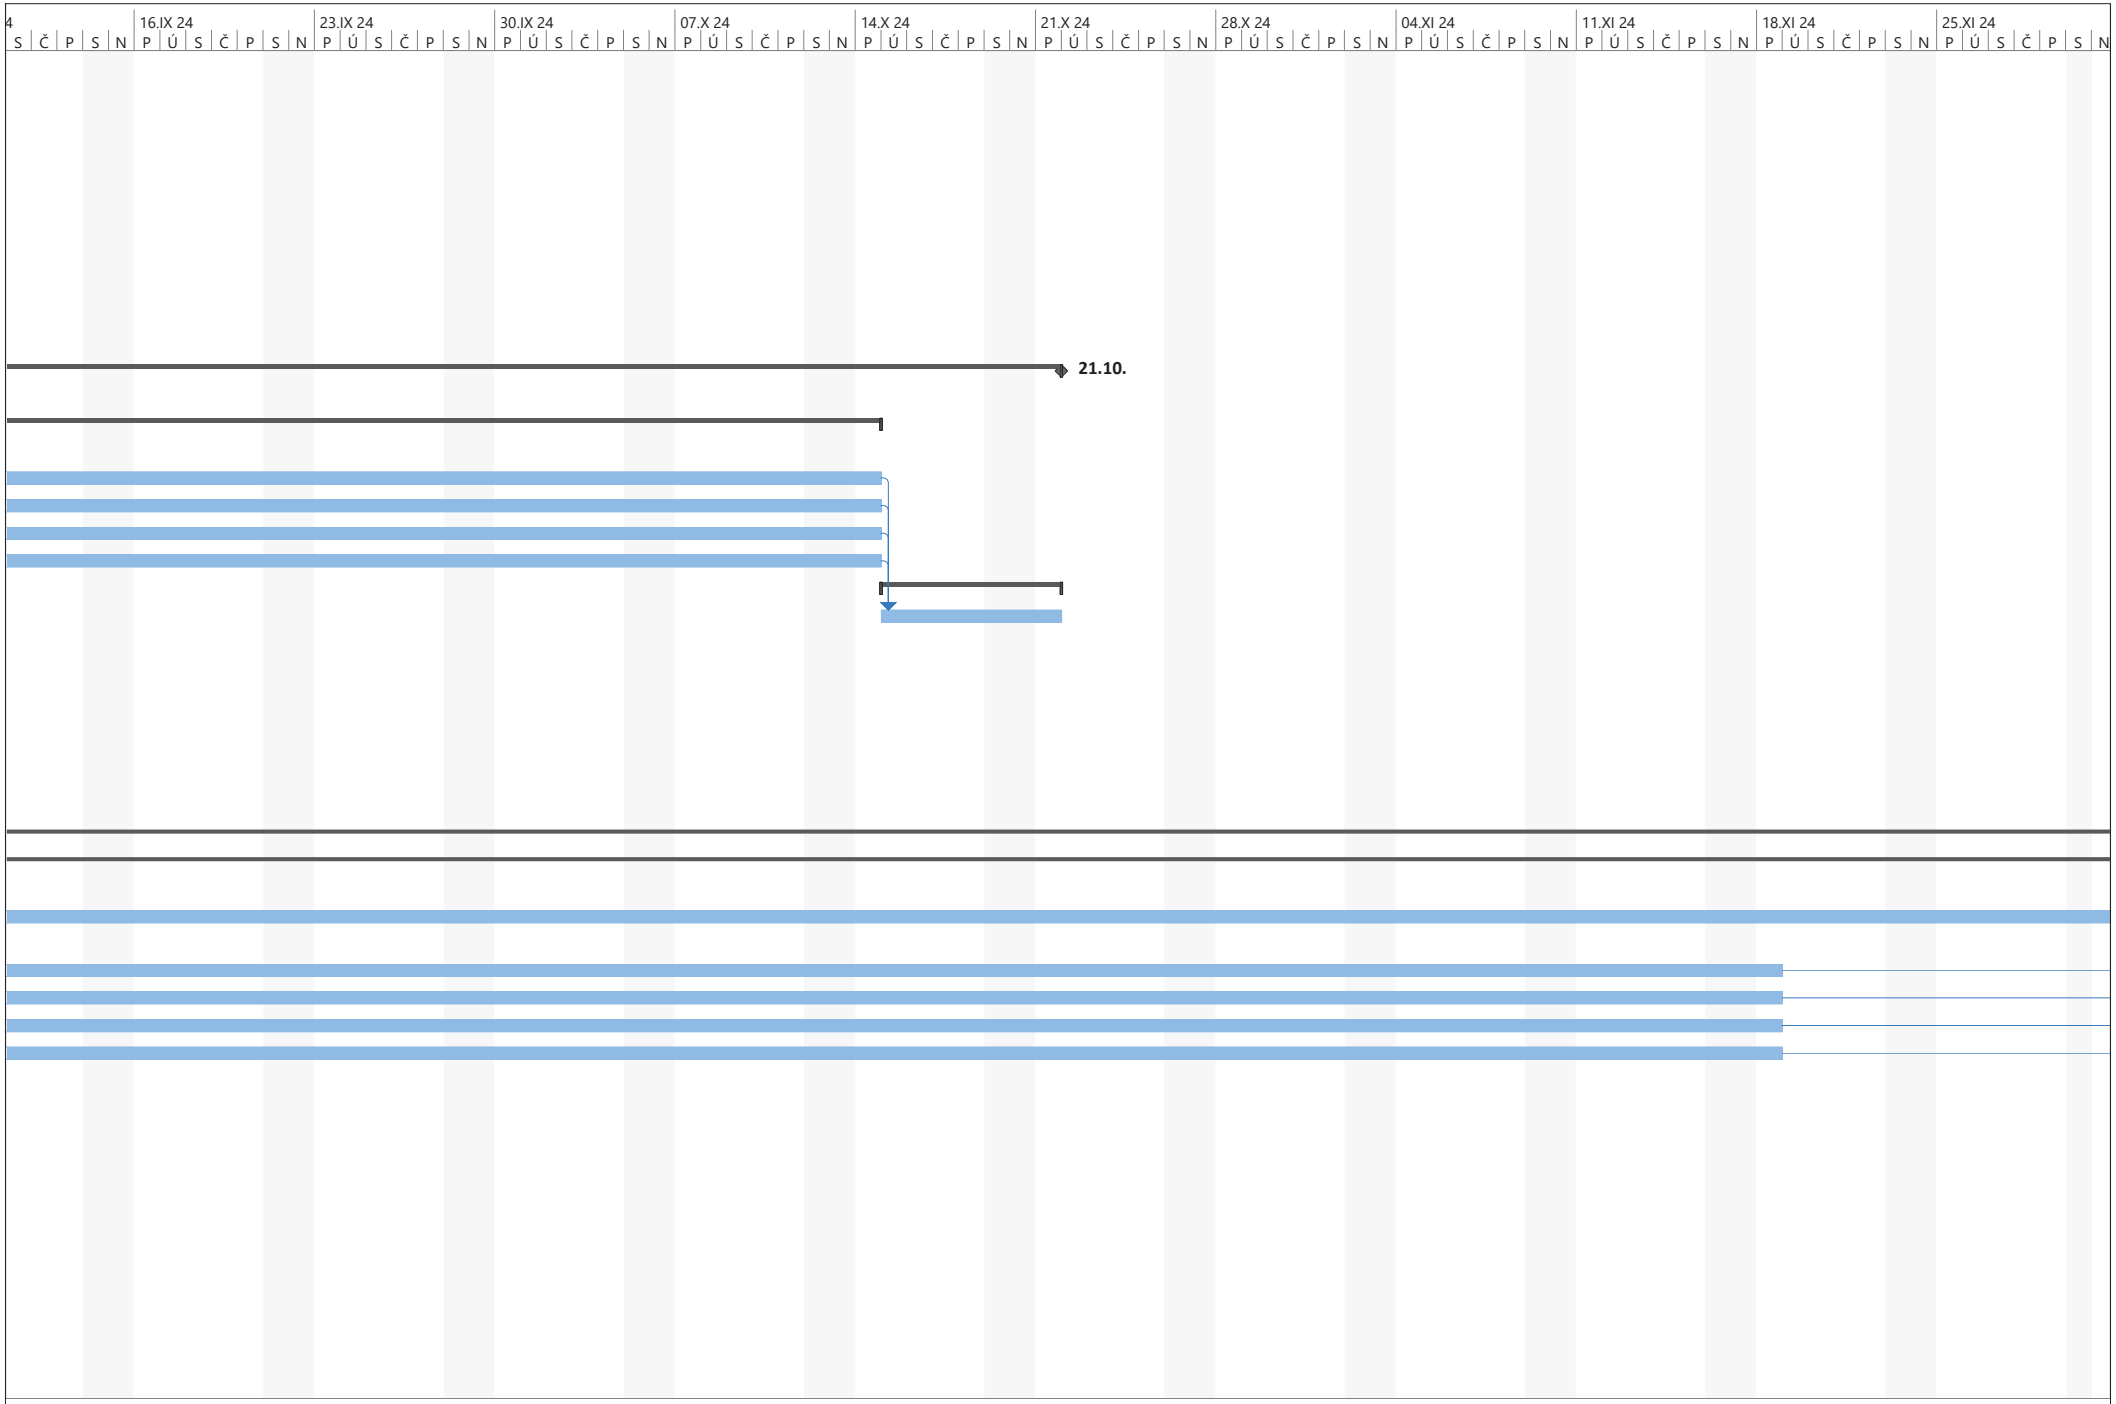
4
16.IX 24
23.IX 24
30.IX 24
07.X 24
14.X 24
21.X 24
28.X 24
04.XI 24
11.XI 24
18.XI 24
25.XI 24
S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N
21.10.

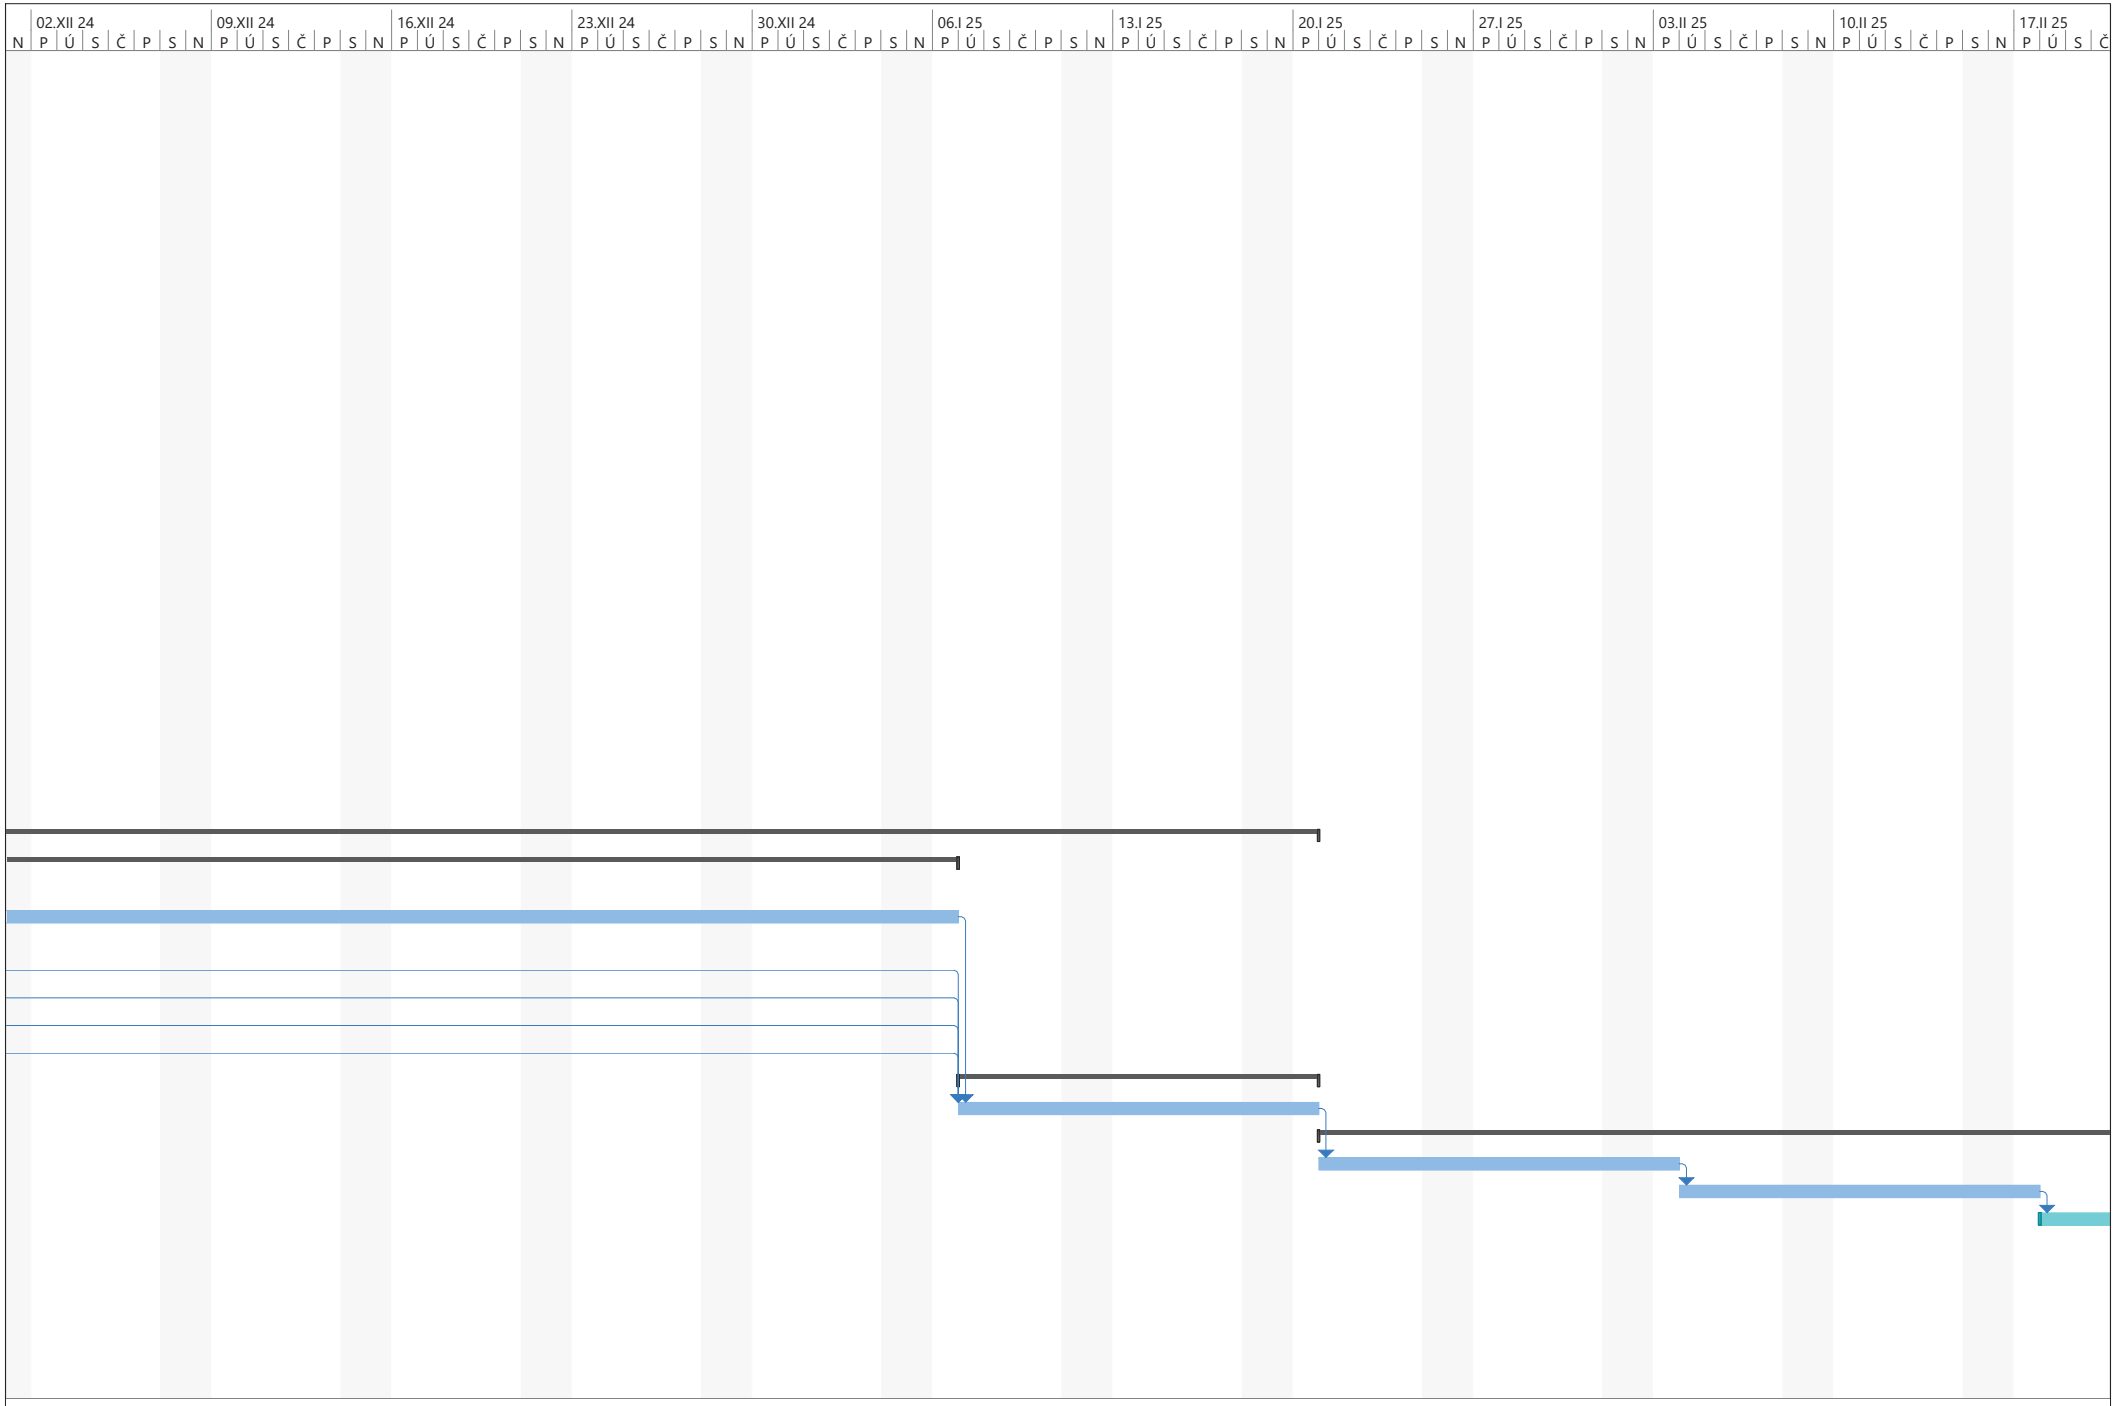
02.XII 24
09.XII 24
16.XII 24
23.XII 24
30.XII 24
06.I 25
13.I 25
20.I 25
27.I 25
03.II 25
10.II 25
17.II 25
N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č

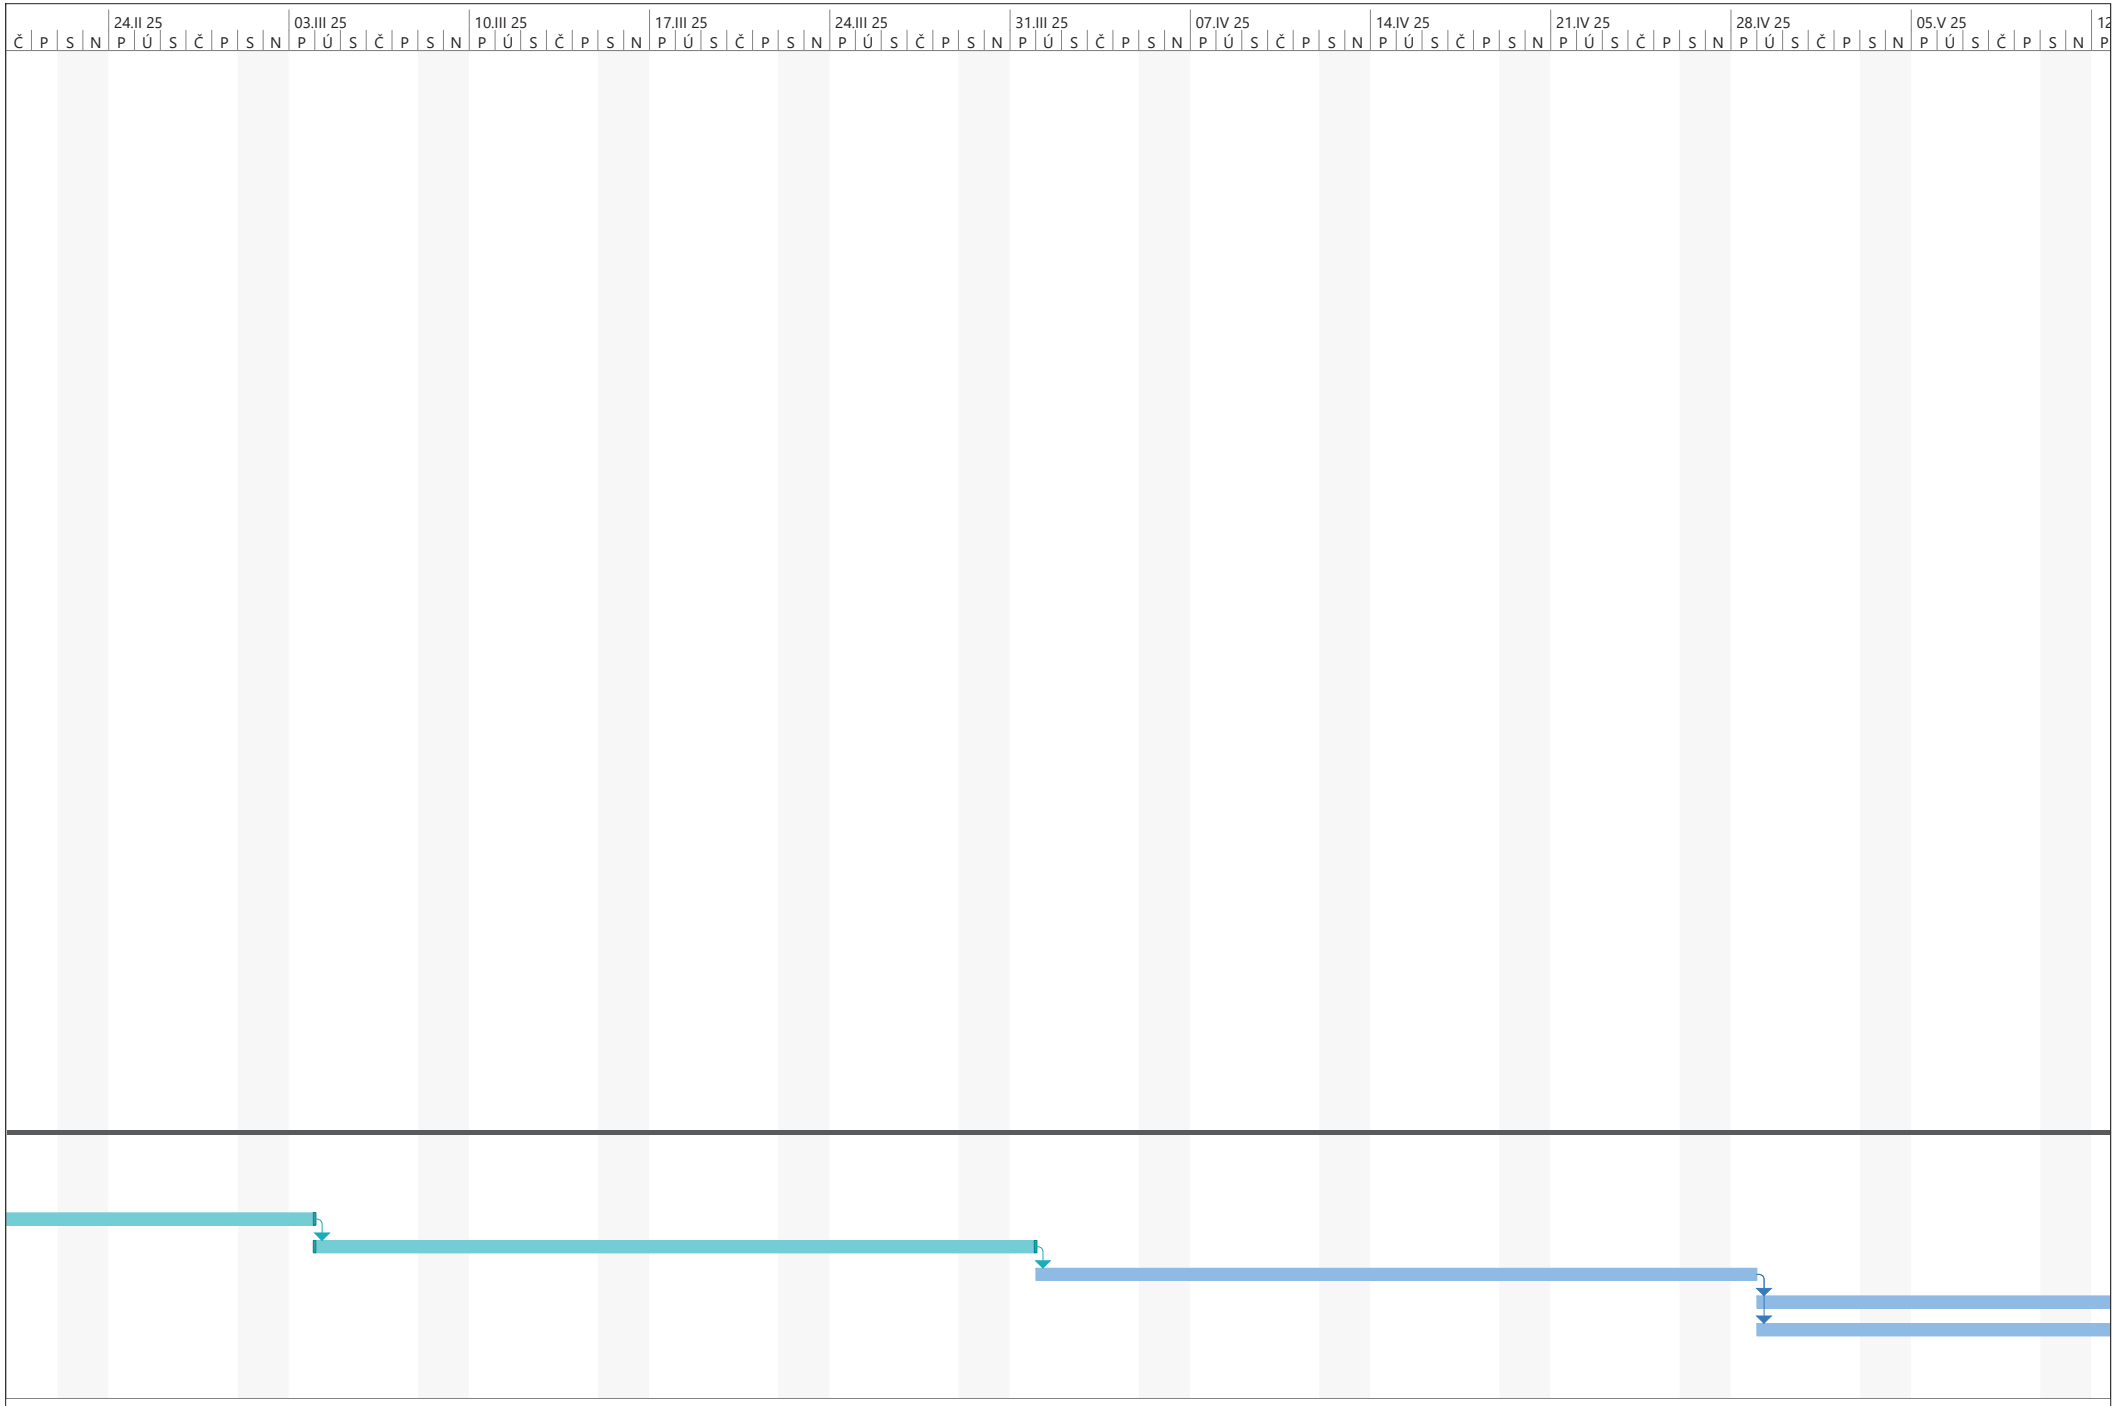
24.II 25
03.III 25
10.III 25
17.III 25
24.III 25
31.III 25
07.IV 25
14.IV 25
21.IV 25
28.IV 25
05.V 25
Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P

12.V 25
19.V 25
26.V 25
02.VI 25
09.VI 25
16.VI 25
23.VI 25
30.VI 25
07.VII 25
14.VII 25
21.VII 25
28.VII 25
P Ú S Č P S N
[redacted]
[redacted]
