22971_ Přesun pasových filtrů+komerční zóna odlety v T1

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**Pasové filtry a OZ Terminál 1 Ruzyně**	**252 dny**	**4.6. 16**	**10.2. 17**
2		Předání plochy pro zařízení staveniště	0 dny	4.6. 16	4.6. 16
3		Vybudování zařízení staveniště	5 dny	4.6. 16	8.6. 16
4		**OZ: Požární únikové schodiště**	**86 dny**	**4.6. 16**	**29.8. 16**
5		Předání staveniště PS Zhotoviteli	0 dny	4.6. 16	4.6. 16
6		Požární schodiště - sever	72 dny	4.6. 16	14.8. 16
7		Požární schodiště - východ	72 dny	18.6. 16	28.8. 16
8		Předání díla a staveniště Objednateli	0 dny	29.8. 16	29.8. 16
9		**VIP schodiště**	**59 dny**	**4.7. 16**	**31.8. 16**
10		Předání staveniště VIP Zhotoviteli	0 dny	4.7. 16	4.7. 16
11		Realizace VIP	55 dny	5.7. 16	28.8. 16
12		Předání díla a staveniště VIP Objednateli	2 dny	30.8. 16	31.8. 16
13		**Stavba pasových filtrů a přeložek sítí v prostoru SO02**	**96 dny**	**12.8. 16**	**15.11. 16**
14		Předání staveniště SO 02 Zhotoviteli	0 dny	12.8. 16	12.8. 16
15		Realizace SO 02	92 dny	15.8. 16	14.11. 16
16		Předání díla a staveniště SO 02 Objednateli	1 den	15.11. 16	15.11. 16
17		Realizace - 5. zóna	21 dny	25.10. 16	14.11. 16
18		**OZ: Obchodní zóna práce typu Shell&Core**	**155 dny**	**9.9. 16**	**10.2. 17**
19		Předání staveniště OZ Zhotoviteli	0 dny	9.9. 16	9.9. 16
20		Realizace - 1. zóna	55 dny	9.9. 16	2.11. 16
21		Realizace - 2. zóna	41 dny	31.12. 16	9.2. 17
22		3. zóna - souběh provozu stávajících a nových pasových filtrů dle PČR	11 dny	28.11. 16	8.12. 16
23		Realizace - 3. zóna	38 dny	3.1. 17	9.2. 17
24		Realizace - 4. zóna	27 dny	9.9. 16	5.10. 16
25		Předání díla - zóna 4 a staveniště Objednateli	0 dny	6.10. 16	6.10. 16
26		Předání díla - zóna 1 a staveniště Objednateli	0 dny	10.2. 17	10.2. 17
27		Předání díla - zóna 2 a staveniště Objednateli	0 dny	10.2. 17	10.2. 17
28		Předání díla - zóna 3 a staveniště Objednateli	0 dny	10.2. 17	10.2. 17
29		**OZ: Instalace ústředny EPS v IDF4**	**56 dny**	**9.9. 16**	**3.11. 16**
30		Dodávka a montáž	56 dny	9.9. 16	3.11. 16
31		**OZ: Instalace PER**	**154 dny**	**9.9. 16**	**9.2. 17**
32		Dodávka a montáž	154 dny	9.9. 16	9.2. 17
33		**OZ: Instalace technologie IDF9**	**38 dny**	**26.9. 16**	**2.11. 16**
34		Dodávka a montáž	38 dny	26.9. 16	2.11. 16
35		Odstranění zařízení staveniště	3 dny	7.2. 17	9.2. 17
36		Předání díla objednateli	0 dny	10.2. 17	10.2. 17

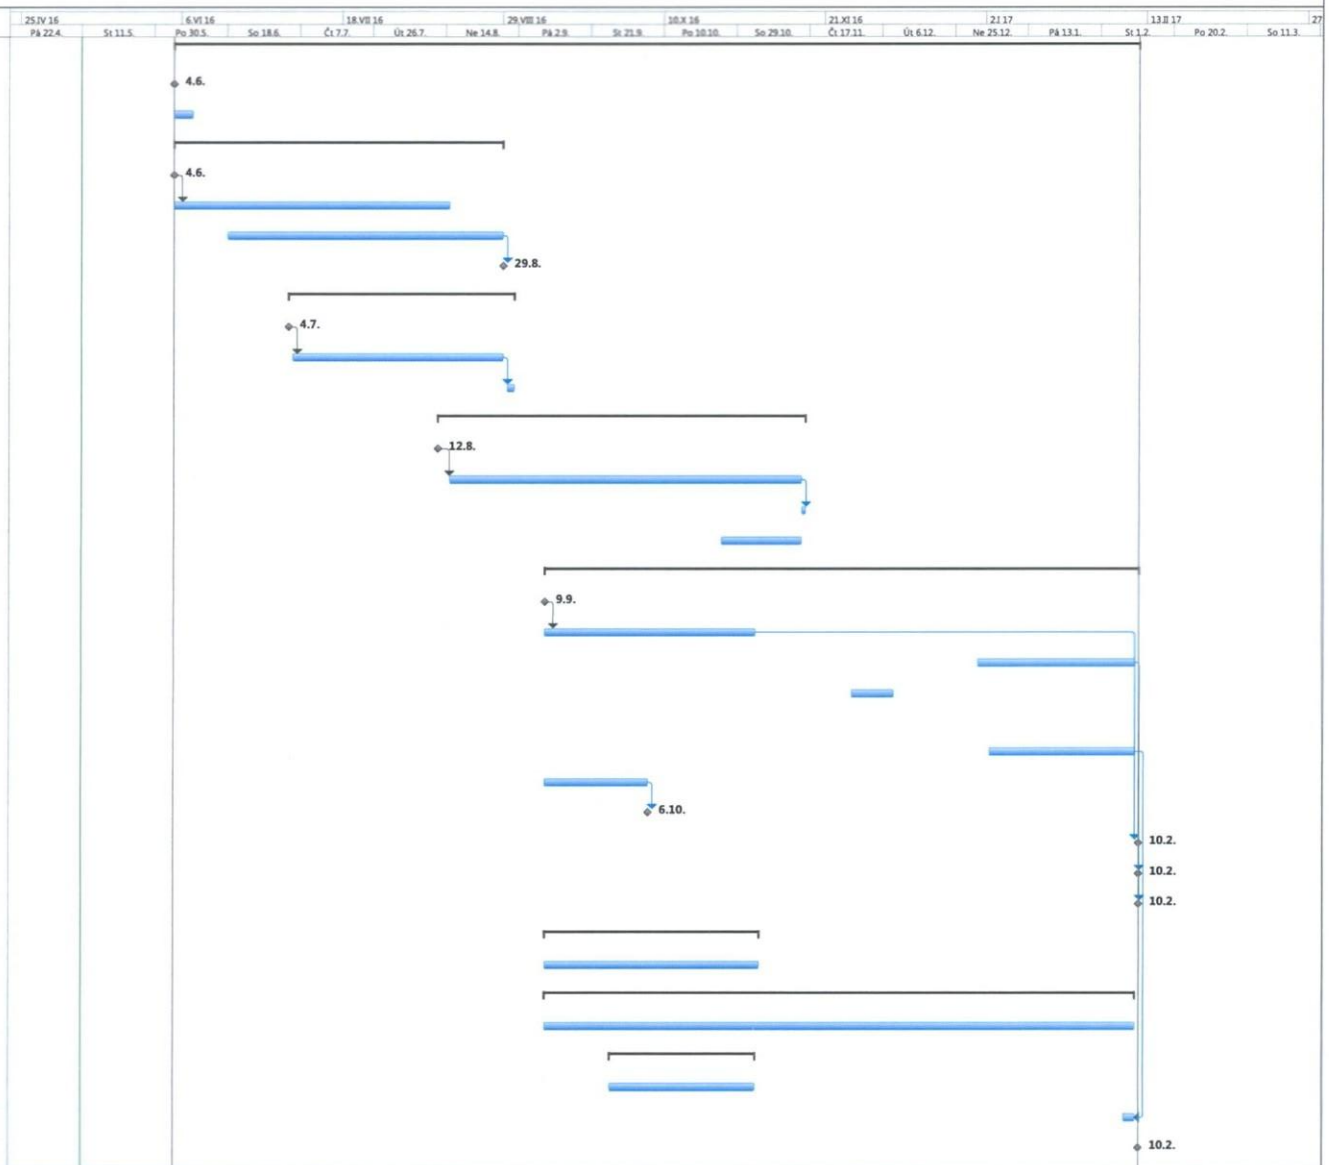

Projekt: Hmg Pasové filtry Ruzy
Datum: 11.5. 16

Úkol · Souhrn projektu · Ruční úkol · Pouze zahájení · Konečný termín
Rozdělení · Neaktivní úkol · Pouze s dobou trvání · Pouze s datem dokončení · Průběh
Milník · Neaktivní milník · Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Vnější úkoly · Průběh ručně zadaného úkolu
Souhrnný · Neaktivní souhrn · Ruční souhrn · Vnější milník

Uchazeč: OHL ŽS, a.s.
