F. B. S. FastBuilderSoft

staving

126/2022 Rekonstrukce MŠ Šněhurka, Bořetické 26, Brno - NÁVRH HARMONOGRAMU
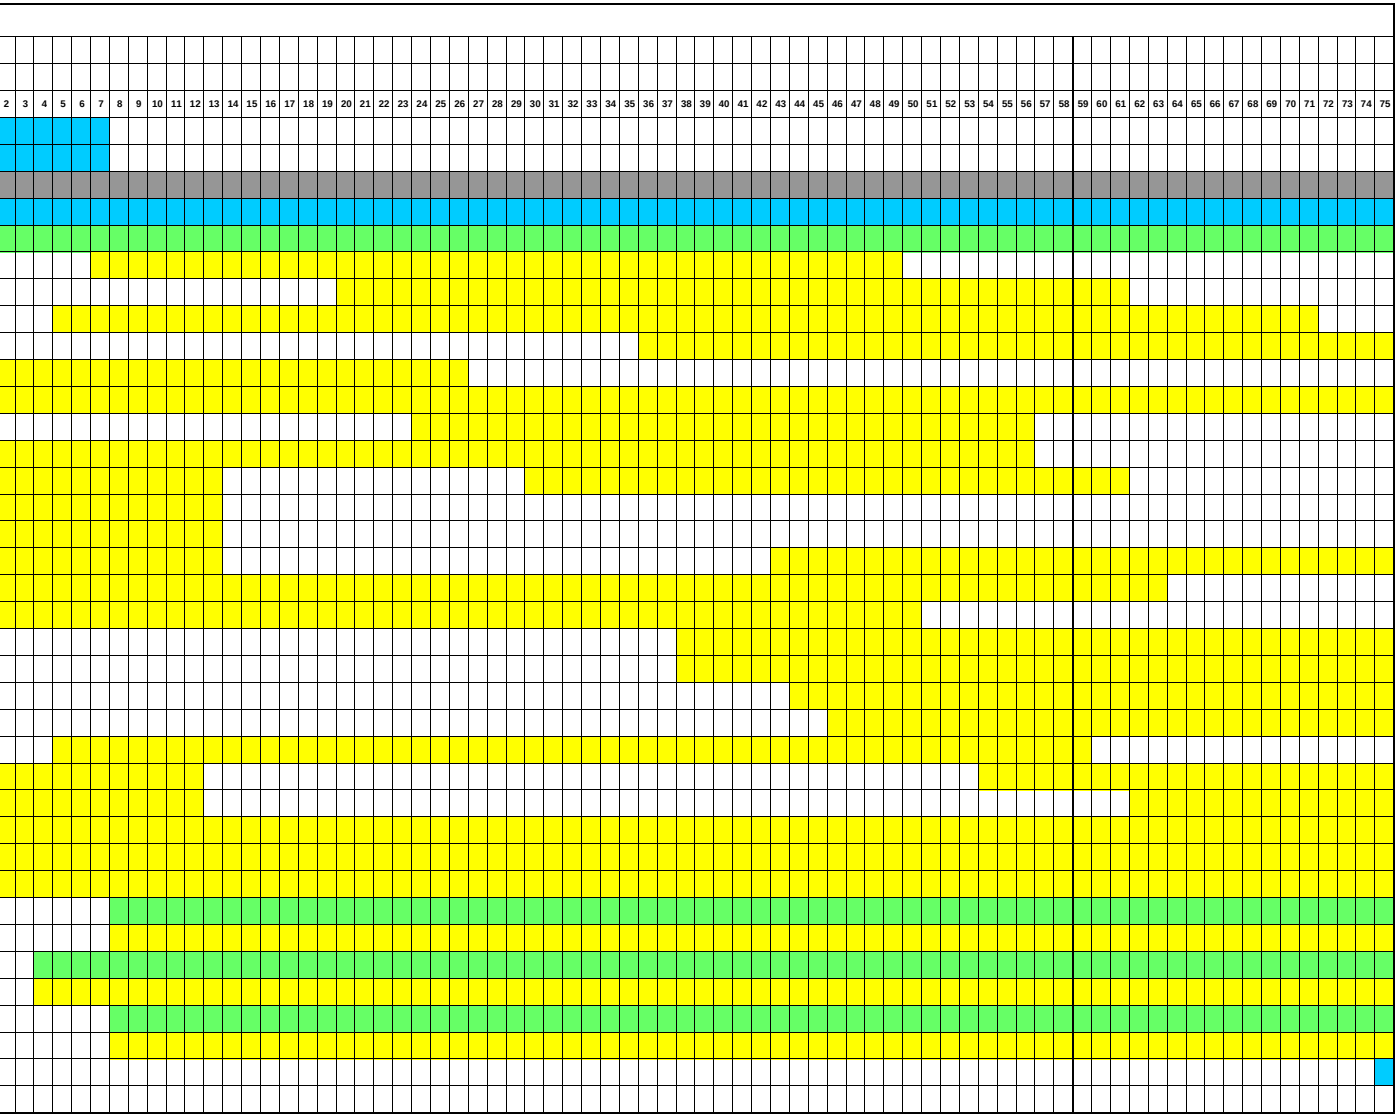
			ORD
	Termín Od: Do:	Týden->	Poč.T.
	Celková doba realizace: 75 dnů	Plnění	75
Stavební díl	Převzetí stavby		7
	Přípravné a organizační práce		7
Stavba+VO			75
SO 01	Hlavní objekt		75
1	Stavební práce		75
3	Svislé a kompletní konstrukce		43
61	Úpravy povrchů vnitřní		42
94	Lešení a stavební výtahy		67
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		40
96	Bourání konstrukcí		26
99	Staveništní přesun hmot		75
711	Izolace proti vodě		33
712	Povlakové krytiny		56
713	Izolace tepelné		45
725	Zařizovací předměty		13
764	Konstrukce klempířské		13
766	Konstrukce truhlářské		46
767	Konstrukce zámečnické		63
769	Otvorové prvky z plastu		50
771	Podlahy z dlaždic a obklady		38
776	Podlahy povlakové		38
783	Nátěry		32
784	Malby		30
799	Ostatní		55
M21	Elektromontáže		34
M42	Montáž zařízení potravinářského průmyslu		26
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		75
VN	Vedlejší náklady		75
ON	Ostatní náklady		75
D.1.4.1	Vzduchotechnika a chlazení		68
	Vzduchotechnika a chlazení		68
D.1.4.2	Zdravotně technické instalace		72
	Zdravotně technické instalace		72
D.1.4.3	Elektrotechnika a hromosvod		68
	Elektrotechnika a hromosvod		68
	Odevzdání hotového díla		1
