ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1			**Nástavba učeben ZŠ Mladá Boleslav**	**170 dny**	**10.06. 24**	**31.01. 25**	
2			***podpis smlouvy o dílo***	0 dny	10.06. 24	10.06. 24	
3			přípravné práce/sondy a zaměření	5 dny	12.06. 24	18.06. 24	2FS+2 dny
4			projektové práce zhotovitele - výrobní dokumentace	15 dny	19.06. 24	09.07. 24	3
5			***schválení VD výtahové šachty***	0 dny	09.07. 24	09.07. 24	4SF+15 dny
6			***schválení VD nosných kcí***	0 dny	12.07. 24	12.07. 24	4FF+3 dny
7			výroba nosných prvků	35 dny	15.07. 24	30.08. 24	6
8			**převzetí staveniště - zahájení díla**	**0 dny**	**02.08. 24**	**02.08. 24**	2FF+40 dny
9			zřízení ZS	5 dny	05.08. 24	09.08. 24	8
10			**přístavba výtahové šachty**	**60 dny**	**07.08. 24**	**29.10. 24**	
11			základy pro výtahovou šachtu	15 dny	07.08. 24	27.08. 24	8FS+2 dny
12			D+M výtahová šachty včteně profesí	25 dny	28.08. 24	01.10. 24	11;5FS+25 dny
13			D+M výtahu	5 dny	02.10. 24	08.10. 24	12
14			výtahová šachta - kompletace	15 dny	09.10. 24	29.10. 24	13
15			**nástavba učeben**	**125 dny**	**05.08. 24**	**24.01. 25**	
16			přípravné bourací práce	10 dny	08.08. 24	21.08. 24	8SS+3 dny
17			D+M nosných konstrukcí	30 dny	05.08. 24	13.09. 24	7SS+15 dny
18			bednění + pojistná hydroizolace	15 dny	09.09. 24	27.09. 24	17FF+10 dny
19			D+M kompletizovaných panelů opláštění	25 dny	16.09. 24	18.10. 24	17
20			ostatní bourací práce	20 dny	09.09. 24	04.10. 24	18FF+5 dny
21			střešní plášť a kempířské výrobky	25 dny	30.09. 24	01.11. 24	19FF+10 dny
22			D+M okenních výplní	20 dny	07.10. 24	01.11. 24	19FF+10 dny
23			SDK konstrukce	40 dny	04.11. 24	27.12. 24	22
24			TZB rozvody	20 dny	02.12. 24	27.12. 24	23FF
25			skladby podlah	10 dny	16.12. 24	27.12. 24	23FF
26			vnitřní výplně	5 dny	30.12. 24	03.01. 25	25
27			TZB kompletace	10 dny	30.12. 24	10.01. 25	25
28			malby, obklady, dlažby	10 dny	30.12. 24	10.01. 25	27FF
29			povlakové krytiny	10 dny	06.01. 25	17.01. 25	25FS+10 dny
30			fasáda	25 dny	04.11. 24	06.12. 24	22
31			kompletace a dokončovací práce	10 dny	13.01. 25	24.01. 25	29FF+5 dny
32			**stavební úpravy v objektu A**	**90 dny**	**12.08. 24**	**13.12. 24**	
33			bourací práce	10 dny	12.08. 24	23.08. 24	9
34			nové dispozice	30 dny	19.08. 24	27.09. 24	33SS+5 dny
35			TZB	30 dny	26.08. 24	04.10. 24	34FF+5 dny
36			obklady, dlažby, malby	30 dny	07.10. 24	15.11. 24	35
37			kompletace a dokončovací práce	20 dny	18.11. 24	13.12. 24	36
38			zkoušky, regulace, revize	10 dny	13.01. 25	24.01. 25	27
39			předávací řízení	5 dny	27.01. 25	31.01. 25	38
40			**předání díla**	**0 dny**	**31.01. 25**	**31.01. 25**	39

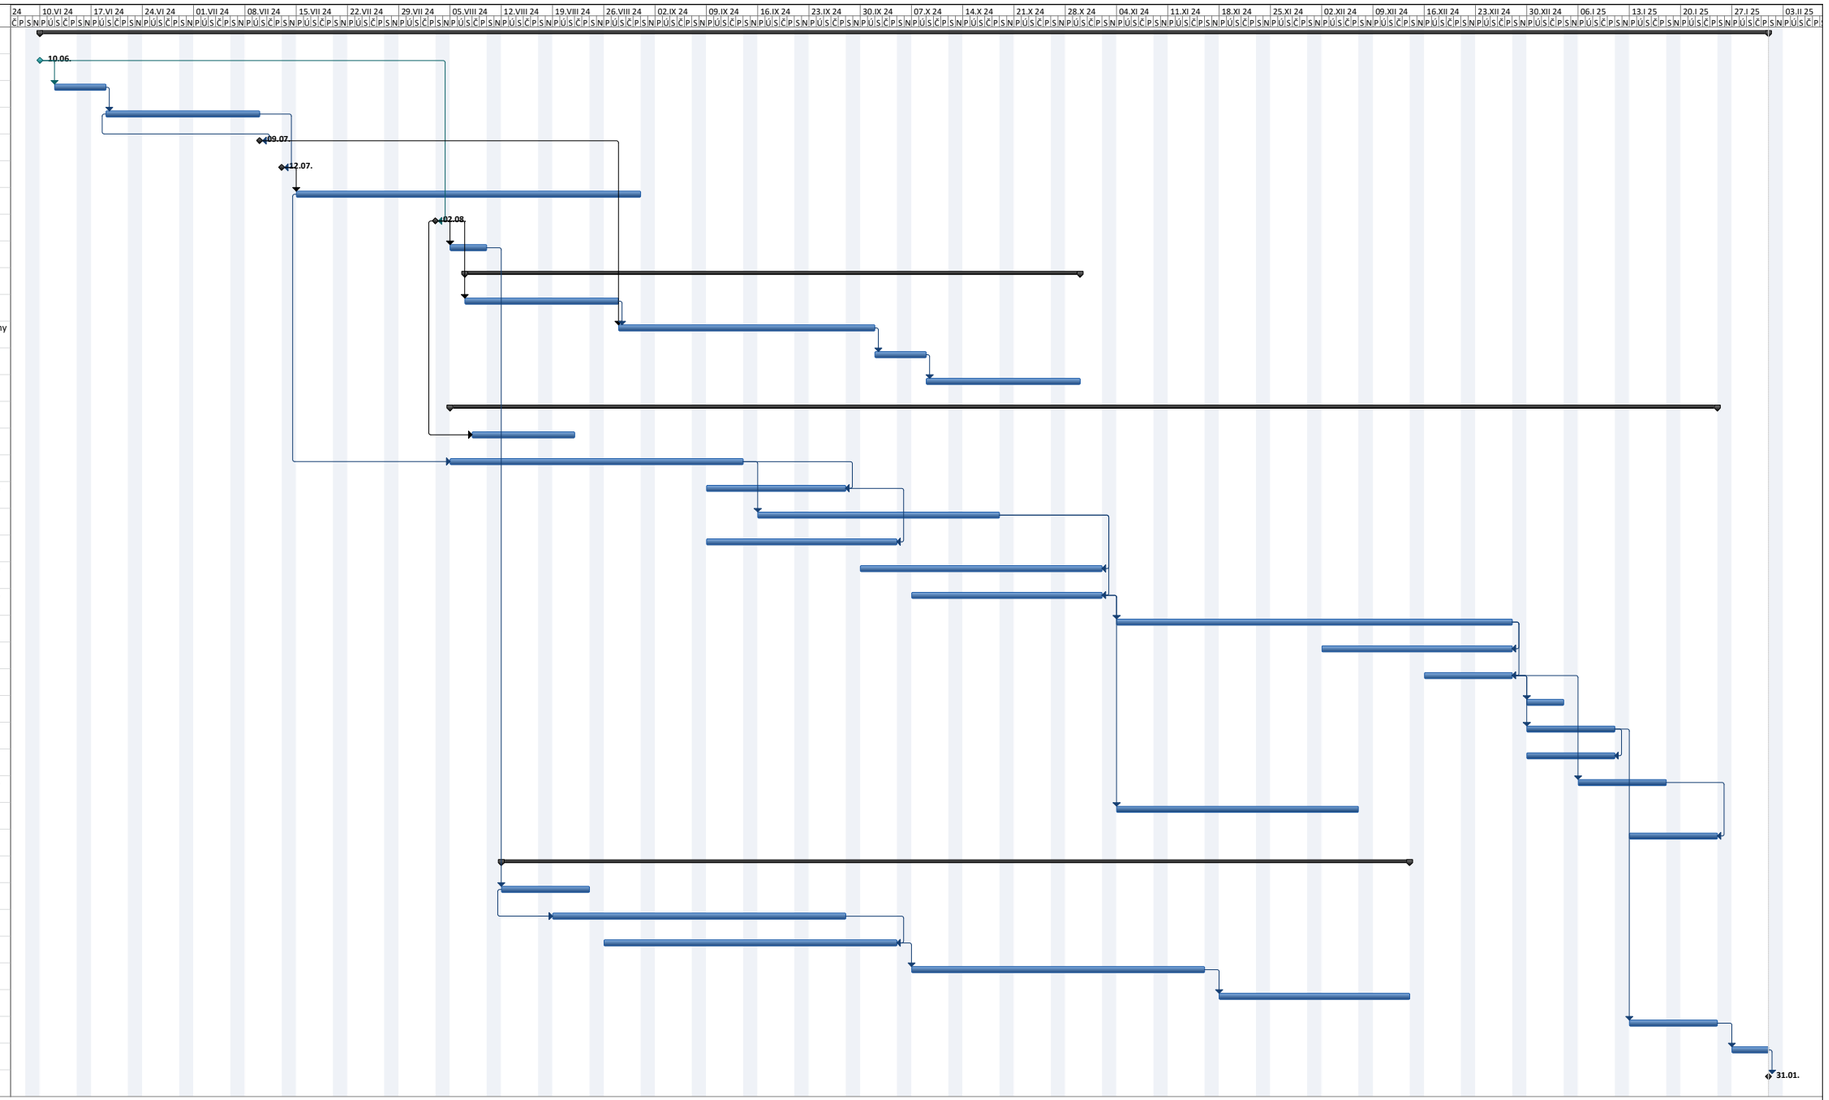

Projekt: HMG_draft_nástavbaZŠM
Datum: 02.05. 24

Úkol | Milník | Souhrn projektu | Vnější milník | Neaktivní milník | Ruční úkol | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze zahájení | Konečný termín
Rozdělení | Souhrnný | Vnější úkoly | Neaktivní úkol | Neaktivní souhrn | Pouze s dobou trvání | Ruční souhrn | Pouze s datem dokončení | Průběh
