HARMONOGRAM VÝSTAVBY - Thomayerova nemocnice – pavilon H – přestavba oddělení mikrobiologie

Verze: 29.7. 16

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání
1	**CELKOVÉ TRVÁNÍ STAVBY - DOBA PLNĚNÍ**	**1.8. 16**	**13.11. 16**	**105 dny**
2	**Převzetí staveniště**	**1.8. 16**	**1.8. 16**	**0 dny**
3	**SO 001 - obvodový plášť**	**8.8. 16**	**13.11. 16**	**98 dny**
4	Okapový chodník	8.8. 16	6.11. 16	13 týdny
5	Plošná chemická injektáž	15.8. 16	18.9. 16	5 týdny
6	Průzkum omítek s NPÚ	5.9. 16	11.9. 16	1 týden
7	Demontáže nefunkčních rozvodů fasáda	19.9. 16	25.9. 16	1 týden
8	Fasáda - vysprávky a zateplení	5.9. 16	6.11. 16	9 týdny
9	Osazení oken a dveří - fasáda	26.9. 16	23.10. 16	4 týdny
10	Nová střecha na krčku	5.9. 16	9.10. 16	5 týdny
11	Klempířské výrobky a zámečnické výrobky	3.10. 16	23.10. 16	3 týdny
12	Dokončovací práce a úklid	31.10. 16	13.11. 16	2 týdny
13				
14	**SO 001 - vnitřní úpravy**	**1.8. 16**	**13.11. 16**	**105 dny**
15	Bourací práce a demontáže	1.8. 16	4.9. 16	5 týdny
16	SDK příčky a podhledy	29.8. 16	13.11. 16	11 týdny
17	Vyzdívky	29.8. 16	11.9. 16	2 týdny
18	Hrubé rozvody	12.9. 16	6.11. 16	8 týdny
19	Vnitřní omítky	12.9. 16	25.9. 16	2 týdny
20	Hrubé skladby podlah	22.8. 16	9.10. 16	7 týdny
21	Dlažby a obklady	26.9. 16	23.10. 16	4 týdny
22	Výmalby a nátěry	17.10. 16	13.11. 16	4 týdny
23	Truhlářské konstrukce	24.10. 16	13.11. 16	3 týdny
24	Nášlapné vrstvy	31.10. 16	13.11. 16	2 týdny

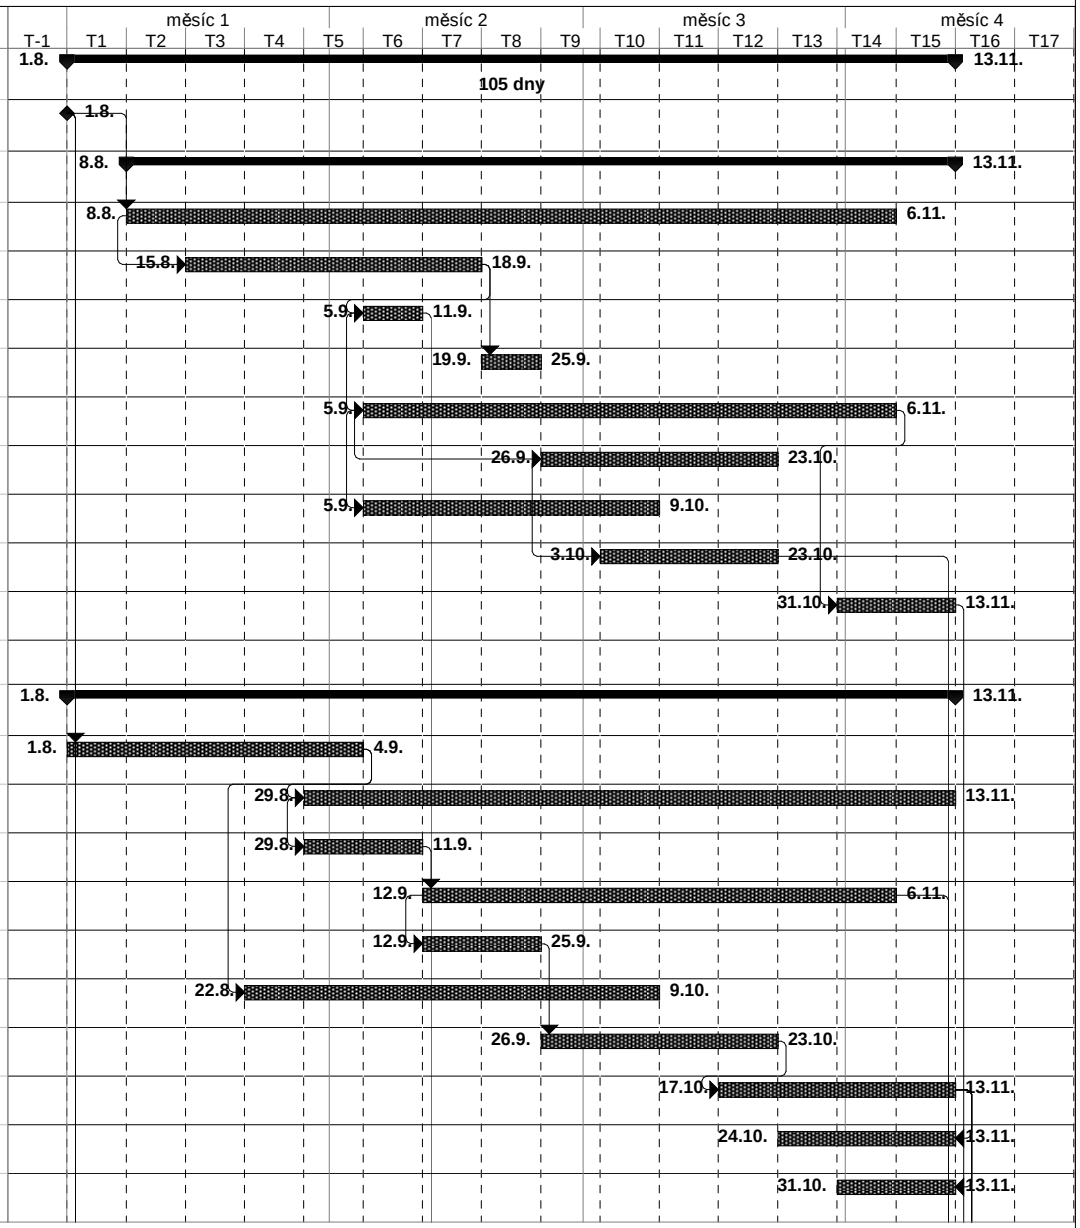

HARMONOGRAM VÝSTAVBY - Thomayerova nemocnice – pavilon H – přestavba oddělení mikrobiologie

Verze: 29.7. 16
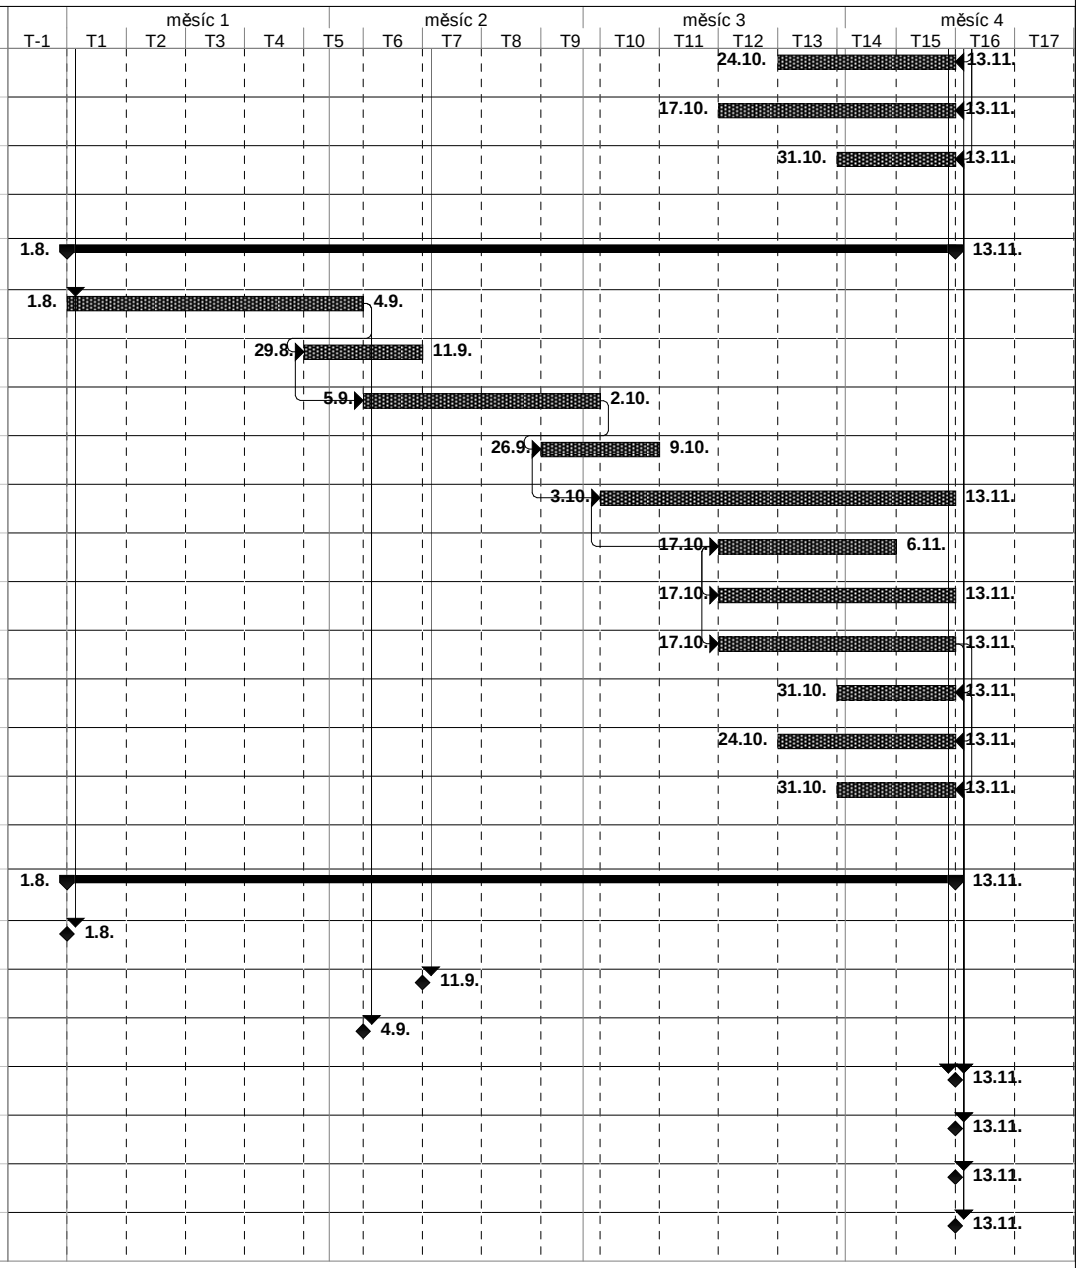
ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání
25	Kompletace profesí	24.10. 16	13.11. 16	3 týdny
26	Zdravotnické vybavení a interierové vybavení	17.10. 16	13.11. 16	4 týdny
27	Dokončovací práce a úklid	31.10. 16	13.11. 16	2 týdny
28				
29	**SO 002**	**1.8. 16**	**13.11. 16**	**105 dny**
30	Bourací práce a demontáže	1.8. 16	4.9. 16	5 týdny
31	Zemní práce	29.8. 16	11.9. 16	2 týdny
32	Základy vč. Rozvodů	5.9. 16	2.10. 16	4 týdny
33	Montáž ocelového rámu objektu	26.9. 16	9.10. 16	2 týdny
34	Opláštění vč. Střechy	3.10. 16	13.11. 16	6 týdny
35	Podlahy - skladby	17.10. 16	6.11. 16	3 týdny
36	SDK konstrukce	17.10. 16	13.11. 16	4 týdny
37	Rozvody médii	17.10. 16	13.11. 16	4 týdny
38	Kompletace, výmalby	31.10. 16	13.11. 16	2 týdny
39	Podlahové nášlapné vrstvy	24.10. 16	13.11. 16	3 týdny
40	Dokončovací práce a úklid	31.10. 16	13.11. 16	2 týdny
41				
42	**Uzlové body:**	**1.8. 16**	**13.11. 16**	**105 dny**
43	Převzetí staveniště	1.8. 16	1.8. 16	0 dny
44	Průzkumy	11.9. 16	11.9. 16	0 dny
45	Dokončení demoličních prací	4.9. 16	4.9. 16	0 dny
46	Dokončení hrubé stavby vč. fasádních konstrukcí a výměny oken a dveří	13.11. 16	13.11. 16	0 dny
47	Dokončení kompletačních prací vč. všech profesí	13.11. 16	13.11. 16	0 dny
48	Kolaudační souhlas	13.11. 16	13.11. 16	0 dny
49	Předání díla	13.11. 16	13.11. 16	0 dny
