Příloha č. II návrhu smlouvy o dílo
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

ID	Kód	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1					
2		**„FN Brno – Rekonstrukce chirurgického oddělení OS“**	**240 dny**	**4.4. 16**	**30.11. 16**
3					
4		**Milníky výstavby**	**240 dny**	**4.4. 16**	**30.11. 16**
5		**Předání a převzetí prostoru staveniště**	**0 dny**	**4.4. 16**	**4.4. 16**
6	**uzlový bod**	**Dokončení bourání a demontáží**	**0 dny**	**11.6. 16**	**11.6. 16**
7	**uzlový bod**	**Dokončení stavebních prací**	**0 dny**	**25.11. 16**	**25.11. 16**
8		**Předání a převzetí díla**	**0 dny**	**30.11. 16**	**30.11. 16**
9					
10		**Vedlejší a ostatní náklady**	**238 dny**	**7.4. 16**	**30.11. 16**
11		**Zařízení staveniště - vybudování, provoz, likvidace**	**238 dny**	**7.4. 16**	**30.11. 16**
12		**Návody k obsluze, návody na provoz a údržbu, zaškolení personálu**	**34 dny**	**18.10. 16**	**20.11. 16**
13		**Zkoušky, atesty, certifikáty, revize, provozní řády**	**51 dny**	**11.10. 16**	**30.11. 16**
14		**Dokladová část**	**45 dny**	**17.10. 16**	**30.11. 16**
15		**Individuální a komplexní vyzkoušení prvků a zařízení**	**12 dny**	**9.11. 16**	**20.11. 16**
16		**Dokumentace skutečného provedení stavby**	**15 dny**	**16.11. 16**	**30.11. 16**
17		**Zpracování kusovníků prvků a zařízení**	**15 dny**	**16.11. 16**	**30.11. 16**
18					
19	**15193Y00**	**Stavební a montážní práce**	**231 dny**	**9.4. 16**	**25.11. 16**
20	**001**	**Technologická část pro obj. SO 01**	**72 dny**	**3.9. 16**	**13.11. 16**
21	002	PS 01.01 - Zdravotnická technologie	24 dny	21.10. 16	13.11. 16
22	003	PS 01.02 - Vzduchotechnika, chlazení	44 dny	19.9. 16	1.11. 16
23	004	PS 01.03 - Měření a regulace	38 dny	5.10. 16	11.11. 16
24	005	PS 01.04 - EPS	24 dny	19.9. 16	12.10. 16
25	**006**	**PS 01.05 - Čistá vestavba oper. sálů**	**65 dny**	**3.9. 16**	**6.11. 16**
26	001	Stavební část	48 dny	11.9. 16	28.10. 16
27	046	Ostatní činnosti	55 dny	3.9. 16	6.11. 16
28	**007**	**Technologická část pro obj. SO 02**	**100 dny**	**18.8. 16**	**25.11. 16**
29	008	PS 02.01 - Zdravotnická technologie	24 dny	2.11. 16	25.11. 16
30	009	PS 02.02 - Vzduchotechnika, chlazení	51 dny	18.8. 16	19.11. 16
31	010	PS 02.03 - Měření a regulace	41 dny	16.10. 16	25.11. 16
32	011	PS 02.04 - EPS	37 dny	19.9. 16	25.10. 16
33	**012**	**SO 01 Stavební úpravy části 4.NP budovy CH na OS**	**184 dny**	**29.4. 16**	**29.10. 16**
34	**013**	**Architekt.- stavební řešení**	**182 dny**	**29.4. 16**	**27.10. 16**
35	2	Práce HSV	125 dny	29.4. 16	31.8. 16
36	3	Práce PSV	124 dny	26.6. 16	27.10. 16
37	**014**	**Zdravotně technické instalace**	**72 dny**	**13.8. 16**	**23.10. 16**
38	**015**	**Ústřední vytápění a rozvody chladu**	**67 dny**	**6.8. 16**	**11.10. 16**
39	**016**	**Silnoproudé elektroinstalace**	**66 dny**	**13.8. 16**	**17.10. 16**
40	**017**	**Slaboproudé elektroinstalace**	**57 dny**	**3.9. 16**	**29.10. 16**
41	**018**	**Rozvody medicinálních plynů**	**48 dny**	**27.8. 16**	**13.10. 16**
42	**019**	**SO 02 Stavební úpravy části 7.NP budovy L na chirurg.JIP**	**231 dny**	**9.4. 16**	**25.11. 16**
43	**020**	**Architekt.- stavební řešení**	**231 dny**	**9.4. 16**	**25.11. 16**
44	2	Práce HSV	154 dny	9.4. 16	9.9. 16
45	3	Práce PSV	172 dny	7.6. 16	25.11. 16
46	**021**	**Zdravotně technické instalace**	**81 dny**	**28.8. 16**	**16.11. 16**
47	**022**	**Ústřední vytápění a rozvody chladu**	**72 dny**	**2.8. 16**	**12.10. 16**
48	**023**	**Silnoproudé elektroinstalace**	**70 dny**	**11.9. 16**	**19.11. 16**
49	**024**	**Slaboproudé elektroinstalace**	**62 dny**	**23.9. 16**	**23.11. 16**
50	**025**	**Rozvody medicinálních plynů**	**55 dny**	**3.9. 16**	**27.10. 16**

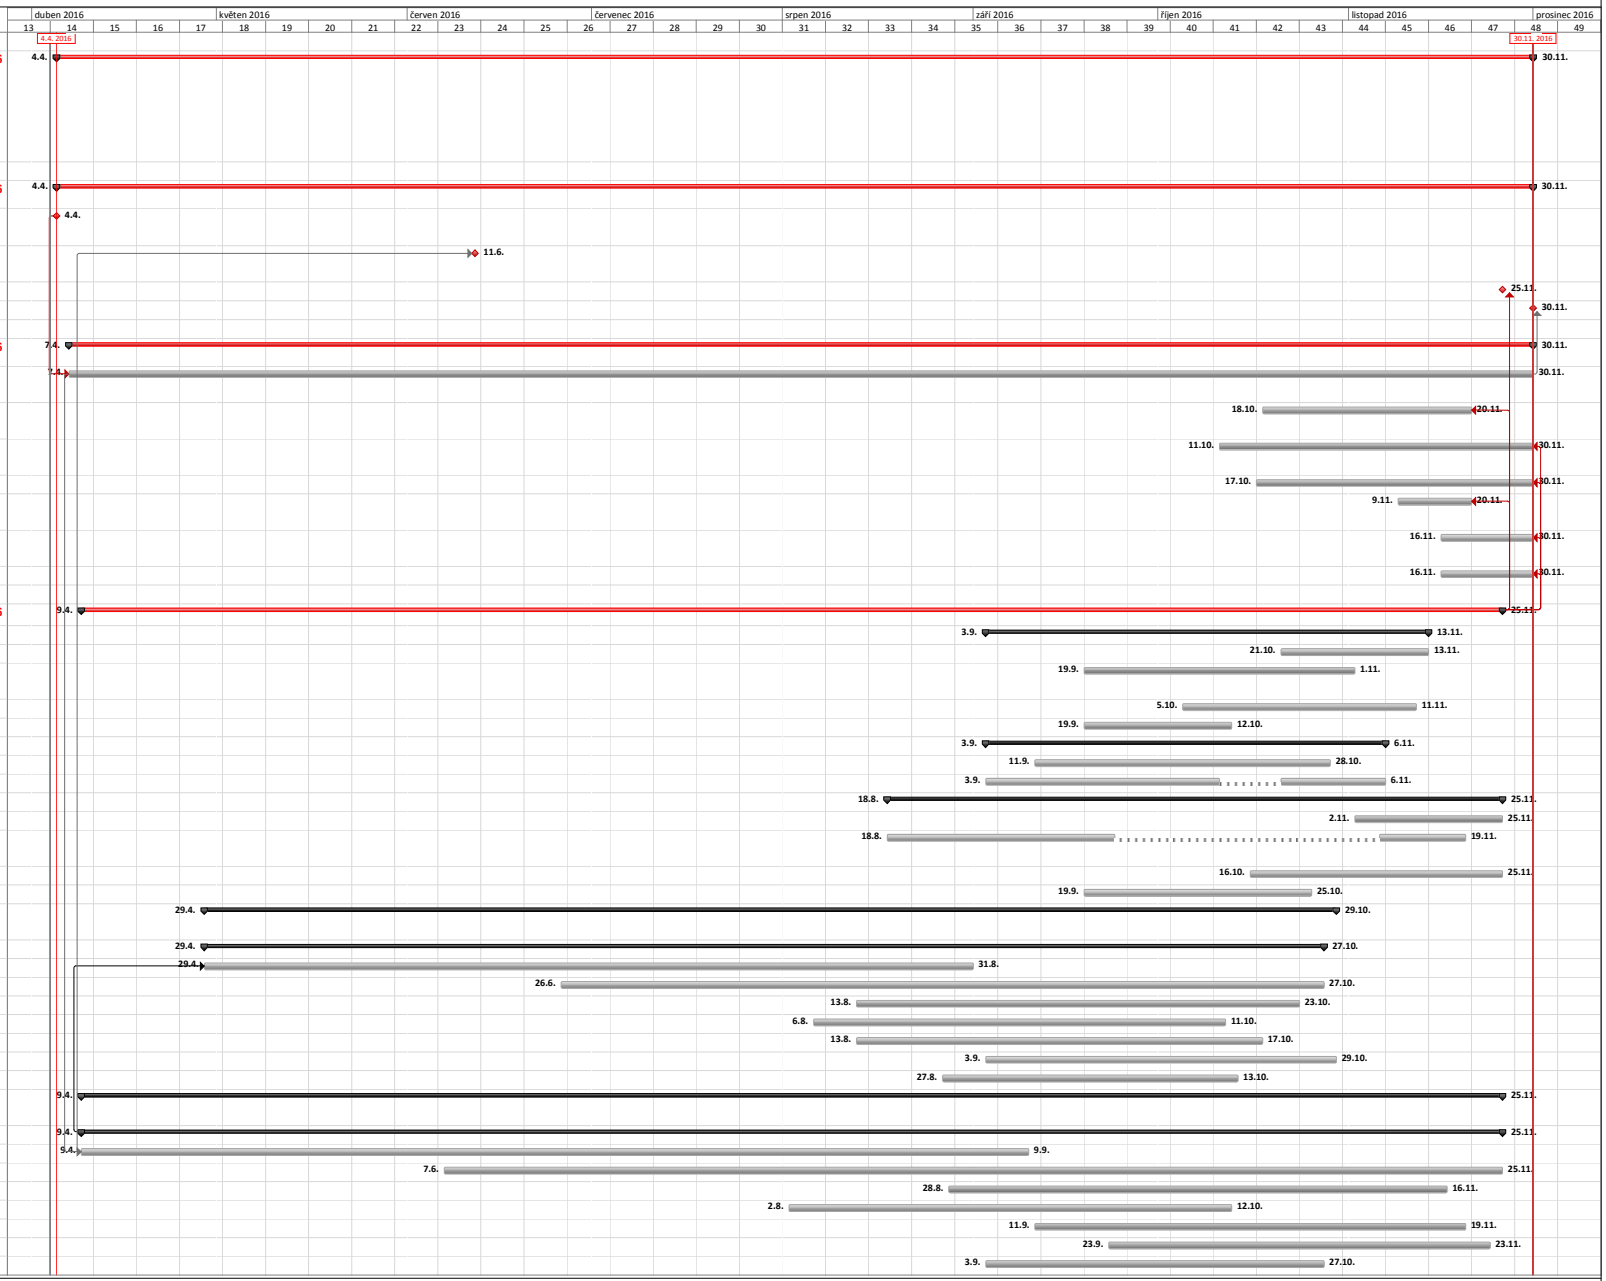

V Brně 02.03.2016
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
