ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	**Zahájení převzetí staveniště**	0 dny	6.8. 18	6.8. 18	
2	Převzetí prostor, pasportizace	7 dny	6.8. 18	12.8. 18	1
3	Zařízení staveniště, protiprašná opatření	28 dny	6.8. 18	2.9. 18	1
4	Demontáž stávajícího vybavení	42 dny	13.8. 18	23.9. 18	3SS+7 dny
5	Bourací práce - demontáže	83 dny	13.8. 18	3.11. 18	3SS+7 dny
6	Stavebně bourací práce	90 dny	20.8. 18	17.11. 18	5SS+7 dny
7	Nové zdivo, zazdívky, příčky, konstrukce	120 dny	27.8. 18	24.12. 18	6SS+7 dny
8	Repase stávajících truhl. a zámeč. prvků	200 dny	10.9. 18	28.3. 19	7SS+14 dny
9	Rozvody profesí	100 dny	17.9. 18	25.12. 18	7SS+21 dny
10	Omítky - opravy, nové omíky	120 dny	8.10. 18	4.2. 19	9SS+21 dny
11	Konstrukce podlah	90 dny	15.10. 18	12.1. 19	10SS+7 dny
12	Konstrukce SDK	90 dny	29.10. 18	26.1. 19	11SS+14 dny
13	Obklady, dlažby	90 dny	5.11. 18	2.2. 19	11SS+21 dny
14	Malby, nátěry	90 dny	19.11. 18	16.2. 19	13SS+14 dny
15	Povlakové krytiny	100 dny	10.12. 18	19.3. 19	14SS+21 dny
16	Truhl. a zámečn. Kce nové i repasované	100 dny	10.12. 18	19.3. 19	14SS+21 dny
17	Vánoční svátky	11 dny	22.12. 18	1.1. 19	
18	Profese - kompletace	100 dny	10.12. 18	19.3. 19	14SS+21 dny
19	Revize, seřízení, zaregulování	70 dny	19.1. 19	29.3. 19	18SS+40 dny
20	technické plyny	110 dny	10.12. 18	29.3. 19	18SS
21	Laboratorní vybavení - výroba	120 dny	15.11. 18	14.3. 19	22SS-35 dny
22	Laboratorní vybavení - montáž, dopojování	100 dny	20.12. 18	29.3. 19	18SS+10 dny
23	Dokončovací práce	90 dny	31.12. 18	30.3. 19	18SS+21 dny
24	Úklid a drobné opravy, příprava k přejímce	83 dny	10.1. 19	2.4. 19	23SS+10 dny
25	**Předání stavby.**	0 dny	3.4. 19	3.4. 19	24FS+1 den

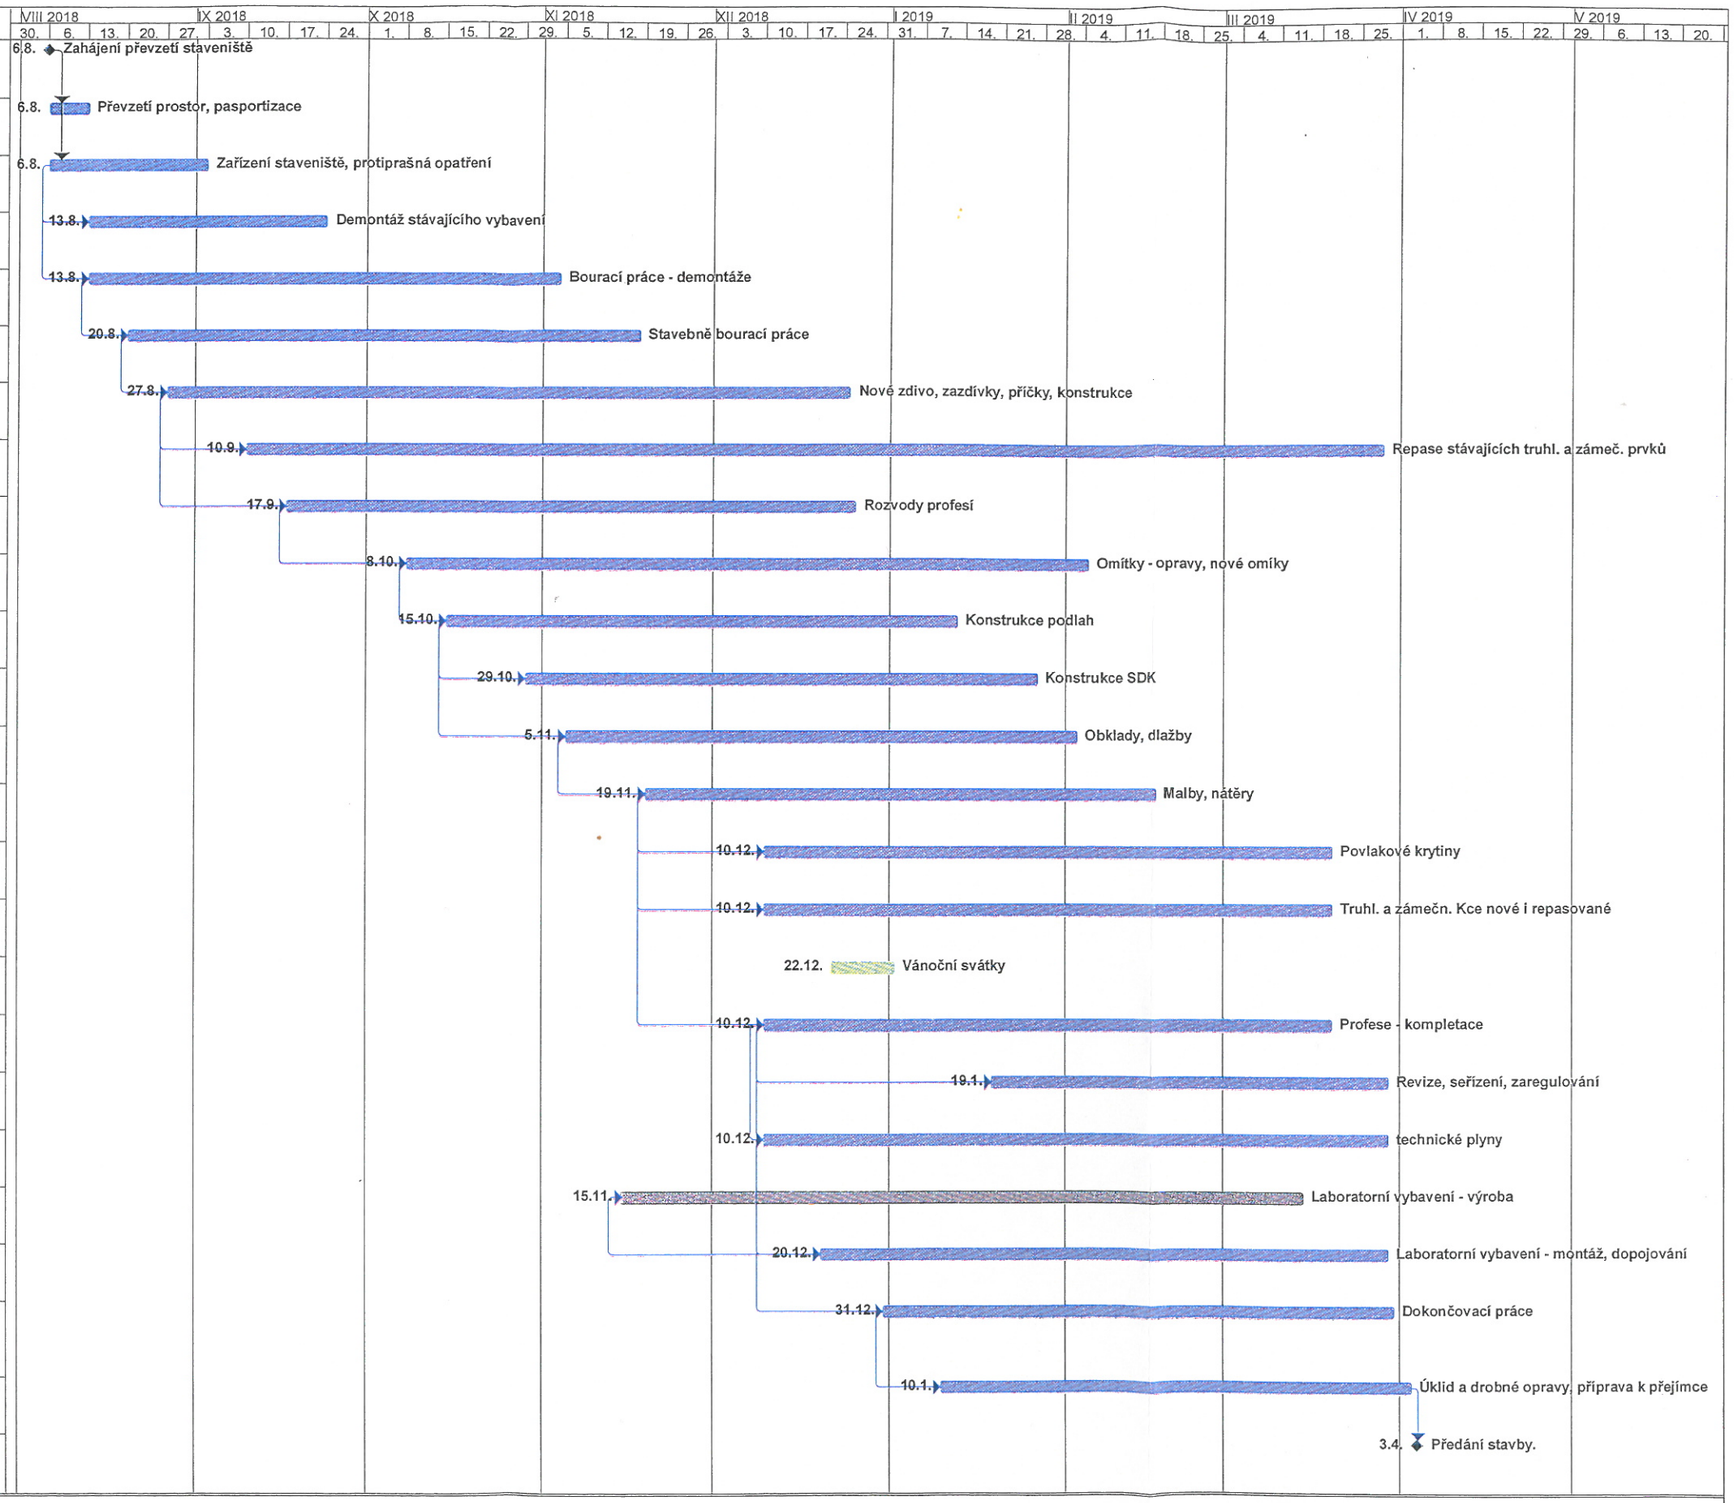

Rekonstrukce laboratoří 2018/2019
VŠCHT PRAHA - INFRASTRUKTURA

Úkol	Zahrnutý průběh	Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Milník	Rozdělení	Neaktivní milník	Ruční souhrn
Souhrnný	Vnější úkoly	Neaktivní souhrn	Pouze zahájení
Zahrnutý úkol	Souhrn projektu	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení
Zahrnutý milník	Seskupit podle souhrnu	Pouze s dobou trvání	Průběh
