ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1					
2	**Liliová dokončení**	**178 dny**	**26.10. 17**	**29.6. 18**	
3					
4	**1.PP**	**111 dny**	**22.1. 18**	**22.6. 18**	
5	Rozvody ELE	30 dny	22.1. 18	2.3. 18	
6	Kompletace ELE	20 dny	3.4. 18	27.4. 18	
7	Schodiště restaurování	40 dny	17.4. 18	11.6. 18	
8	Kamenické práce	30 dny	5.4. 18	15.5. 18	
9	Malby	14 dny	30.4. 18	17.5. 18	6
10	Dokončovací práce,úklid	30 dny	14.5. 18	22.6. 18	
11					
12	**1.NP**	**163 dny**	**26.10. 17**	**8.6. 18**	
13	Rozvody ELE,MaR,ZTI…	75 dny	26.10. 17	7.2. 18	
14	Opravy omítek	60 dny	13.11. 17	2.2. 18	
15	Hrubé podlahy	64 dny	1.12. 17	28.2. 18	
16	Vchodové dveře	3 dny	25.5. 18	29.5. 18	
17	Malby	14 dny	30.4. 18	17.5. 18	
18	Kamenické práce	30 dny	12.3. 18	19.4. 18	
19	Obklady+dlažby	24 dny	5.3. 18	5.4. 18	
20	Dřevěné podlahy	20 dny	27.4. 18	24.5. 18	
21	Dveře+Truhl.prv.	11 dny	14.5. 18	28.5. 18	
22	Repas vrata	20 dny	30.4. 18	25.5. 18	
23	Dlažby kamenné	20 dny	6.4. 18	2.5. 18	
24	Dveře VIZE	5 dny	4.6. 18	8.6. 18	
25	Restaurování maleb	75 dny	4.12. 17	16.3. 18	
26	**Kompletace**	**20 dny**	**10.5. 18**	**6.6. 18**	
27	ELE	20 dny	10.5. 18	6.6. 18	
28	ZTI	20 dny	10.5. 18	6.6. 18	
29	Ost.	20 dny	10.5. 18	6.6. 18	
30	**Výměna oken archiv**	20 dny	23.4. 18	18.5. 18	
31					
32	**2.NP**	**145 dny**	**4.12. 17**	**21.6. 18**	
33	Hrubé podlahy	46 dny	14.12. 17	15.2. 18	
34	Opravy omítek+štuky	30 dny	14.2. 18	27.3. 18	
35	Malby	30 dny	28.3. 18	7.5. 18	
36	Kamenické práce	21 dny	27.3. 18	23.4. 18	
37	Obklady+dlažby	30 dny	15.3. 18	24.4. 18	
38	Dřevěné podlahy	14 dny	5.4. 18	23.4. 18	
39	Dveře+Truhl.prv	14 dny	23.4. 18	10.5. 18	
40	Restaur malby	90 dny	4.12. 17	6.4. 18	
41	**Kompletace**	**39 dny**	**30.4. 18**	**21.6. 18**	
42	ELE	20 dny	30.4. 18	25.5. 18	
43	ZTI	20 dny	30.4. 18	25.5. 18	
44	Ost.,úklid	20 dny	25.5. 18	21.6. 18	
45					
46	**3.NP**	**146 dny**	**1.12. 17**	**21.6. 18**	
47	Hrubé podlahy	50 dny	1.12. 17	8.2. 18	
48	Opravy omítek+štuky	20 dny	22.2. 18	21.3. 18	
49	Malby	30 dny	22.3. 18	1.5. 18	
50	Kamenické práce	21 dny	26.3. 18	20.4. 18	
51	Obklady+dlažby	20 dny	1.3. 18	28.3. 18	
52	Dřevěné podlahy	25 dny	29.3. 18	1.5. 18	
53	Dveře+Truhl.prv.	19 dny	23.4. 18	17.5. 18	
54	Restaurování malby	65 dny	8.1. 18	6.4. 18	
55	**Kompletace**	**39 dny**	**30.4. 18**	**21.6. 18**	
56	ELE	20 dny	30.4. 18	25.5. 18	
57	ZTI	20 dny	30.4. 18	25.5. 18	
58	Ost,úklid	20 dny	25.5. 18	21.6. 18	
59					
60	**2.NP Archiv**	**74 dny**	**21.3. 18**	**29.6. 18**	
61	Stěhování	14 dny	21.3. 18	8.4. 18	
62	Bourací práce	20 dny	9.4. 18	4.5. 18	61
63	Výměna oken	5 dny	12.4. 18	18.4. 18	
64	Rozvody ELE+ Mar+ ZTI	20 dny	30.4. 18	25.5. 18	
65	Hrubé podlahy	10 dny	30.5. 18	12.6. 18	64
66	Opravy omítek	20 dny	31.5. 18	27.6. 18	
67	Malby	15 dny	30.4. 18	18.5. 18	
68	Dlažby	15 dny	11.6. 18	29.6. 18	
69	Dveře+Truhl.prv.	7 dny	18.6. 18	26.6. 18	
70	**Kompletace**	**15 dny**	**11.6. 18**	**29.6. 18**	
71	ELE	10 dny	11.6. 18	22.6. 18	
72	ZTI	10 dny	11.6. 18	22.6. 18	
73	Ost.	10 dny	18.6. 18	29.6. 18	
74					
75	**4NP+střecha**	**156 dny**	**6.11. 17**	**8.6. 18**	
76	Úprava krovu	65 dny	6.11. 17	2.2. 18	
77	Ztužení krovu	10 dny	23.1. 18	5.2. 18	
78	Protipož.nátěr.	8 dny	26.2. 18	7.3. 18	
79	Montáže komínů	30 dny	18.1. 18	28.2. 18	
80	VZT+ZTI do komínů	12 dny	29.1. 18	13.2. 18	
81	Zateplení střechy	20 dny	5.2. 18	2.3. 18	
82	Krytina	20 dny	9.3. 18	5.4. 18	
83	Hrubé podlahy	25 dny	12.3. 18	12.4. 18	
84	Rozvody ZTI+ELE+MAR+VZT	14 dny	30.4. 18	17.5. 18	
85	Okna	10 dny	19.3. 18	30.3. 18	
86	SDK+obklad aku	30 dny	30.4. 18	8.6. 18	
87	VZT strojovna	35 dny	16.4. 18	1.6. 18	
88	Malby	14 dny	21.5. 18	7.6. 18	17
89	Schodiště	27 dny	23.4. 18	29.5. 18	
90	Palubkové podlahy	24 dny	23.4. 18	24.5. 18	
91	Dveře+truhl.prv.	12 dny	24.5. 18	8.6. 18	
92	**Kompletace**	**14 dny**	**11.5. 18**	**30.5. 18**	
93	ELE	14 dny	11.5. 18	30.5. 18	
94	ZTI	14 dny	11.5. 18	30.5. 18	
95	Ost.	14 dny	11.5. 18	30.5. 18	
96	Akustické prvky	14 dny	11.5. 18	30.5. 18	
97					
98	**Fasády**	**66 dny**	**2.4. 18**	**29.6. 18**	
99	Dokončení fasád+ nátěr antigraf.	40 dny	7.5. 18	29.6. 18	
100	Kamenické práce	30 dny	2.4. 18	10.5. 18	
101	Podání žádosti o kolaudaci	1 den	27.6. 18	27.6. 18	
102	**Kolaudace**	21 dny	2.7. 18	30.7. 18	

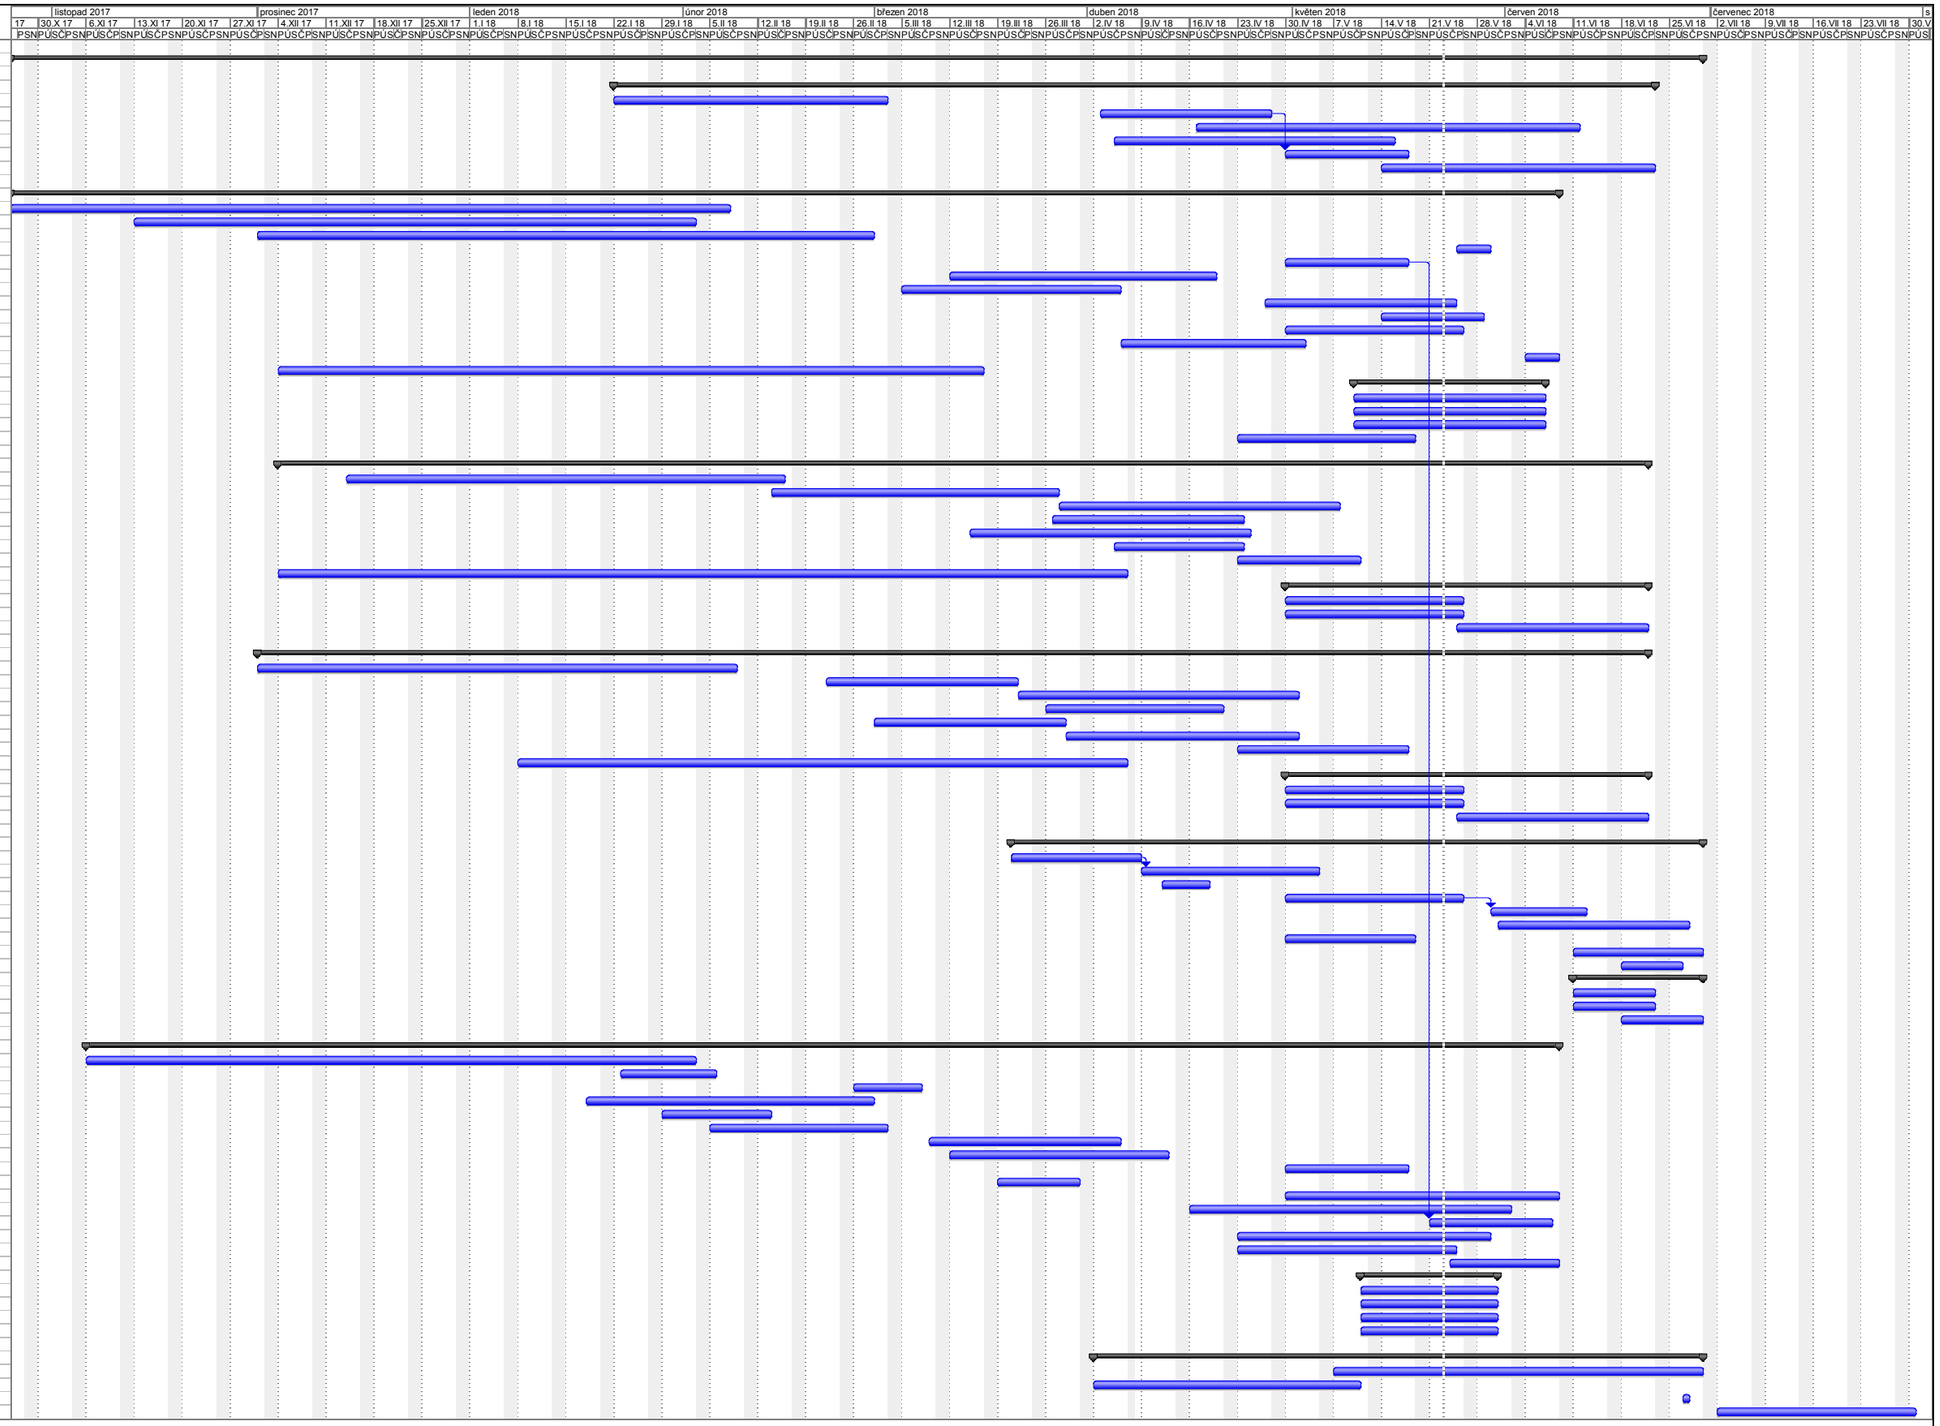

Projekt: MSProj11
Datum: 23.5. 18

Úkol | Rozdělení | Průběh | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín
