ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení
1	III_3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č. 3275-2 přes potok Klejnarku za Starým Kolínem	09.11. 18	15.12. 18
2	Bednění mostovky	09.11. 18	15.11. 18
3	Armatura mostovky	15.11. 18	20.11. 18
4	Betonáž mostovky	20.11. 18	21.11. 18
5	Předpětí	26.11. 18	26.11. 18
6	Armatura příčníků a závěrných zídek	27.11. 18	28.11. 18
7	Bednění závěrných zídek	29.11. 18	29.11. 18
8	Betonáž závěrných zídek	30.11. 18	30.11. 18
9	Odbednění Závěrných zídek	03.12. 18	03.12. 18
10	Izolace pod římsy	22.11. 18	22.11. 18
11	Armatura říms NK	23.11. 18	26.11. 18
12	Bednění říms NK	23.11. 18	26.11. 18
13	Betonáž říms NK	26.11. 18	27.11. 18
14	Armatura říms PO	04.12. 18	05.12. 18
15	Bednění říms PO	06.12. 18	06.12. 18
16	Betonáž říms PO	07.12. 18	07.12. 18
17	Zásypové práce II.st. + podklad	04.12. 18	08.12. 18
18	Přechodové desky	07.12. 18	08.12. 18
19	Pečetící vrstva	06.12. 18	06.12. 18
20	Izolace mostovky	07.12. 18	08.12. 18
21	Izolace přechodové desky	08.12. 18	09.12. 18
22	Živičné vrstvy	11.12. 18	14.12. 18
23	Osazení zábradlí	13.12. 18	15.12. 18

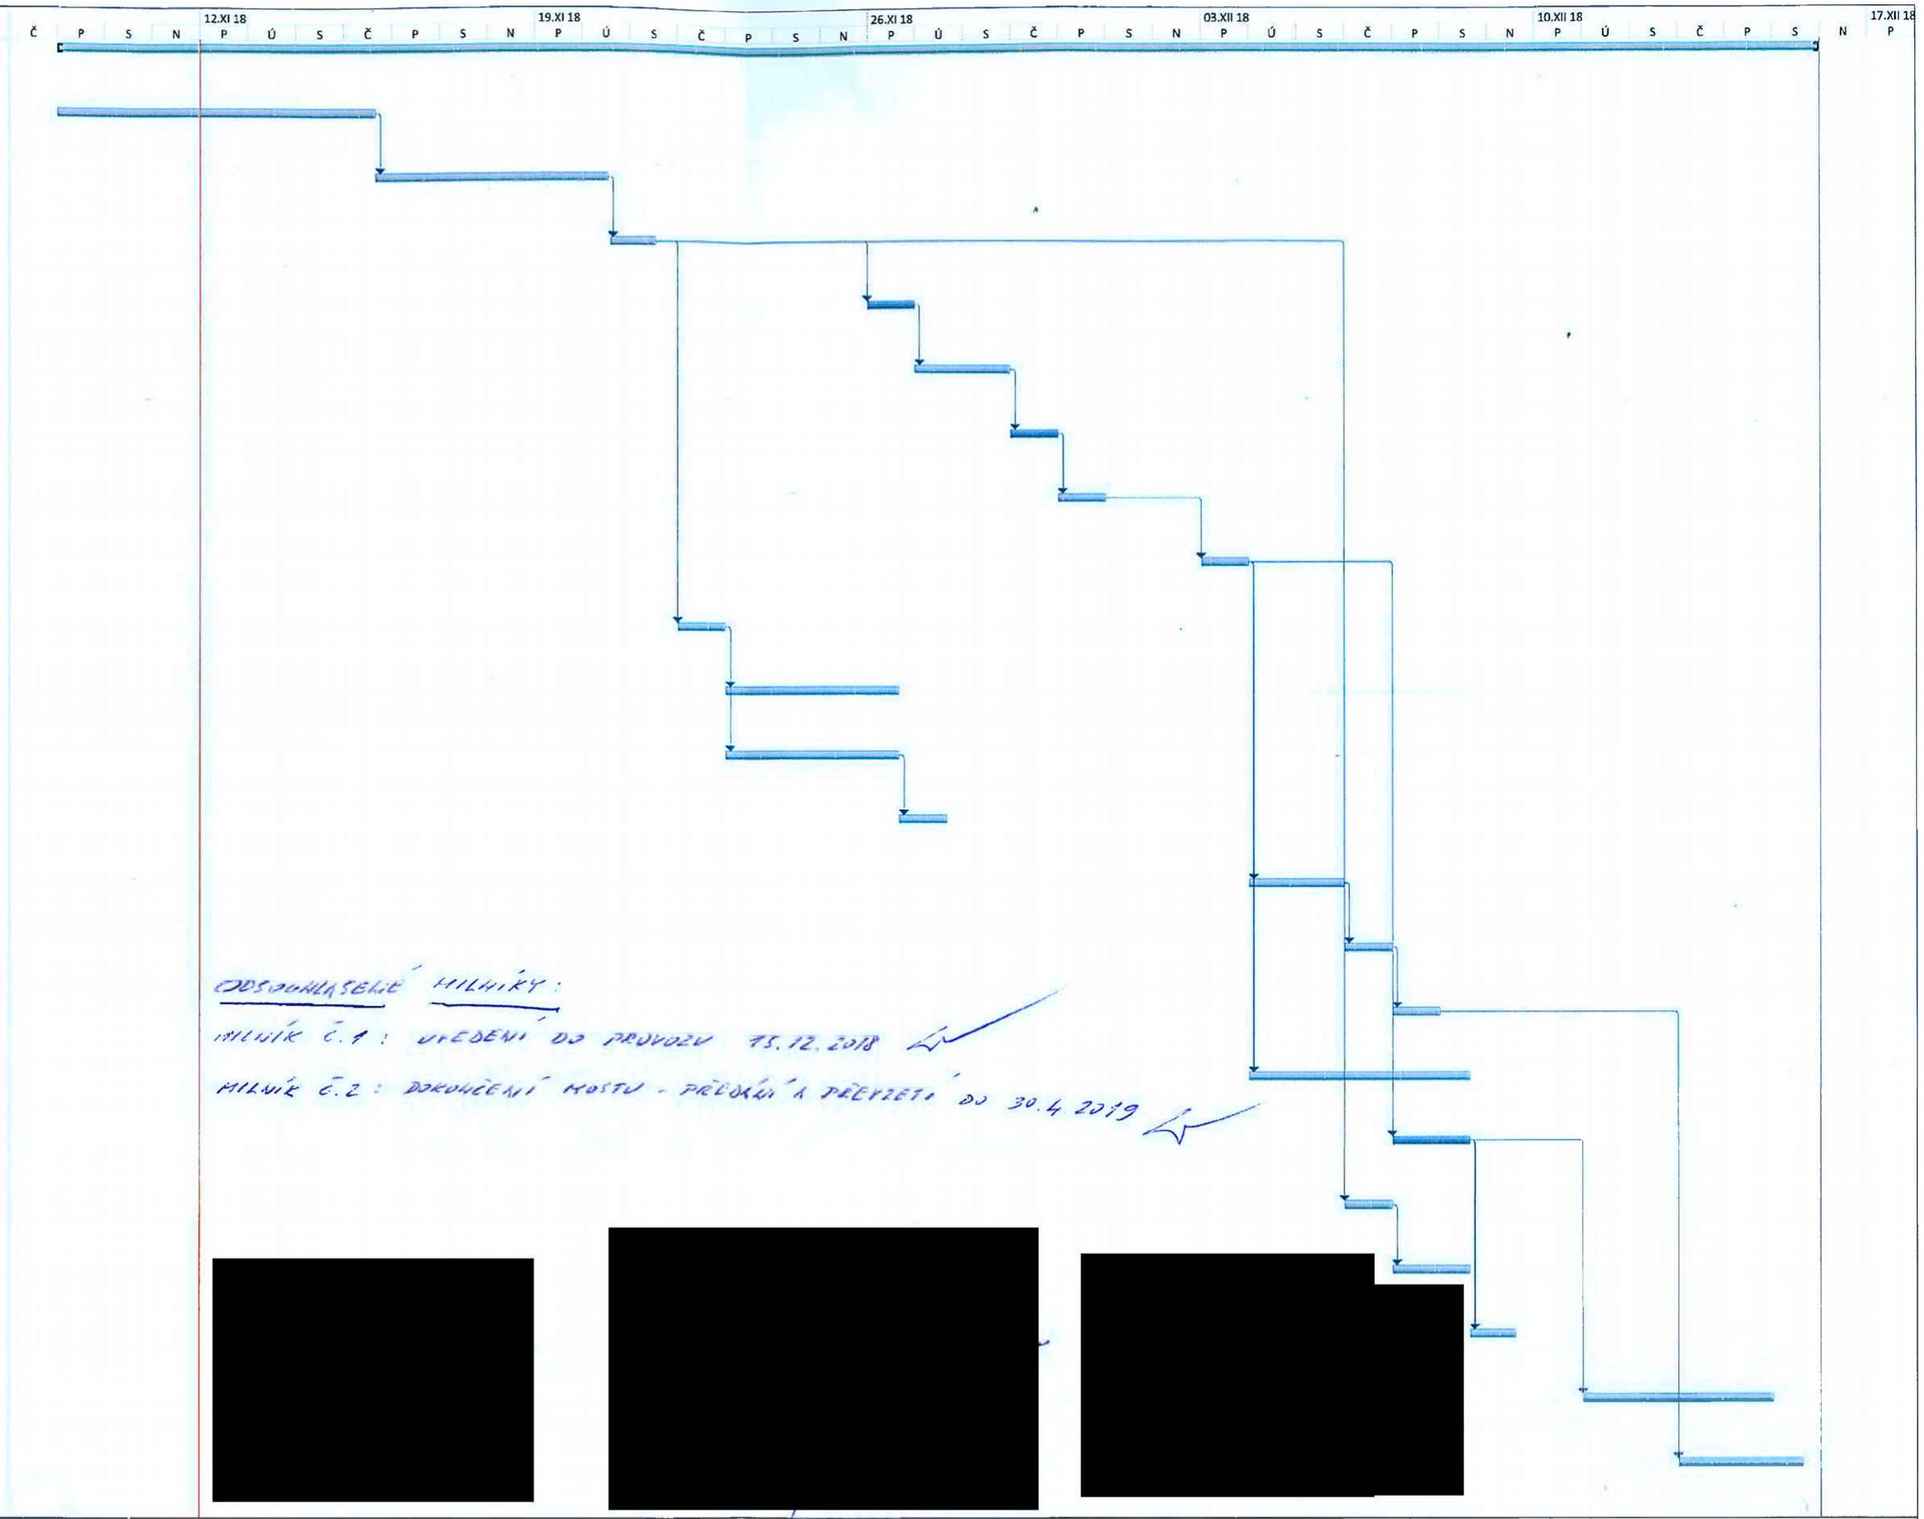

ODSOUHLASENÉ MILNÍKY:

MILNÍK Č.1: UVEDENÍ DO PROVOZU 15.12.2018

MILNÍK Č.2: DOKONČENÍ MOSTU - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DO 30.4.2019

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Projekt: STARÝ Kolín HMG_9_11_
Datum: 12.11. 18

Úkol		Souhrnný		Vnější milník		Neaktivní souhrn		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení	
Rozdělení		Souhrn projektu		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Vnější úkoly		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Průběh	
