



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO
"II/605 Rokycany, ul. Plzeňská"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001353

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500010181

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Froněk, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 15879, oddíl C vedenou u MS v Praze

sídlo: Zátíší 24488, 269 01 Rakovník

zastoupená: Ing. Kamil Hrbek, prokurista

IČO: 47534630 DIČ: CZ47534630

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: xjw69sn

kontaktní osoba: Ing. Kamil Hrbek, tel. [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ----

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 11. 07. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/605 Rokycany, ul. Plzeňská (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

I. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO RO-Plzeňská-2025. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 219 923,30 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 695 799,19 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 5 416 040,90 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 1 475 875,89 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 3 940 165,01 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

II. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

III. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

objednatel:


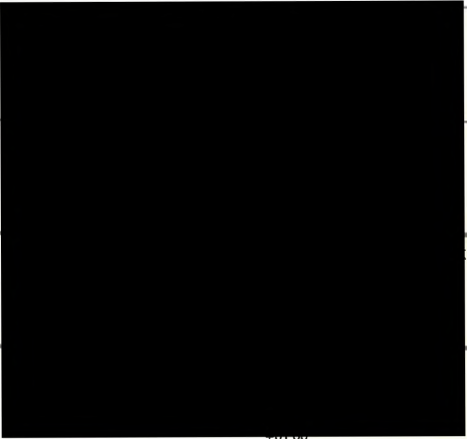



zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Froněk, spol. s r.o.
Ing. Kamil Hrbek
prokurista
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: 


Změnový list č.1

| | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------------|
| Předmět díla: | II 605 Rokycany, Pízeňská ul. | | | |
| Objekt: | RO Pízeňská 2025 | | | |
| Objednatel: | Správa a údržba silnic Pízeňského kraje p.o., Kolerovská 162, 326 00 Pízeň | | | |
| Zhotovitel: | FRONĚK, spol. s r.o., Zátuší 2488, 269 01 Rakovník | | | |
| TDS: | Pk dopravní s.r.o., Luděk Menzl | | | |
| Projektant: | Zřitek – IP projekt s.r.o. | | | |
| Popis změny: • Po provedení odfrézování komunikací ul. Pízeňská a Štáhlavská nebyly zjištěny poruchy v podloží, jak byly odhadnuty v PD. Bylo rozhodnuto o neprovedení sanací v takovém rozsahu. Změna bude řešena podle odst. 6 § 222 zák. 134/2016. • Po odfrézování a prohlídce byly určeny místa oprav žulových obrubníků, výměně porušených poklopů kanalizačních šachet a výměny vodovodních hmků. Změna bude řešena podle odst. 6 § 222 zák. 134/2016. | | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | Zhotovitel, objednatel | | |
| | Jedná se o změnu: | změna bude řešena podle odst. 6 § 222 zák. 134/2016 | | |
| | Způsob projekčního řešení změny: | zápisy do SD, zápisy z KD, fotodokumentace, zaměření | | |
| údaje o ceně díla | ocenění změny předložit: Zhotovitel | Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH | | |
| | náklady na změnu bez DPH | -1 475 875,89 Kč | | |
| | Výše DPH sazba: 21% | -309 933,94 Kč | | |
| | náklady na změnu vč. DPH | -1 785 809,83 Kč | | |
| | Cena díla bez DPH (dle SOD) | 5 416 040,90 Kč | | |
| | Cena po přechozích dodatcích bez DPH | 5 416 040,90 Kč | | |
| | Cena díla po dodatku č.1 bez DPH | 3 940 165,01 Kč | | |
| Cena díla po dodatku č.1 vč. DPH | 4 767 599,86 Kč | | | |
| Změny | Méněpráce celkem bez DPH | -1 695 799,19 Kč | -1 475 875,89 Kč | Celková hodnota změny bez DPH |
| | Vícepráce celkem bez DPH | 219 923,30 Kč | | |
| | Koeficient "K" dle SOD | 0,86 | | |
| Termín | Vliv změny na termín dokončení díla: | žádný | | |
| Odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | podpis | |
| | Zhotovitel:  | 12.11.2025 |  | |
| | Objednatel:  | | | |
| | TDS objednatel:  | | | |
| | AD objednatel:  | | | |
| | | | | |
| Přílohy | Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1 | | | |

Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1

Název díla: II-605 Rokycany, Písařská ul.

MĚNĚPRÁCE

objekt 80 1 Zemní práce

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdílné množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdílné celk. ceny Kč |
|------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | 113154626 | Fázování živičného krytu tl 70 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 | m2 | 887,000 | 317,700 | -569,300 | 188,00 | 122 406,00 | 43 842,80 | -78 563,40 |
| 3 | 113154528 | Fázování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 | m2 | 3 812,000 | 3467,200 | -144,800 | 114,80 | 414 857,60 | 398 034,56 | -16 623,04 |
| 4 | 113154580 | Přilepění za každých dalších 10 mm | m2 | 3 812,000 | 0,000 | -3 812,000 | 11,50 | 41 538,00 | 0,00 | -41 538,00 |
| 6 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 6,000 | 0,000 | -6,000 | 400,00 | 2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| 7 | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 8,000 | 0,000 | -8,000 | 450,00 | 3 600,00 | 0,00 | -3 600,00 |
| 8 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tráv ze 3 volně ložených kabelů | m | 10,000 | 0,000 | -10,000 | 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| 9 | 122252203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně | m3 | 272,460 | 0,000 | -272,460 | 325,00 | 88 549,50 | 0,00 | -88 549,50 |
| 10 | 122452203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně | m3 | 181,840 | 0,000 | -181,840 | 325,00 | 59 033,00 | 0,00 | -59 033,00 |
| 11 | 182701110R | Vodorovné přemísění výkopku/sypanky z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti cíle možností zhotovitelné se složením | m3 | 454,100 | 0,000 | -454,100 | 261,00 | 118 520,10 | 0,00 | -118 520,10 |
| 12 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 817,380 | 0,000 | -817,380 | 220,00 | 179 823,60 | 0,00 | -179 823,60 |
| 13 | 181951112 | Úprava písně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně | m2 | 478,000 | 0,000 | -478,000 | 25,00 | 11 950,00 | 0,00 | -11 950,00 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | -605 200,64 |

objekt 80 3 Svislé a kompletní konstrukce

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdílné množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdílné celk. ceny Kč |
|------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 14 | 359801212 | Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci | m | 20,000 | 0,000 | -20,000 | 350,00 | 7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | -7 000,00 |

objekt 80 5 Komunikace pozemní

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdílné množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdílné celk. ceny Kč |
|-----------------|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 16 | 564671011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 83-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm | m2 | 956,000 | 0,000 | -956,000 | 282,00 | 269 592,00 | 0,00 | -269 592,00 |
| 16 | 564871111 | Podklad ze štrkocitrně ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 478,000 | 0,000 | -478,000 | 282,00 | 134 796,00 | 0,00 | -134 796,00 |
| 17 | 564852111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm | m2 | 478,000 | 0,000 | -478,000 | 333,00 | 159 174,00 | 0,00 | -159 174,00 |
| 18 | 686156111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 409,000 | 317,700 | -91,300 | 314,00 | 128 426,00 | 99 757,80 | -28 668,20 |
| 19 | 585176113 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 120 mm š do 3 m | m2 | 478,000 | 0,000 | -478,000 | 539,00 | 257 642,00 | 0,00 | -257 642,00 |
| 21 | 572531122 | Ošetření třídní asfaltovou sanační hmotou tl přes 20 do 30 mm | m | 150,000 | 0,000 | -150,000 | 93,60 | 14 025,00 | 0,00 | -14 025,00 |
| 22 | 573231107 | Paštit živý spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 7 833,000 | 7252,100 | -380,900 | 13,00 | 99 229,00 | 94 277,30 | -4 951,70 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|----|-----------|----------|----------|--------|--------------|--------------------|------------|
| 23 | 576143221 | Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š přes 3 m | m2 | 3 612,000 | 3467,200 | -144,800 | 360,00 | 1 300 320,00 | 1 248 192,00 | -52 128,00 |
| 24 | 577155142 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 3 612,000 | 3467,200 | -144,800 | 295,00 | 1 065 540,00 | 1 022 824,00 | -42 716,00 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | -963 692,90 | |

objekt SO 8 Trubní vedení

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 27 | 899623161 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tl. C 20/25 v otevřeném výkopu | m3 | 6,500 | 0,000 | -6,500 | 4500,00 | 29 250,00 | 0,00 | -29 250,00 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | -29 250,00 | |

objekt SO 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 38 | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 249,000 | 48,900 | -200,100 | 150,00 | 37 350,00 | 7 335,00 | -30 015,00 |
| 39 | 58381007 | kostka šlapaná dlažební žula drobná 8/10 | m2 | 9,000 | 4,890 | -4,110 | 795,00 | 7 155,00 | 3 887,55 | -3 267,45 |
| 42 | 919721293 | Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií 100 kN/m | m2 | 409,000 | 297,000 | -112,000 | 110,00 | 44 990,00 | 32 670,00 | -12 320,00 |
| 45 | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za teple š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 350,000 | 0,000 | -350,000 | 55,00 | 19 250,00 | 0,00 | -19 250,00 |
| 46 | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 3 612,000 | 3467,200 | -144,800 | 5,00 | 18 060,00 | 17 336,00 | -724,00 |
| 47 | 938909311 | Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 3 612,000 | 3467,200 | -144,800 | 4,00 | 14 448,00 | 13 868,80 | -579,20 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | -66 155,65 | |

objekt VRN4 Inženýrská činnost

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|---|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 59 | 043154000 | Zkoušky hutníci | kus | 7,000 | 0,000 | -7,000 | 3500,00 | 24 500,00 | 0,00 | -24 500,00 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | -24 500,00 | |
| Celkový součet méněprací oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | -1 695 799,19 | |

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD
objekt SO 1 Zemní práce

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 5 | 113201112 | Výtrhání obrub silničních ležatých | m | 20,000 | 38,600 | 18,600 | 245,00 | 4 900,00 | 9 457,00 | 4 557,00 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | 4 557,00 | |

objekt SO 8 Trubní vedení

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|-----|-------|-------|-------|---------|-----------|------------------|----------|
| 25 | 899132121 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm | kus | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 6500,00 | 13 000,00 | 19 500,00 | 6 500,00 |
| 26 | 899132212 | Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového | kus | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 2600,00 | 7 800,00 | 13 000,00 | 5 200,00 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | 11 700,00 | |

| objekt SO 9 Ostaní konstrukce a práce | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|----|--------|---------|---------|-----------|------------|----------------------|------------|
| 40 | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 20,000 | 38,600 | 18,600 | 850,00 | 17 000,00 | 32 810,00 | 15 810,00 |
| 41 | 58380446 | obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm | m | 5,000 | 38,800 | 33,600 | 3900,00 | 19 500,00 | 150 540,00 | 131 040,00 |
| 43 | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm | m | 40,000 | 230,600 | 190,600 | 80,00 | 3 200,00 | 18 448,00 | 15 248,00 |
| 44 | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 40,000 | 230,600 | 190,600 | 99,00 | 3 960,00 | 22 829,40 | 18 869,40 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | 180 967,40 | |
| objekt VRN7 provozní vlivy | | | | | | | | | | |
| 63 | 07210300R | DIO - komplet všechny etapy, včetně mobilních SSZ dle návrhu | Kč | 1,000 | 1,100 | 0,100 | 226989,00 | 226 989,00 | 249 687,90 | 22 698,90 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | 22 698,90 | |
| Celkový součet víceprací oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | 219 923,30 | |
| Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | -1 475 875,89 | |
