

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Garáže odtahů v areálu SSHMP“ ze dne 21. 2. 2018

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy
příspěvková organizace
se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČ: 70 88 96 60
zastoupená ředitelem Mgr. Bohdanem Frajtem, MBA
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.
se sídlem Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989
zastoupená Lubomírem Červinským, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém „Formuláři pro ohlášení změn stavby“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.


II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle příloh č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 (Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV 6 a jeho příloh, ZBV 8 a jeho příloh, ZBV 9 a jeho příloh, ZBV 10 a jeho příloh, ZBV 13 a jeho příloh a ZBV 14 a jeho příloh) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 7 tohoto dodatku (Přehled víceprací a méněprací stavby). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla včetně dodatku č. 1 (18 650 584,47 Kč) a ceny dodatečně požadovaných prací (61 295,95 Kč bez DPH) a činí 18 711 880,42 Kč bez DPH.

III.



- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne*15. 11.*..... 2018



Správa služeb hlavního města Prahy,
příspěvková organizace

V Praze dne*20. 11.*..... 2018



Přílohy :

1. Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV6
2. Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV8
3. Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV9
4. Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV10
5. Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV13
6. Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV14
7. Přehled víceprací a méněprací stavby



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“
ZBV 6
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: číslo objednatele
 číslo zhotovitele

Termín plnění: do 30.12.2018

Cena díla dle základní SOD	: 18 149 603,1 Kč bez DPH
Cena díla včetně dodatku č. 1	: 18 650 584,47 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV6	: 41 058,82 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV6	: 18 691 643,29 Kč bez DPH

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989

Oprávněná osoba: [REDACTED]

Telefonní spojení: [REDACTED]

Popis předmětu informace:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na **výstavbě garážové haly pro odtahová vozidla**

Práce jsou prováděny podle PD a VV, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Dne 19.7. 2018 viz zápis z KD č. 4 bod P.4.1. zhotovitel vnesl doztaz mimo jiné ohledně způsobu provedení dilatací, pracovních a smršťovacích spar, které nebyli PD blíže specifikovány

Popis problému:

Dne 1.8. byl GP zaslán návrh způsobu provedení dilatací, pracovních a smršťovacích spar.



Návrh byl na KD č.7 dne 8.8.2018 odsouhlasen viz bod P.4.1.

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebně montážních prací. Zhotoviteli tyto skutečnosti v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyly a ani nemohly být známy. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné k provedení tohoto díla.

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV6

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:


„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“


nejpozději do: 30.11. 2018

Datum, podpis oprávněné osoby:

Datum potvrzení objednatele:

ZA ZHOTOVITELĚ





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17
Objekt: 06 - ZL 6 - Těsnění dilatačních spar

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.8.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				41 058,82
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				41 058,82
DPH základní	21,00%	ze	41 058,82	8 622,35
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	49 681,17

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 06 - ZL 6 - Těsnění dilatačních spar

Místo:

Datum:

30.8.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	41 058,82
HSV - Práce a dodávky HSV	41 058,82
32 - Zdi přehradní a opěrné	-3 027,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 086,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 058,82

ROZPOČET

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 06 - ZL 6 - Těsnění dilatačních spar

Místo:

Datum:

30.8.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 058,82

HSV - Práce a dodávky HSV

41 058,82

32 - Zdi přehradní a opěrné

-3 027,93

1	K	624631411	Vyplnění spar prefabrikovaných dílců těsnicím provazcem z polyetylénu tl do 20 mm	m	-15,000	24,29	-364,35
2	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	-15,000	168,56	-2 528,40
3	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm	m2	-2,650	51,01	-135,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 086,75

4	K	931994111	Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem - práce	m	125,000	126,13	15 766,25
			125		125,000		
5	M	931-01	ASS-350 řízená spára	m	10,000	440,70	4 407,00
6	M	931-02	ASS-200 řízená spára	m	2,000	422,50	845,00
7	M	931-03	ASS-150 řízená spára	m	6,000	400,40	2 402,40
8	M	931-04	AQUASTOP 2025 bentonitový pas	m	125,000	115,70	14 462,50
			125		125,000		
9	M	931-05	Upevňovací mřížka	m	125,000	20,80	2 600,00
10	M	931-06	Quelbandkleber	ks	22,000	163,80	3 603,60

ARA spol. s r.o.

Na Příkopě 391/7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

STAVBA : Garáže odtahů v areálu SSHMP

Kontrolní den	datum	místo	fáze	Zapsal
KD č 7	8.8.2017	na stavbě	realizace stavby	

ROZDĚLOVNÍK

Funkce - název firmy	jméno	telefon	mail
Investor – SSHMP			
Zhotovitel – Raeder-Falge			
Zhotovitel - Raeder-Falge			
Zhotovitel - Raeder-Falge			
Projektant – ANIMO			
TDI - ARA			
BOZP KOO - Profiodpady			

OBECNÉ INFORMACE

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
1.	Předání staveniště 4.6.2017 – zápis proveden samostatně		
2.	Zápis do SD bude veden průběžně		průběžně
3.	Zhotovitel pořídí kopie SD a zašle je všem zúčastněným mailem – průběžně 1 x týdně		průběžně
4.	Kontrola zápisu z minulého KD – bez připomínek		průběžně
5.	Kontrola SD – bez připomínek		průběžně

KONTROLA POSTUPU PRACÍ

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	<u>Provádí se :</u> - Obvodové zdivo		

STAVBA

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
S.1.1.	<u>Úkoly GD – předání staveniště :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Požadavky na zábor veř komunikace – trvá průběžně • KZP – zhotovitel nepředložil – trvá průběžně 		
S.1.4.	Posouzení zeminy ke zpětnému zásypu bude provedeno na základě posouzení geologa GD – trvá, posouzení bude provedeno geologem do příštího KD, Dne 24.7.2018 se geolog dostavil na stavbu, posoudil základovou spáru pro opěrnou stěnu v místě provedeného výkopu a vyhodnotil vytěženou zeminu z hlediska možnosti jejího dalšího použití. Geolog vyhotoví zápis o kontrole základové spáry a vypracuje technologický postup prací pro provádění zpětných zásypů. Dne 30.7.2018 geolog zaslal technologický postup a posouzení základové spáry pro 1. část opěrné stěny. GD, TDI a GP se vyjádří. Technologický postup odsouhlasen, nutno dodržet všechny podmínky stanovené pro podmíněčné použití vytěžených zemin. Vyhodnocení a provedení ověřovacího hutního pokusu provede GD za účasti geologa a TDI.		
S.1.9.	GD zaslal k odsouhlasení výrobní dokumentaci RH – schválí GP a TDI – úkol trvá, GP zašle schema rozvaděče, GP zaslal mailem návrh, GD se vyjádří – trvá. GD souhlasí a současně upozorňuje, že budoucí soudobý odběr zásuvkových rozvodnic je jištěn hodnotu 16A resp. 25A v hlavním rozvaděči. TDI upozorňuje na nedostatky v projektu elektro týkající se výpočtu bilance instalovaných zařízení v požadavku na instalovaný a soudobý výkon v návaznosti na navržené jištění a žádá GP o vyjasnění. Projektant elektro předloží aktualizaci PD.		
S.2.2.	Přípojky : GD předloží zaměření skutečného provedení včetně křížení s ostatními sítěmi, revize a tlakové zkoušky pro plyn a vodovod - trvá		
S.4.1.	Při odtěžení zemního tělesa pro opěrnou zeď bylo znečištění navážkami s příměsí odpadu (beton, hadry, plast, železo, cihly, dlaždice ...) – dále se sleduje		

S.4.3.	GD provedl zkoušku únosnosti pláně pod deskou, bylo dosaženo požadavku v PD, protokol bude předložen - úkol trvá		
S.6.1.	V průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že dojde ke kolizi výkopu se vzrostlým stromem. Tato situace vyžaduje projednání s OŽP – povolení kácení. Z předložené dokumentace není zřejmé zda kácení tohoto stromu je povoleno. Úkol GP. GP sdělil, že se jedná o lípu s obvodem kmene 233 cm, průměr cca 75 cm. Tento strom nebyl povolen ke kácení. Nutno podat dodatečnou žádost. Dále bylo dohodnuto, že žádost podá investor přímo na místní OŽP.		

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
P.1.1.	GP bude vést seznam změn a dodatků PD - trvá		průběžně
P.4.1.	GD vznáší dotaz ohledně nesrovnalostí v PD opěrné zdi (koty, tvar konstrukce, navržené skladby a dilatace, drenáž - zaústění ...) GP předložil úpravu dokumentace, která nesrovnalosti odstranila. Zbývá rozhodnutí o způsobu utěsnění dilatačních spár. GP zaslal návrh pro utěsnění dilatačních a smršťovacích spár. Návrh byl odsouhlasen. GD provede ocenění.		
P.5.1.	Na základě požadavku GD byla vypracována změna stavby před dokončením, která řeší změnu tvaru retenčních nádrží. Důvodem je dlouhá dodací doba nádrží dle původního návrhu. GD změnu projedná na vlastní náklad se stavebním úřadem, změna nemá vliv na cenu díla. GD podal žádost o změnu stavby před dokončením - trvá		

ZMĚNY VCP - MNP			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	GD bude vést přehledný soupis změnových listů <u>Náležitosti změnového listu :</u> <ul style="list-style-type: none"> • zdůvodnění – krycí list • vyjádření GP a TDI • podrobný položkový rozpočet • vyznačení v PD 		

	• fotodokumentace z realizace		
Z.2.1.	ZL 2 – asfaltové vrstvy (viz bod S.1.8.)		
Z.2.2.	ZL 3 – úprava založení (viz bod S.1.5.)		
Z.3.1.	ZL 4 – sanace základové spáry (viz bod S.3.1.)		
Z.7.1.	ZL 5 – Kontaminace vytěžených zemin (viz bod S.4.1.)		
Z.7.2.	ZL 6 – Těsnění dilatačních spár (P.4.1.)		

HARMONOGRAM

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
H.7.1.	HMG aktualizace 20.6.2018 s termínem dokončení a předání stavby k datu 30.12.2018. – doposud nejsou dokončeny výkopy pro opěrnou zeď a dále nejsou zahájeny navazující práce. Zhotovitel předloží aktualizovaný harmonogram na příštím KD. GD předložil nový HMG. Došlo k úpravě termínů provádění dílčích prací. Termín dokončení díla zůstává beze změny. TDI se vyjádří. HMG odsouhlasen.		

	Přílohy :		
	Příští KD č. 8 : 16.8.2018 v 10.00 hod,		16.8.2018

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 1. srpna 2018 19:07
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Opěrná zeď těsnění
Přílohy: opěrná zeď těsnění.pdf

Dobrý den,

v příloze posílám detaily provedení těsnění v opěrné zdi

Přeji hezký zbytek dne

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“
ZBV 8
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: číslo objednatele
číslo zhotovitele

Termín plnění: do 30.12.2018

Cena díla dle základní SOD	: 18 149 603,1 Kč bez DPH
Cena díla včetně dodatku č. 1	: 18 650 584,47 Kč bez DPH
Cena díla včetně ZBV6	: 18 691 643,29 Kč bez DPH
Cena méněprací dle ZBV8	: - 64 130,19 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV8	: 18 627 513,10 Kč bez DPH

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989

Oprávněná osoba: [REDACTED]

Telefonní spojení: [REDACTED]

Popis předmětu informace:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na **výstavbě garážové haly pro odtahová vozidla**

Práce jsou prováděny podle PD a VV, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zhotovitel navrhl v rámci méněprací provést hydroizolace opěrných zdí pouze v jedné vrstvě.

Popis problému:

Vzhledem k úspoře času a financí zhotovitel vznesl návrh na provedení pouze jedné vrstvy hydroizolace OPZ. Zápisem z KD č.8 ze dne 23.8. bod S.8.3. byl návrh schválen a následně dle návrhu provedena pouze jedna hydroizolační vrstva místo 2 vrstev jak bylo uvedeno PD a



VV.

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV8

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:




„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“

nejpozději do: 30.11. 2018

Datum, podpis oprávněné osoby:

Datum potvrzení objednatele:

Za ZHOTOVITELĚ

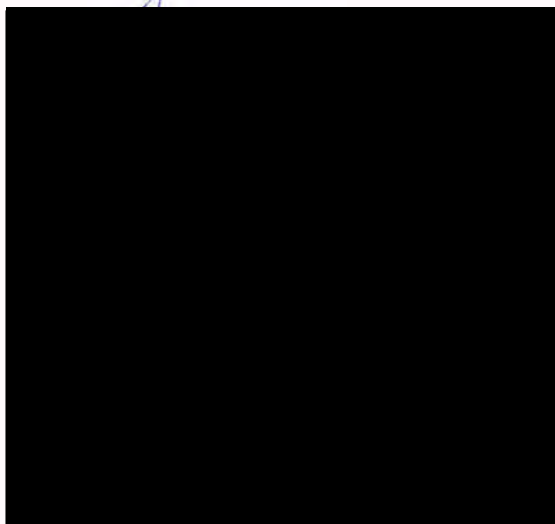

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 08 - ZL 8 - Změna hydroizolace opěrné zdi

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.8.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-64 130,19
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-64 130,19
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-64 130,19	-13 467,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-77 597,53
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 08 - ZL 8 - Změna hydroizolace opěrné zdi

Místo: Datum: 30.8.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-64 130,19
PSV - Práce a dodávky PSV	-64 130,19
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-64 130,19
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-64 130,19

ROZPOČET

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 08 - ZL 8 - Změna hydroizolace opěrné zdi

Místo: Datum: 30.8.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-64 130,19**

PSV - Práce a dodávky PSV -64 130,19

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -64 130,19

1	M	62852-R02	<i>pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, odtavovací fólií, spodní pás</i>	m2	-566,121	113,28	-64 130,19
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

ARA spol. s r.o.

Na Příkopě 391/7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

STAVBA : Garáže odtahů v areálu SSHMP

Kontrolní den	datum	místo	fáze	Zapsal
KD č 8	23.8.2017	na stavbě	realizace stavby	

ROZDĚLOVNÍK

Funkce - název firmy	
Investor – SSHMP	
Zhotovitel – Raeder-Falge	
Zhotovitel - Raeder-Falge	
Zhotovitel - Raeder-Falge	
Projektant – ANIMO	
TDI - ARA	
BOZP KOO - Profiodpady	

OBECNÉ INFORMACE

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
1.	Předání staveniště 4.6.2017 – zápis proveden samostatně		
2.	Zápis do SD bude veden průběžně		průběžně
3.	Zhotovitel pořídí kopie SD a zašle je všem zúčastněným mailem – průběžně 1 x týdně		průběžně
4.	Kontrola zápisu z minulého KD – bez připomínek		průběžně
5.	Kontrola SD – bez připomínek		průběžně

KONTROLA POSTUPU PRACÍ			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	<u>Provádí se :</u> - Obvodové zdivo - provedeno - Výztuž OPZ 2 – provedeno - Bednění OPZ 2 – provádí se		

STAVBA			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
S.1.1.	<u>Úkoly GD – předání staveniště :</u> <ul style="list-style-type: none"> Požadavky na zábor veř komunikace – trvá průběžně KZP – zhotovitel nepředložil – trvá průběžně 		
S.1.4.	<p>Posouzení zeminy ke zpětnému zásypu bude provedeno na základě posouzení geologa GD – trvá, posouzení bude provedeno geologem do příštího KD, Dne 24.7.2018 se geolog dostavil na stavbu, posoudil základovou spáru pro opěrnou stěnu v místě provedeného výkopu a vyhodnotil vytěženou zeminu z hlediska možnosti jejího dalšího použití. Geolog vyhotoví zápis o kontrole základové spáry a vypracuje technologický postup prací pro provádění zpětných zásypů. Dne 30.7.2018 geolog zaslal technologický postup a posouzení základové spáry pro 1. část opěrné stěny. GD, TDI a GP se vyjádří. Technologický postup odsouhlasen, nutno dodržet všechny podmínky stanovené pro podmínečné použití vytěžených zemin. Vyhodnocení a provedení ověřovacího hutního pokusu provede GD za účasti geologa a TDI. Dále se sleduje do provedení zkoušek a rozhodnutí o jejich výsledku. Úkol GD.</p>		
S.1.9.	<p>GD zaslal k odsouhlasení výrobní dokumentaci RH – schválí GP a TDI – úkol trvá, GP zašle schema rozvaděče, GP zaslal mailem návrh, GD se vyjádří – trvá. GD souhlasí a současně upozorňuje, že budoucí soudobý odběr zásuvkových rozvodnic je jistěn hodnotu 16A resp. 25A v hlavním rozvaděči. TDI upozorňuje na nedostatky v projektu elektro týkající se výpočtu bilance instalovaných zařízení v požadavku na instalovaný a soudobý výkon v návaznosti na navržené jištění a žádá GP o vyjasnění. Projektant elektro předloží aktualizaci PD. Aktualizace předložena. Schváleno. Vypouští se.</p>		
S.2.2.	Přípojky : GD předloží zaměření skutečného provedení včetně křížení s ostatními sítěmi,		

	revize a tlakové zkoušky pro plyn a vodovod - trvá		
S.4.1.	Při odtěžení zemního tělesa pro opěrnou zeď bylo znečištění navážkami s příměsí odpadu (beton, hadry, plast, železo, cihly, dlaždice ...) – dále se sleduje		
S.4.3.	GD provedl zkoušku únosnosti pláně pod deskou, bylo dosaženo požadavku v PD, protokol bude předložen - úkol trvá		
S.6.1.	V průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že dojde ke kolizi výkopu se vzrostlým stromem. Tato situace vyžaduje projednání s OŽP – povolení kácení. Z předložené dokumentace není zřejmé zda kácení tohoto stromu je povoleno. Úkol GP. GP sdělil, že se jedná o lípu s obvodem kmene 233 cm, průměr cca 75 cm. Tento strom nebyl povolen ke kácení. Nutno podat dodatečnou žádost. Dále bylo dohodnuto, že žádost podá investor přímo na místní OŽP. Žádost byla podána, čeká se na rozhodnutí. Nutno vyřešit do 2.9.2018, kdy GD plánuje zahájení výkopových prací pro další etapu.		
S.8.1.	Zhotovitel předložil výrobní dokumentaci střešních vazníků – nutno doplnit údaje o jednotlivých prvcích a jejich posouzení.		
S.8.2.	Po provedení betonáže OPZ 2 nutno dodržet technologickou pauzu min 7 dní resp. do nárůstu pevnosti betonu min 80% hodnoty uvedené v PD. Zhotovitel předloží dodací listy výztuže, betonové směsi a doloží zkoušky krychelné pevnosti předepsané ČSN.		
S.8.3.	Hydroizolace opěrných stěn. V PD navrženo souvrství 2 vrstev hydroizolace. Souvrství je shodné s navrženou vodorovnou hydroizolací objektu. Na základě požadavku GD projektant odsouhlasil, že je možno použít pouze jednu vrstvu hydroizolace s tím, že musí být zajištěna perfektní ochrana hydroizolace při zpětném zásypu a hutnění. Odůvodnění : jedná se o úsporu času a nákladů. Bude vyčísleno ve ZL.		
S.8.4.	Provedení těsnicí vrstvy násypu navržené v PD bude vzhledem k novým okolnostem posouzeno geologem a GP.		

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
P.1.1.	GP bude vést seznam změn a dodatků PD - trvá		průběžně
P.4.1.	GD vznáší dotaz ohledně nesrovnalostí v PD opěrné zdi (koty, tvar konstrukce, navržené skladby a dilatace, drenáž - zaústění ...) GP předložil úpravu dokumentace, která nesrovnalosti odstranila. Zbývá rozhodnutí o		

	způsobu utěsnění dilatačních spár. GP zaslal návrh pro utěsnění dilatačních a smršťovacích spár. Návrh byl odsouhlasen. GD provede ocenění. Úkol trvá		
P.5.1.	Na základě požadavku GD byla vypracována změna stavby před dokončením, která řeší změnu tvaru retenčních nádrží. Důvodem je dlouhá dodací doba nádrží dle původního návrhu. GD změnu projedná na vlastní náklad se stavebním úřadem, změna nemá vliv na cenu díla. GD podal žádost o změnu stavby před dokončením - trvá		

ZMĚNY VCP - MNP

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	GD bude vést přehledný soupis změnových listů <u>Náležitosti změnového listu :</u> <ul style="list-style-type: none"> • zdůvodnění – krycí list • vyjádření GP a TDI • podrobný položkový rozpočet • vyznačení v PD • fotodokumentace z realizace 		
Z.2.1.	ZL 2 – asfaltové vrstvy (viz bod S.1.8.)		
Z.2.2.	ZL 3 – úprava založení (viz bod S.1.5.)		
Z.3.1.	ZL 4 – sanace základové spáry (viz bod S.3.1.)		
Z.7.1.	ZL 5 – Kontaminace vytěžených zemin (viz bod S.4.1.)		
Z.7.2.	ZL 6 – Těsnění dilatačních spár (P.4.1.)		

HARMONOGRAM

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
H.8.1.	HMG aktualizace 20.6.2018 s termínem dokončení a předání stavby k datu 30.12.2018. – doposud nejsou dokončeny výkopy pro opěrnou zeď a dále nejsou zahájeny navazující práce. Zhotovitel předloží aktualizovaný harmonogram na příštím KD. GD předložil nový		

	HMG. Došlo k úpravě termínů provádění dílčích prací. Termín dokončení díla zůstává beze změny. TDI se vyjádří. HMG odsouhlasen. Práce probíhají v souladu s harmonogramem.		
--	---	--	--

	Přílohy :		
	Příští KD č. 9 : 30.8.2018 v 10.00 hod,		30.8.2018

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“
ZBV 9
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: číslo objednatele
číslo zhotovitele

Termín plnění: do 30.12.2018

Cena díla dle základní SOD	: 18 149 603,10 Kč bez DPH
Cena díla včetně dodatku č. 1	: 18 650 584,47 Kč bez DPH
Cena díla včetně ZBV6 a ZBV8	: 18 627 513,10 Kč bez DPH
Cena méněprací dle ZBV9	: - 36 488,54 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV9	: 18 591 024,56 Kč bez DPH

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989

Oprávněná osoba: [REDACTED]

Telefonní spojení: [REDACTED]

Popis předmětu informace:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na **výstavbě garážové haly pro odtahová vozidla**

Práce jsou prováděny podle PD a VV, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Dle posouzení geologa není nutné provádět těsnicí vrstvu v zásypech za OPZ

Popis problému:

Na základě geologického posudku ze dne 27.8.2018 a zápisu z KD č.8 ze dne 23.8. bod S.8.4. bylo rozhodnuto, že těsnicí vrstva nebude realizována.



Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV9.




Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“

nejpozději do: 30.11. 2018

Datum, podpis oprávněné osoby:

Datum potvrzení objednatele:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 09 - ZL 9 - Vypuštění těsnicí vrstvy v násypu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.8.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-36 488,54
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-36 488,54
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-36 488,54	-7 662,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-44 151,13
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 09 - ZL 9 - Vypuštění těsnicí vrstvy v násypu

Místo: Datum: 30.8.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-36 488,54
HSV - Práce a dodávky HSV	-36 488,54
1 - Zemní práce	-36 488,54
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-36 488,54

ROZPOČET

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 09 - ZL 9 - Vypuštění těsnicí vrstvy v násypu

Místo: Datum: 30.8.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -36 488,54

HSV - Práce a dodávky HSV -36 488,54

1 - Zemní práce -36 488,54

1	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,761	75,00	3 507,08
2	K	211561_R2	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 0 až 16 mm	m3	-46,761	690,00	-32 265,09
3	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-187,044	41,33	-7 730,53



TDI – Zápis z kontrolního dne stavby

spol. s r.o.

ARA spol. s r.o.

Na Pfkopě 391/7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Tel: (02) 2421 0420, (02) 2421 0843, Fax: (02) 2421 3070

Účet: 26 26 49 - 061 / 0100, IČO: 43 87 18 28, DIČ: 001 - 43 87 18 28

STAVBA : Garáže odtahů v areálu SSHMP

Kontrolní den	datum	místo	fáze	Zapsal
KD č 8	23.8.2017	na stavbě	realizace stavby	

ROZDĚLOVNÍK

Funkce - název firmy	jméno	telefon	mail
Investor – SSHMP			
Zhotovitel – Raeder-Falge			
Zhotovitel - Raeder-Falge			
Zhotovitel - Raeder-Falge			
Projektant – ANIMO			
TDI - ARA			
BOZP KOO - Profiodpady			

OBEČNÉ INFORMACE

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
1.	Předání staveniště 4.6.2017 – zápis proveden samostatně		
2.	Zápis do SD bude veden průběžně		průběžně
3.	Zhotovitel pořídí kopie SD a zašle je všem zúčastněným mailem – průběžně 1 x týdně		průběžně
4.	Kontrola zápisu z minulého KD – bez připomínek		průběžně
5.	Kontrola SD – bez připomínek		průběžně

KONTROLA POSTUPU PRACÍ

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	<p><u>Provádí se :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Obvodové zdivo - provedeno - Výztuž OPZ 2 – provedeno - Bednění OPZ 2 – provádí se 		

STAVBA

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
S.1.1.	<p><u>Úkoly GD – předání staveniště :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Požadavky na zábor veř komunikace – trvá průběžně • KZP – zhotovitel nepředložil – trvá průběžně 		
S.1.4.	<p>Posouzení zeminy ke zpětnému zásypu bude provedeno na základě posouzení geologa GD – trvá, posouzení bude provedeno geologem do příštího KD, Dne 24.7.2018 se geolog dostavil na stavbu, posoudil základovou spáru pro opěrnou stěnu v místě provedeného výkopu a vyhodnotil vytěženou zeminu z hlediska možnosti jejího dalšího použití. Geolog vyhotoví zápis o kontrole základové spáry a vypracuje technologický postup prací pro provádění zpětných zásypů. Dne 30.7.2018 geolog zaslal technologický postup a posouzení základové spáry pro 1. část opěrné stěny. GD, TDI a GP se vyjádří. Technologický postup odsouhlasen, nutno dodržet všechny podmínky stanovené pro podmínečné použití vytěžených zemin. Vyhodnocení a provedení ověřovacího hutního pokusu provede GD za účasti geologa a TDI. Dále se sleduje do provedení zkoušek a rozhodnutí o jejich výsledku. Úkol GD.</p>		
S.1.9.	<p>GD zaslal k odsouhlasení výrobní dokumentaci RH – schválí GP a TDI – úkol trvá, GP zašle schema rozvaděče, GP zaslal mailem návrh, GD se vyjádří – trvá. GD souhlasí a současně upozorňuje, že budoucí soudobý odběr zásuvkových rozvodnic je jištěn hodnotu 16A resp. 25A v hlavním rozvaděči. TDI upozorňuje na nedostatky v projektu elektro týkající se výpočtu bilance instalovaných zařízení v požadavku na instalovaný a soudobý výkon v návaznosti na navržené jištění a žádá GP o vyjasnění. Projektant elektro předloží aktualizaci PD. Aktualizace předložena. Schváleno. Vypouští se.</p>		
S.2.2.	<p>Přípojky : GD předloží zaměření skutečného provedení včetně křížení s ostatními sítěmi,</p>		

	revize a tlakové zkoušky pro plyn a vodovod - trvá		
S.4.1.	Při odtěžení zemního tělesa pro opěrnou zeď bylo znečištění navážkami s příměsí odpadu (beton, hadry, plast, železo, cihly, dlaždice ...) – dále se sleduje		
S.4.3.	GD provedl zkoušku únosnosti pláně pod deskou, bylo dosaženo požadavku v PD, protokol bude předložen - úkol trvá		
S.6.1.	V průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že dojde ke kolizi výkopu se vzrostlým stromem. Tato situace vyžaduje projednání s OŽP – povolení kácení. Z předložené dokumentace není zřejmé zda kácení tohoto stromu je povoleno. Úkol GP. GP sdělil, že se jedná o lípu s obvodem kmene 233 cm, průměr cca 75 cm. Tento strom nebyl povolen ke kácení. Nutno podat dodatečnou žádost. Dále bylo dohodnuto, že žádost podá investor přímo na místní OŽP. Žádost byla podána, čeká se na rozhodnutí. Nutno vyřešit do 2.9.2018, kdy GD plánuje zahájení výkopových prací pro další etapu.		
S.8.1.	Zhotovitel předložil výrobní dokumentaci střešních vazníků – nutno doplnit údaje o jednotlivých prvcích a jejich posouzení.		
S.8.2.	Po provedení betonáže OPZ 2 nutno dodržet technologickou pauzu min 7 dní resp. do nárůstu pevnosti betonu min 80% hodnoty uvedené v PD. Zhotovitel předloží dodací listy výztuže, betonové směsi a doloží zkoušky krychelné pevnosti předepsané ČSN.		
S.8.3.	Hydroizolace opěrných stěn. V PD navrženo souvrství 2 vrstev hydroizolace. Souvrství je shodné s navrženou vodorovnou hydroizolací objektu. Na základě požadavku GD projektant odsouhlasil, že je možno použít pouze jednu vrstvu hydroizolace s tím, že musí být zajištěna perfektní ochrana hydroizolace při zpětném zásypu a hutnění. Odůvodnění : jedná se o úsporu času a nákladů. Bude vyčísleno ve ZL.		
S.8.4.	Provedení těsnící vrstvy násypu navržené v PD bude vzhledem k novým okolnostem posouzeno geologem a GP.		

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
P.1.1.	GP bude vést seznam změn a dodatků PD - trvá		průběžně
P.4.1.	GD vznáší dotaz ohledně nesrovnalostí v PD opěrné zdi (koty, tvar konstrukce, navržené skladby a dilatace, drenáž - zaústění ...) GP předložil úpravu dokumentace, která nesrovnalosti odstranila. Zbývá rozhodnutí o		

	způsobu utěsnění dilatačních spár. GP zaslal návrh pro utěsnění dilatačních a smršťovacích spár. Návrh byl odsouhlasen. GD provede ocenění. Úkol trvá		
P.5.1.	Na základě požadavku GD byla vypracována změna stavby před dokončením, která řeší změnu tvaru retenčních nádrží. Důvodem je dlouhá dodací doba nádrží dle původního návrhu. GD změnu projedná na vlastní náklad se stavebním úřadem, změna nemá vliv na cenu díla. GD podal žádost o změnu stavby před dokončením - trvá		

ZMĚNY VCP - MNP

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	GD bude vést přehledný soupis změnových listů <u>Náležitosti změnového listu :</u> <ul style="list-style-type: none"> • zdůvodnění – krycí list • vyjádření GP a TDI • podrobný položkový rozpočet • vyznačení v PD • fotodokumentace z realizace 		
Z.2.1.	ZL 2 – asfaltové vrstvy (viz bod S.1.8.)		
Z.2.2.	ZL 3 – úprava založení (viz bod S.1.5.)		
Z.3.1.	ZL 4 – sanace základové spáry (viz bod S.3.1.)		
Z.7.1.	ZL 5 – Kontaminace vytěžených zemin (viz bod S.4.1.)		
Z.7.2.	ZL 6 – Těsnění dilatačních spár (P.4.1.)		

HARMONOGRAM

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
H.8.1.	HMG aktualizace 20.6.2018 s termínem dokončení a předání stavby k datu 30.12.2018. – doposud nejsou dokončeny výkopy pro opěrnou zeď a dále nejsou zahájeny navazující práce. Zhotovitel předloží aktualizovaný harmonogram na příštím KD. GD předložil nový		

	HMG. Došlo k úpravě termínů provádění dílčích prací. Termín dokončení díla zůstává beze změny. TDI se vyjádří. HMG odsouhlasen. Práce probíhají v souladu s harmonogramem.		
--	---	--	--

	Přílohy :		
	Příští KD č. 9 : 30.8.2018 v 10.00 hod,		30.8.2018

**PRAHA 8, ULICE PROSECKÁ - AREÁL SSHMP
VÝSTAVBA GARÁŽÍ SPRÁVY SLUŽEB HL. M. PRAHY
STANOVISKO K VARIANTNÍMU UPUŠTĚNÍ OD INSTALACE HYDROIZOLAČNÍ
VTRSTVY V TĚLESE ZÁSYPY ZA OPĚRNOU ZDÍ**


Na základě požadavku vedení stavby, TDI a projektanta stavby jsem zpracoval vyjádření k možnosti provést zásyp opěrné zdi bez instalace hydroizolační vrstvy (resp. fólie).

Podle projektové dokumentace bude zpevněná plocha nově vybudovaného parkoviště nad opěrnou zdí tvořena živičným povrchem a celkově odvodněna do dešťové kanalizace. Takto navržená úprava povrchu parkoviště prakticky zamezuje prosakování srážkové vody do tělesa zásypu. Na základě zvážení těchto okolností proto navrhuji od instalace hydroizolační vrstvy upustit a provést zásyp opěrné zdi bez tohoto opatření. Standardní odvodnění OZ v její patě považuji v tomto konkrétním případě za opatření dostatečné.

V Ohrobci 27.8.2018

Zpracoval : 

autorizovaný technik ČKAIT pro geotechniku č.0012265
odborná způsobilost MŽP v inženýrské geologii č.2265/2015



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“
ZBV 10
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: číslo objednatele
číslo zhotovitele

Termín plnění: do 30.12.2018

Cena díla dle základní SOD	: 18 149 603,10 Kč bez DPH
Cena díla včetně dodatku č. 1	: 18 650 584,47 Kč bez DPH
Cena díla včetně ZBV6, ZBV8 a ZBV9	: 18 591 024,56 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV10	: 71 232,94 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV10	: 18 662 257,50 Kč bez DPH

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989

Oprávněná osoba: [REDAKCE]

Telefonní spojení: [REDAKCE]

Popis předmětu informace:


Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na **výstavbě garážové haly pro odtahová vozidla**.

Práce jsou prováděny podle PD a VV, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

GD upozornil na rozdílnou třídu betonu pro Opěrnou zeď uvedenou v projektové dokumentaci (třída C 30/37) oproti třídě betonu uvedené ve soupisu prací (třída C 25/30).

Popis problému:

Dle zápisu z KD č.10 ze dne 6.9.2018 bod S10.1. bylo rozhodnuto, že bude použita třída betonu opěrné zdi předepsaná projektovou dokumentací, tedy třída C 30/37.



S odvoláním na
Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV10. Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebně montážních prací. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné k provedení tohoto díla.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:




„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“

nejpozději do: 30.11. 2018

Datum, podpis oprávněné osoby:

ZA ZHOTOVITELE

Datum potvrzení objednatele:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 10 - ZL 10 - Třída betonu OPZ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.8.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				71 232,94
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				71 232,94
DPH základní	21,00%	ze	71 232,94	14 958,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		86 191,86

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 10 - ZL 10 - Třída betonu OPZ

Místo:

Datum:

30.8.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	71 232,94
HSV - Práce a dodávky HSV	71 232,94
32 - Zdi přehradní a opěrné	71 232,94
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 232,94

ROZPOČET

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 10 - ZL 10 - Třída betonu OPZ

Místo:

Datum:

30.8.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 232,94

HSV - Práce a dodávky HSV

71 232,94

32 - Zdi přehradní a opěrné

71 232,94

1	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	-106,732	2 422,60	-258 568,94
			OPZ 1 _ SoD (1,64*(1,3+12,6))*-1		-22,796		
			OPZ 2_SoD (6,54*(7,6+14,8))*-1		-146,496		
			"OPZ 1 - pata - skutečnost"1,321*2*0,4+12,5*2*0,4		11,057		
			"OPZ 2 - pata - skutečnost"4,5*15,375*0,6+4,5*3,7*0,6		51,503		
			Součet		-106,732		
3	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	106,732	3 090,00	329 801,88
			OPZ 1 _ SoD (1,64*(1,3+12,6))		22,796		
			OPZ 2_SoD (6,54*(7,6+14,8))		146,496		
			"OPZ 1 - pata C25/30 - odpočet skutečnost"(1,321*2*0,4+12,5*2*0,4)*-1		-11,057		
			"OPZ 2 -pata C25/30 - odpočet skutečnost"(4,5*15,375*0,6+4,5*3,7*0,6)*-1		-51,503		
			Součet		106,732		

ARA spol. s r.o.

Na Přikopě 391/7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

STAVBA : Garáže odtahů v areálu SSHMP

Kontrolní den	datum	místo	fáze	Zapsal
KD č 10	6.9.2018	na stavbě	realizace stavby	

ROZDĚLOVNÍK

Funkce - název firmy	jméno	telefon	mail
Investor – SSHMP			
Zhotovitel – Raeder-Falge			
Zhotovitel - Raeder-Falge			
Zhotovitel - Raeder-Falge			
Projektant – ANIMO			
TDI - ARA			
BOZP KOO - Profiodpady			

OBECNÉ INFORMACE

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
1.	Předání staveniště 4.6.2017 – zápis proveden samostatně		
2.	Zápis do SD bude veden průběžně		průběžně
3.	Zhotovitel pořídí kopie SD a zašle je všem zúčastněným mailem – průběžně 1 x týdně		průběžně
4.	Kontrola zápisu z minulého KD – bez připomínek		průběžně
5.	Kontrola SD – bez připomínek		průběžně

KONTROLA POSTUPU PRACÍ			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	<u>Provádí se :</u> - Izolace OPZ 2 - provedena - Zásypy OPZ 2 – provádí se - Bednění věnců – provádí se		

STAVBA			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
S.1.1.	<u>Úkoly GD – předání staveniště :</u> <ul style="list-style-type: none"> Požadavky na zábor veř komunikace – trvá průběžně KZP – zhotovitel nepředložil – trvá průběžně 		
S.1.4.	<p>Posouzení zeminy ke zpětnému zásypu bude provedeno na základě posouzení geologa GD – trvá, posouzení bude provedeno geologem do příštího KD, Dne 24.7.2018 se geolog dostavil na stavbu, posoudil základovou spáru pro opěrnou stěnu v místě provedeného výkopu a vyhodnotil vytěženou zeminu z hlediska možnosti jejího dalšího použití. Geolog vyhotoví zápis o kontrole základové spáry a vypracuje technologický postup prací pro provádění zpětných zásypů. Dne 30.7.2018 geolog zaslal technologický postup a posouzení základové spáry pro 1. část opěrné stěny. GD, TDI a GP se vyjádří. Technologický postup odsouhlasen, nutno dodržet všechny podmínky stanovené pro podmínečné použití vytěžených zemin. Vyhodnocení a provedení ověřovacího hutního pokusu provede GD za účasti geologa a TDI. Dále se sleduje do provedení zkoušek a rozhodnutí o jejich výsledku. Úkol GD. Dne 6.9.2018 bylo provedeno posouzení zemin na deponii a byla provedena pojezdová zkouška. Výsledek byl zapsán do SD str. 2360635. Dále se tento bod vypouští.</p>		
S.2.2.	Přípojky : GD předloží zaměření skutečného provedení včetně křížení s ostatními sítěmi, revize a tlakové zkoušky pro plyn a vodovod - trvá		
S.4.3.	GD provedl zkoušku únosnosti pláně pod deskou, bylo dosaženo požadavku v PD, protokol bude předložen. Protokol zaslán – vypouští se.		
S.6.1.	V průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že dojde ke kolizi výkopu se vzrostlým stromem. Tato situace vyžaduje projednání s OŽP – povolení kácení. Z předložené dokumentace		

	není zřejmé zda kácení tohoto stromu je povoleno. Úkol GP. GP sdělil, že se jedná o lípu s obvodem kmene 233 cm, průměr cca 75 cm. Tento strom nebyl povolen ke kácení. Nutno podat dodatečnou žádost. Dále bylo dohodnuto, že žádost podá investor přímo na místní OŽP. Žádost byla podána, čeká se na rozhodnutí. Nutno vyřešit do 2.9.2018, kdy GD plánuje zahájení výkopových prací pro další etapu. Na stavbě proběhlo místní šetření za účasti úředníka pana Bc Kvasničky a stavbyvedoucího, který místo zdokumentoval a s podmínkami se seznámil. Vyjádření se očekává příští týden. Na základě průběhu řízení se očekává vydání souhlasného stanoviska. Kácení zajistí investor. Termín příští týden.		
S.9.1.	Zhotovitel předložil finanční rozvahu pro provedení zpětných zásypů na základě vyhodnocení zeminy (viz bod S.1.4. a S.4.1.) ve dvou variantách. 1) Použití stávajícího materiálu vytěženého na stavbě – podmíněčně vhodný materiál 2) Provedení zásypů z dovezeného vhodného zásypového materiálu Investor + TDI + AD návrh posoudí. Bude řešeno jako ZL 7. S ohledem na geotechnické vyhodnocení zemni na mezideponii viz bod S.1.4. bude k zásypům použit stávající materiál. Navýšení nákladů na třídění bude vyčísleno dle skutečnosti.		
S.10.1.	GD upozorňuje na skutečnost, že třída betonu opěrných zdí svislé části je ve výkazu výměr uvedena třídou 25/30 a v PD je uvedena požadovaná třída 30/37. Jedná se o nesrovnalost u obou opěrných zdí. GP upřesnil, že bude použita třída betonu dle PD tedy 30/37. Tato změna bude řešena jako ZL 10.		

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
P.1.1.	GP bude vést seznam změn a dodatků PD - trvá		průběžně

ZMĚNY VCP - MNP

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	GD bude vést přehledný soupis změnových listů <u>Náležitosti změnového listu :</u> <ul style="list-style-type: none"> • zdůvodnění – krycí list • vyjádření GP a TDI • podrobný položkový rozpočet • vyznačení v PD 		

	• fotodokumentace z realizace		
Z.2.1.	ZL 2 – asfaltové vrstvy (viz bod S.1.8.)		
Z.2.2.	ZL 3 – úprava založení (viz bod S.1.5.)		
Z.3.1.	ZL 4 – sanace základové spáry (viz bod S.3.1.)		
Z.7.1.	ZL 5 – Kontaminace vytěžených zemin (viz bod S.4.1.)		
Z.7.2.	ZL 6 – Těsnění dilatačních spár (P.4.1.)		
Z.9.1.	ZL 7 – Změna provedení zpětných zásypů		
Z.9.2.	ZL 8 – Změna hydroizolace opěrné zdi		
Z.9.3.	ZL 9 – Vypuštění těsnicí vrstvy v násypu		
Z.10.1.	ZL 10 – Třída betonu OPZ (viz bod S.10.1.)		

HARMONOGRAM

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
H.10.1.	HMG aktualizace 20.6.2018 s termínem dokončení a předání stavby k datu 30.12.2018. – doposud nejsou dokončeny výkopy pro opěrnou zeď a dále nejsou zahájeny navazující práce. Zhotovitel předloží aktualizovaný harmonogram na příštím KD. GD předložil nový HMG. Došlo k úpravě termínů provádění dílčích prací. Termín dokončení díla zůstává beze změny. TDI se vyjádří. HMG odsouhlasen. Práce probíhají v souladu s harmonogramem.		

	Přílohy :		
	Příští KD č. 11 : 6.9.2018 v 10.00 hod,		13.9.2018

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“
ZBV 13
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: číslo objednatele
číslo zhotovitele

Termín plnění: do 30.12.2018

Cena díla dle základní SOD	: 18 149 603,10 Kč bez DPH
Cena díla včetně dodatku č. 1	: 18 650 584,47 Kč bez DPH
Cena díla včetně ZBV6, ZBV8, ZBV9 a ZBV10	: 18 662 257,50 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV13	: 49 622,93 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV13	: 18 711 880,43 Kč bez DPH

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989

Oprávněná osoba: [REDACTED]

Telefonní spojení: [REDACTED]

Popis předmětu informace:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na **výstavbě garážové haly pro odtahová vozidla**

Předmětem změny je požadavek objednatele doplnit garážová vrata o světelnou signalizaci a další 5 ks dálkového ovládání ke každým vratům

Popis problému:

Na základě požadavku objednatele dle zápisu z KD č.15 ze dne 11.10. bod S.12.1.bude dodávka vrat doplněna o světelnou signalizaci (maják) a o 5 ks dálkového ovládání ke každým vratům, tj. 25 ks. Výše požadované nebylo součástí specifikace v PD

S odvoláním na
Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV13. Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebně montážních prací. Zhotoviteli tyto skutečnosti v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyly a ani nemohly být známy. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné k provedení tohoto díla.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:




„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“

nejpozději do: 30.11. 2018

Datum, podpis oprávněné osoby:

ZA ZHOTOVITELĚ

Datum potvrzení objednatele:

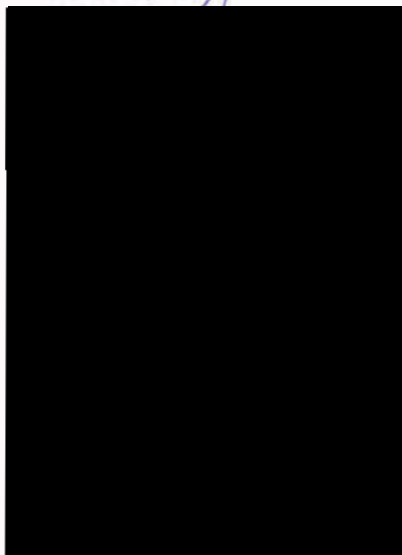

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 13 - ZL 13 - Vjezdová vrata - doplnění

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.8.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				49 622,63
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				49 622,63
DPH základní	21,00%	ze	49 622,63	10 420,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	60 043,38

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 13 - ZL 13 - Vjezdová vrata - doplnění

Místo: Datum: 30.8.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	49 622,63
PSV - Práce a dodávky PSV	49 622,63
767 - Konstrukce zámečnické	49 622,63
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 622,63

ROZPOČET

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 13 - ZL 13 - Vjezdová vrata - doplnění

Místo: Datum: 30.8.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 622,63

PSV - Práce a dodávky PSV

49 622,63

767 - Konstrukce zámečnické

49 622,63

1	K	76733-R01a	Ozn.O1 - Tepelněizolační sekční průmyslová vrata - světelná signalizace - maják	kus	5,000	4 000,00	20 000,00
2	K	76733-R01b	Ozn.O1 - Tepelněizolační sekční průmyslová vrata - dálková ovládání	kus	25,000	1 150,00	28 750,00
3	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	487,500	1,79	872,63

ARA spol. s r.o.

Na Příkopě 391/7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Tel: (02) 2421 0420, (02) 2421 0843, Fax: (02) 2421 3070

Účet: 26 26 49 - 061 / 0100, IČO: 43 87 18 28, DIČ: 001 - 43 87 18 28

STAVBA : Garáže odtahů v areálu SSHMP

Kontrolní den	datum	místo	fáze	Zapsal
KD č 15	11.10.2018	na stavbě	realizace stavby	

ROZDĚLOVNÍK

Funkce - název firmy	jméno	telefon	mail
Investor – SSHMP			
Zhotovitel – Raeder-Falge			
Zhotovitel - Raeder-Falge			
Zhotovitel - Raeder-Falge			
Projektant – ANIMO			
TDI - ARA			
BOZP KOO - Profiodpady			

OBECNÉ INFORMACE

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
1.	Předání staveniště 4.6.2017 – zápis proveden samostatně		
2.	Zápis do SD bude veden průběžně		průběžně
3.	Zhotovitel pořídí kopie SD a zašle je všem zúčastněným mailem – průběžně 1 x týdně		průběžně
4.	Kontrola zápisu z minulého KD – bez připomínek		průběžně
5.	Kontrola SD – bez připomínek		průběžně

KONTROLA POSTUPU PRACÍ			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	<u>Provádí se :</u> - Výkopy pro retenční nádrž - OPZ 01 – provedena betonáž spodní desky - Montáž skladby střechy – provádí se - Izolace soklu (zateplení) – provádí se		

STAVBA			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
S.1.1.	<u>Úkoly GD – předání staveniště :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Požadavky na zábor veř komunikace – trvá průběžně • KZP – zhotovitel nepředložil – trvá průběžně 		
S.2.2.	Přípojky : GD předloží zaměření skutečného provedení včetně křížení s ostatními sítěmi, revize a tlakové zkoušky pro plyn a vodovod - trvá		
S.11.1.	Kontrola provádění zásypů. Dnes provede kontrolu zpětných zásypů geolog. Výsledek bude zapsán SD. Další kontrola provedena 19.9.2018, zápis zapsán opět do SD. Dále sleduje. Zásypy stávajícím materiálem byly ukončeny. Nyní se bude dovážet nový materiál. Následující zkouška zhutnění bude provedena na pláni. Geolog převzal základovou spáru pro OPZ 1 zápisem do SD 2 str 003603 – vypouští se		
S.12.1.	Zhotovitel připraví k odsouhlasení výrobní dokumentaci pro garážová vrata. – úkol trvá , zhotovitel zašle specifikaci mailem. S ohledem na zateplení ostění bude šířka vrat upravena o tl. Izolace 20mm. Zhotovitel předložil výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Zhotovitel garantuje min 30 cyklů denně. Dále bude v rámci dodávky doplněna světelná signalizace – maják. Navíc bude dodán ke každým vratům 6x ovladač. Odsouhlaseno – vypouští se		
S.13.3.	Barvy fasády – vzorník WEBER : Plocha fasády bude provedena v barevném odstínu HBW 53.3 – MO7E, šambrány v odstínu HBW 25.7 – MO7B. Sokl-podezdívka nad terénem bude provedena v barevném odstínu HBW 24-MAR1 GO1 (marmolit), úroveň soklu nad terénem bude upřesněna na příštím KD. – úroveň zakládací lišty bude provedena na úrovni + 150 mm - vypouští se		

S.13.4.	Na návrh zhotovitele bylo odsouhlaseno, že elektroinstalace v objektu může vést v liště po stěně místo původně uvažovaného zapuštění pod omítku. NUTNO PROVĚŘIT NÁVAZNOSTI NA PBŘ – ODSOUHLASÍ GP. Z hlediska PBŘ je vedení po povrchu možné s tím, že napájecí kabel pro čidlo u protipožární rolety je třeba provést nehořlavým kabelem. Kabeláž bude vedena v liště. Změna bude provedena bez vlivu na cenu díla. – vypouští se		
S.14.1.	Zápisy BOZP : GP, GD a TDI nedostává zápisy BOZP. Objednatel předává zhotoviteli zápis č 10 a žádá o zajištění navržených pokynů. – úkol trvá		
S.14.2.	Oplocení : na základě požadavku objednatele bude tloušťka drátu výplně průměr 5mm. Oplocení bude provedeno dle výkazu výměr tj. 130 bm. Bere se na vědomí – vypouští se		
S.15.1.	Zhotovitel provede novou kalkulaci pro vedení CCTV z důvodu nesouladu výkazu výměr s PD.		
S.15.2.	Sloup pro optickou závora nebudou realizovány a optická závora (OZ) bude přemístěna. Čidlo OZ1 bude přemístěno na roh fasády a OZ2 bude přemístěno na první stožár VO u vjezdu do areálu.		

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
P.1.1.	GP bude vést seznam změn a dodatků PD - trvá		průběžně
P.14.1.	GP upření řešení návaznosti PBŘ a Elektro z hlediska umístění RH v návaznosti na tlačítko Total – Central stop. – upřesněno mailem – vypouští se		

ZMĚNY VCP - MNP

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	GD bude vést přehledný soupis změnových listů <u>Náležitosti změnového listu :</u> <ul style="list-style-type: none"> • zdůvodnění – krycí list • vyjádření GP a TDI • podrobný položkový rozpočet • vyznačení v PD • fotodokumentace z realizace 		

Z.1.1.	ZL 1 – RIS (ve VV chybí položka RIS) – odsouhlaseno		
Z.2.1.	ZL 2 – asfaltové vrstvy (viz bod S.1.8.) – vyfakturováno 09/2018		
Z.2.2.	ZL 3 – úprava založení (viz bod S.1.5.) – vyfakturováno 09/2018		
Z.3.1.	ZL 4 – sanace základové spáry (viz bod S.3.1.) – vyfakturováno 09/2018		
Z.7.1.	ZL 5 – Kontaminace vytěžených zemin (viz bod S.4.1.)		
Z.7.2.	ZL 6 – Těsnění dilatačních spár (P.4.1.)		
Z.9.1.	ZL 7 – Změna provedení zpětných zásypů		
Z.9.2.	ZL 8 – Změna hydroizolace opěrné zdi		
Z.9.3.	ZL 9 – Vypuštění těsnící vrstvy v násypu		
Z.10.1.	ZL 10 – Třída betonu OPZ (viz bod S.10.1.)		
Z.15.1.	ZL 11 - Úprava rozvaděče RH (viz bod S.1.9.)		
Z.15.1.	ZL 12 – Vedení CCTV (viz bod S.15.1.)		
Z.15.2.	ZL 13 – Vjezdové vrata – doplnění specifikace (ovladače, majáky) - viz bod S.12.1.		

HARMONOGRAM

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
H.15.1.	Práce probíhají v souladu s harmonogramem vyjma prací na OPZ 1. Bude řešeno na příštím KD. Zhotovitel se vyjádří příští KD. Zhotovitel předkládá nový harmonogram stavby s termínem dokončení 31.5.2018. Posun termínu váže na klimatické podmínky. DG specifikuje podrobně podmínky pro jednotlivé činnosti, které jsou vázány na počasí. Díky prodloužení termínu kácení o 24 dnů není prodloužení termínu dokončení stavby do 31.5.2019 odůvodnitelné. Případné prodloužení termínu stavby bude řešeno v závislosti na klimatických podmínkách. V současné době je přípustné prodloužení termínu dokončení venkovních zpevněných ploch o 24 dnů.		

	Přílohy :		
	Příští KD č. 16 : 18.10.2018 v 10.00 hod,		18.10.2018

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“
ZBV 14
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: číslo objednatele
číslo zhotovitele

Termín plnění: do 30.12.2018

Cena díla dle základní SOD	: 18 149 603,10 Kč bez DPH
Cena díla včetně dodatku č. 1	: 18 650 584,47 Kč bez DPH
Cena díla včetně ZBV6, ZBV8, ZBV9, ZBV10 a ZBV13	: 18 711 880,43 Kč bez DPH
Cena méněprací dle ZBV14	: - 0,01 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV14	: 18 711 880,42 Kč bez DPH

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989

Oprávněná osoba: [REDACTED]

Telefonní spojení: [REDACTED]


Popis předmětu informace:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na **výstavbě garážové haly pro odtahová vozidla**

Záměna vnitřní omítky za lepidlo a perlunku.

Popis problému:

Vzhledem k úspoře času zhotovitel navrhl záměnu v provedení vnitřních jádrových omítek za potažení stěn tenkovrstvým lepidlem s perlinkou.



S odvoláním na
Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV14. Změna nemá vliv na cenu díla.


Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

„výstavba garážové haly pro odtahová vozidla“


nejpozději do: 30.11. 2018

Datum, podpis oprávněné osoby:

Datum potvrzení objednatele:

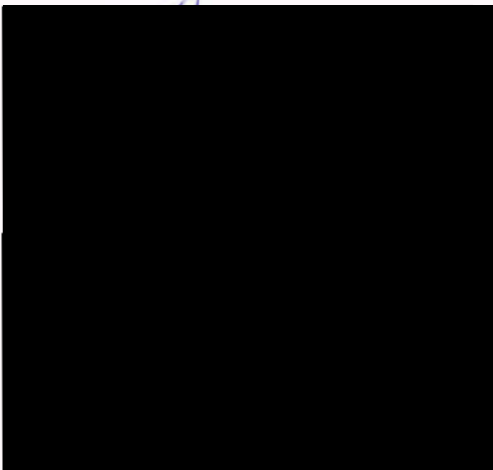

ZA ZHOTOVITEL



ARA spol. s r.o.

Na Příkopě 391/7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Tel: (02) 2421 0420, (02) 2421 0843, Fax: (02) 2421 3070

Účet: 26 26 49 - 061 / 0100, IČO: 43 87 18 28, DIČ: 001 - 43 87 18 28

STAVBA : Garáže odtažů v areálu SSHMP

Kontrolní den	datum	místo	fáze	Zapsal
KD č 16	18.10.2018	na stavbě	realizace stavby	

ROZDĚLOVNÍK

Funkce - název firmy	jméno	telefon	mail
Investor – SSHMP			
Zhotovitel – Raeder-Falge			
Zhotovitel - Raeder-Falge			
Zhotovitel - Raeder-Falge			
Projektant – ANIMO			
TDI - ARA			
BOZP KOO - Profiodpady			

OBECNÉ INFORMACE

Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
1.	Předání staveniště 4.6.2017 – zápis proveden samostatně		
2.	Zápis do SD bude veden průběžně		průběžně
3.	Zhotovitel pořídí kopie SD a zašle je všem zúčastněným mailem – průběžně 1 x týdně		průběžně
4.	Kontrola zápisu z minulého KD – bez připomínek		průběžně
5.	Kontrola SD – bez připomínek		průběžně

KONTROLA POSTUPU PRACÍ			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	<u>Provádí se :</u> - Retenční nádrž - usazena - OPZ 01 – provedena betonáž stěny - Provádí se další výkopy a bednění pro navazující části OPZ - Montáž skladby střechy – provádí se - Izolace zateplení – provádí se kotvení		

STAVBA			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
S.1.1.	<u>Úkoly GD – předání staveniště :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Požadavky na zábor veř komunikace – trvá průběžně • KZP – zhotovitel nepředložil – trvá průběžně 		
S.2.2.	Přípojky : GD předloží zaměření skutečného provedení včetně křížení s ostatními sítěmi, revize a tlakové zkoušky pro plyn a vodovod - trvá		
S.14.1.	Zápisy BOZP : GP, GD a TDI nedostává zápisy BOZP. Objednatel předává zhotoviteli zápis č 10 a žádá o zajištění navržených pokynů. – úkol trvá		
S.15.1.	Zhotovitel provede novou kalkulaci pro vedení CCTV z důvodu nesouladu výkazu výměr s PD. Kamera se přemísťovat nebude a položka se vypouští. Viz ZL 12		
S.15.2.	Sloup pro optickou závoru nebudou realizovány a optická závora (OZ) bude přemístěna. Čidlo OZ1 bude přemístěno na roh fasády a OZ2 bude přemístěno na první stožár VO u vjezdu do areálu. Odsouhlaseno – vypouští se		
S.16.1.	Stlačený vzduch : GD navrhuje možnost zvětšení příkonu kompresoru z 2,5 kW (8 bar) na příkon 4 kW (4 – 15 bar). Změna nebude mít vliv na cenu díla.		
S.16.2.	Barevnost plotu : drátěný typ č 1 a 2 v jednom odstínu barva zelená, kompozitní typ č 3 barva šedá		
S.16.3.	Záměna omítek : místo jádrové omítky budou provedeny tenkovrstvé omítky (lepidlo, perlínka, štuk) změna nebude mít dopad na cenu díla. – Odsouhlaseno viz ZL 14		
S.16.4.	Vzorkovací list VZ č 3 – vnější plastové dveře (schváleno) Vzorkovací list VZ č 4 – karma beta 3 (schváleno)		

S.16.5.	Zhotovitel předložil rekapitulaci ZL 1 – ZL 14 k odsouhlasení. Připomínky byly vzneseny ke ZL 7 a ZL 11 (ZL 12 upravit dle pokynů viz bod 15.1. ze dne 18.10.2018)		
----------------	--	--	--

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
P.1.1.	GP bude vést seznam změn a dodatků PD - trvá		průběžně
P.16.1.	Dnes byla provedena kontrola opěrných zdi OPZ + a POZ 2. GP prověří návrh navazujících opěrných zdi s ohledem na jejich stabilitu vzhledem ke konečnému stavu okolního terénu.		

ZMĚNY VCP - MNP			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
	GD bude vést přehledný soupis změnových listů <u>Náležitosti změnového listu :</u> <ul style="list-style-type: none"> • zdůvodnění – krycí list • vyjádření GP a TDI • podrobný položkový rozpočet • vyznačení v PD • fotodokumentace z realizace 		
Z.1.1.	ZL 1 – RIS (ve VV chybí položka RIS) – odsouhlaseno		
Z.2.1.	ZL 2 – asfaltové vrstvy (viz bod S.1.8.) – vyfakturováno 09/2018		
Z.2.2.	ZL 3 – úprava založení (viz bod S.1.5.) – vyfakturováno 09/2018		
Z.3.1.	ZL 4 – sanace základové spáry (viz bod S.3.1.) – vyfakturováno 09/2018		
Z.7.1.	ZL 5 – Kontaminace vytěžených zemin (viz bod S.4.1.)		
Z.7.2.	ZL 6 – Těsnění dilatačních spár (P.4.1.)		
Z.9.1.	ZL 7 – Změna provedení zpětných zásypů		
Z.9.2.	ZL 8 – Změna hydroizolace opěrné zdi		
Z.9.3.	ZL 9 – Vypuštění těsnící vrstvy v násypu		
Z.10.1.	ZL 10 – Třída betonu OPZ (viz bod S.10.1.)		

Z.15.1.	ZL 11 - Úprava rozvaděče RH (viz bod S.1.9.)		
Z.15.1.	ZL 12 – Vedení CCTV (viz bod S.15.1.)		
Z.15.2.	ZL 13 – Vjezdové vrata – doplnění specifikace (ovladače, majáky) - viz bod S.12.1.		
Z.16.1.	ZL 14 – Změna omítek (jádrové – tenkovrstvé)		

HARMONOGRAM			
Pořad.č.	Zápis	odpovídá	termín
H.16.1.	Práce probíhají v souladu s harmonogramem vyjma prací na OPZ a zpevněných plochách. Případné prodloužení termínu stavby bude řešeno v závislosti na klimatických podmínkách. V současné době je přípustné prodloužení termínu dokončení venkovních zpevněných ploch o 24 dnů. - trvá beze změn		
	Přílohy :		
	Příští KD č. 17 : 25.10.2018 v 10.00 hod.		25.10.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 14 - ZL 14 - Změna vnitřní omítky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.8.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-0,01
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-0,01
DPH základní	21,00%	ze	-0,01	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-0,01

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 14 - ZL 14 - Změna vnitřní omítky

Místo: Datum: 30.8.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-0,01
HSV - Práce a dodávky HSV	-0,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	139 392,89
61 - Úprava povrchů vnitřní	-139 154,05
99 - Přesuny hmot a sutí	-238,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-0,01

ROZPOČET

Stavba: Garáže odtahů v areálu SSHMP-S24/17

Objekt: 14 - ZL 14 - Změna vnitřní omítky

Místo:

Datum: 30.8.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-0,01**

HSV - Práce a dodávky HSV **-0,01**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **139 392,89**

5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	450,643	46,32	20 873,78
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	450,643	180,00	81 115,74
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	450,643	83,00	37 403,37

61 - Úprava povrchů vnitřní **-139 154,05**

1	K	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	-450,643	48,79	-21 986,87
2	K	612321341	Vápenocementová omítková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	-450,643	260,00	-117 167,18

99 - Přesuny hmot a sutí **-238,85**

6	K	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	-7,216	33,10	-238,85
---	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

vystavba garážového stání pro odtahová vozidla

Příloha č.: 7

S24/17

Přehled víceprací a méněprací stavby - garáže pro odtahová vozidla

p.č.	popis VCP/MNP	datum vzniku VCP/MNP	datum odevzdání CN objednateli	Podpis ZL objednatelem	cena bez DPH	vyjádření objednatele	doba realizace	vyfakturováno/měsíc / nevyfakturováno	poznámka
1	ZL č. 1 -RIS	18.6.2018	18.6.2018		25 805,00 Kč	odsouhlaseno	září	nevyfakturováno	součástí dodatku č.1
2	ZL č. 2 - likvidace asfaltové plochy	21.6.2018	21.8.2018		356 220,00 Kč	odsouhlaseno	červen/ červenec	vyfakturováno / září	součástí dodatku č.1
3	ZL č. 3 - změna založení	21.6.2018	21.8.2018		80 019,65 Kč	odsouhlaseno	červen/ červenec	vyfakturováno / září	součástí dodatku č.1
4	ZL č. 4 - sanace základové spáry	4.7.2018	21.8.2018		38 936,32 Kč	odsouhlaseno	červenec	vyfakturováno / září	součástí dodatku č.1
6	ZL č. 6 -těsnění dilatačních spar		11.10.2018		41 058,82 Kč	odsouhlaseno	srpen- říjen	nevyfakturováno	
8	ZL č. 8 - změna hydroizolace opěrné zdi		11.10.2018		-64 130,19 Kč	odsouhlaseno	srpen - říjen	nevyfakturováno	
9	ZL č.9 - vypuštění těsnicí vrstvy v násypu		11.10.2018		-36 488,54 Kč	odsouhlaseno	srpen - říjen	nevyfakturováno	
10	ZL10 - třída betonu OPZ		11.10.2018		71 232,94 Kč	odsouhlaseno	srpen - říjen	nevyfakturováno	
13	ZL13 - vjezdová vrata (doplnění specifikace)		17.10.2018		49 622,93 Kč	odsouhlaseno	listopad	nevyfakturováno	
14	Z14 -záměna vnitřních omítek		17.10.2018		-0,01 Kč	odsouhlaseno	říjen	nevyfakturováno	
Celkem:					562 276,92 Kč				

Celkem podepsané dodatkem č.1:	500 980,97 Kč
Celkem nepodepsané do dodatku č.2:	61 295,95 Kč

Vypracoval [redacted]

Aktualizace: 17.10.2018

(součtová kontrola)

562 276,92 Kč

