

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU AKUTNÍ MEDICINY“

který spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Smluvní strany:

1) Nemocnice Tábor, a.s.

se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

IČ: 26095203

DIČ: CZ26095203

právní forma: akciová společnost

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463

zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“);

2) PRADAST spol. s r.o.

se sídlem Nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice

zastoupený Ing. Petrem Steinbauerem

IČO: 60826053

DIČ: CZ60826053

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Petr Steinbauer

Ve věcech technických je oprávněn jednat stavbyvedoucí (autorizovaná osoba v oboru Pozemních staveb): Ing. Petr Steinbauer, číslo autorizace: 0101082

Společnost je zapsána v OR vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, příp. kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“ nebo též „Účastník dohody“)

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 1.3.2018 uzavřely na základě veřejné zakázky ev. č. ve VVZ: [Z2017-033102](#), interní č. VZ: 11/11/2017/OBCH Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy pavilonu akutní medicíny - Nemocnice Tábor, a.s. Vzhledem k tomu, že dochází ke změně Díla – dle změnových listů č. 14, 19, 25, 26, 27 smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

I.

Předmět Dodatku

- A) Smluvní strany se v souladu s čl. 2. smlouvy dohodly na **změně rozsahu Díla** specifikovaného v čl. II odst. 2.1. Smlouvy a jejich Příloze č. 2 (oceněný soupis prací s výkazem výměr), z důvodu změn uvedených v příloze tj. změnové listy 14, 19, 25, 26, 27 které jsou přílohou č. 1 Dodatku č.3 smlouvy a jeho nedílnou součástí.
- B) Smluvní strany se dále dohodly, v souvislosti se změnou rozsahu Díla, na **změně ceny Díla** dle **Čl. IV odst. 4.1.**

Cena za zhotovení Díla byla stanovena dohodou Smluvních stran na základě podkladů pro provedení Díla, a činí:

vícepráce	2.977.171,27 Kč
méněpráce	-2.628.869,73 Kč

Cena Díla celkem bez DPH : **56.664.132,03 Kč**

Cena dle souhrn. změnového listu č. 3 bez DPH 348.301,54 Kč

Cena Díla celkem (po změně provedené tímto Dodatkem č.3) bez DPH : **57.012.433,57 Kč**

Cena Díla je blíže specifikována ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (Příloha č.1 Dodatku Smlouvy).

V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

II.

Závěrečná ustanovení


1. Pokud není v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku význam definovaný ve Smlouvě.
2. Tento Dodatek je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti od data uveřejnění v registru. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Pro uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv se přiměřeně použijí ujednání odst. 12.7. Smlouvy.

4. Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z tohoto Dodatku nebo jakékoli ustanovení tohoto Dodatku (včetně jakéhokoli odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, neúčinným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku či Smlouvy tím zůstane nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná, neúčinná, nevymahatelná či zdánlivá ustanovení ustanoveními platnými, účinnými, vymahatelnými a nikoli zdánlivými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
5. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyř (4) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každý z Účastníků obdrží dvě (2) vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem nedochází k podstatné změně závazků ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento Dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že při uzavírání tohoto Dodatku nejedná v postavení slabší strany ve smyslu § 433 občanského zákoníku. Na důkaz toho připojují Smluvní strany vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Táboře dne

V Českých Budějovicích, dne

Nemocnice Tábor, a.s.
Ing. Ivo Houška, MBA,
předseda představenstva


PRADAST, spol. s r.o.
Ing. Petr Steinbauer
jednatel společnosti

Nemocnice Tábor, a.s.
MUDr. Jana Chocholová,
člen představenstva

Stavba:

Stavební úpravy pavilonu akutní medicíny- SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ č. 3

Datum vydání ZL

01.10.2018

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice
Objednatel:	Nemocnice Tábor a.s., kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Projektant:	AGP Nova spol.s r.o., Tř.28.října , 370 01 České Budějovice
TDS:	Tareka s.r.o., Ing. Pavel Strnad, Palackého 351/6, 390 01 Tábor

	vícepráce	méněpráce	rozdíl	
Cena bez DPH:	2 977 171,27 Kč	-2 628 869,73 Kč	348 301,54 Kč	
<u>Soupis změnových listů:</u>				
14	Řezání otvorů	263 376,00 Kč	-50 101,20 Kč	213 274,80 Kč
19	Venkovní žaluzie	332 575,56 Kč	-170 568,18 Kč	162 007,38 Kč
25	Střecha	409 017,12 Kč	-128 805,60 Kč	280 211,52 Kč
26	Podlaha	1 972 202,59 Kč	-2 154 191,63 Kč	-181 989,04 Kč
27	Řemesla konečné více a méněpráce	0 Kč	-125 203 Kč	-125 203,12 Kč

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum: Podpis
Objednatel: Nemocnice Tábor a.s. kpt.Jaroše 2000 390 03 Tábor	Datum: Podpis
Projektant: AGP Nova spol.s r.o., Tř.28.října 370 01 České Budějovice	Datum: Podpis
TDS: Tareka s.r.o. Palackého 351/ 390 01 Tábor	Datum: Podpis

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu medicíny - ZL č. 14
---------	---

Datum vydání ZL		03.09.2018
-----------------	--	------------

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice
Objednatel:	Nemocnice Tábor a.s., kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Projektant:	AGP Nova spol.s r.o., Tř.28.října , 370 01 České Budějovice
TDI:	Tareka s.r.o., Ing. Pavel Strnad, Palackého 351/6, 390 01 Tábor

Cena bez DPH:	213 274,80 Kč
---------------	----------------------

	vícepráce	méněpráce	rozdil
	263 376,00 Kč	-50 101,20 Kč	213 274,80 Kč

Popis změny technického řešení: Řezání otvorů

1) Řezání

Z důvodu zajištění bezproblémového provozu 263 376,00 Kč -50 101,20 Kč 213 274,80 Kč
 1NP a 2NP pavilonu bylo nutno zaměnit
 technologii bourání za technologii řezání

Příloha:rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum: Podpis
Objednatel: Nemocnice Tábor a.s. kpt.Jaroše 2000 390 03 Tábor	Datum: Podpis
Projektant: AGP Nova spol.s r.o., Tř.28.října 370 01 České Budějovice	Datum: Podpis
TDS: Tareka s.r.o. Palackého 351/ 390 01 Tábor	Datum: Podpis



ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Odpočet bourání otvorů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
A-01		A-01 Vnitřní kanalizace				-10 454,40	0,000
2	01-067	Vybourání otvorů v ŽB střepech plch.do 0,09 m2	kus	-48,000	217,80	-10 454,40	0,000
A-02		A-02 Vnitřní vodovod				-1 090,80	0,000
3	02-059	Vybourání otvorů v ŽB střepech plch.do 0,09 m2	kus	-4,000	272,70	-1 090,80	0,000
Celkem						-11 545,20	0,000

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Řezání konstrukce, vrtání otvorů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

96

Bourání konstrukcí

-38 556,00


0,000

1	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm vč. podpěrné kce a začištění	m3	-18,000	2 142,00	-38 556,00	0,000
---	-----------	---	----	---------	----------	------------	-------

Celkem

-38 556,00

0,000



ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Řezání stropní konstrukce nad 2.NP, vrtání otvorů pro prostupy mezi 2. a 3. NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

31	977151111 R	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm pro prostupy mezi 2. a 3.NP	Ks	6,000	564,00	3 384,00	0,008
33	977151122 R	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm pro prostupy mezi 2. a 3.NP	Ks	12,000	940,50	11 286,00	0,004
34	977151123 R	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D150 mm pro prostupy mezi 2. a 3.NP	Ks	14,000	1 410,00	19 740,00	0,011
35	977151124R	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D200 mm pro prostupy mezi 2. a 3.NP	Ks	18,000	1 692,00	30 456,00	0,007
36	977151128R	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm pro prostupy mezi 2. a 3.NP	Ks	8,000	2 850,00	22 800,00	0,006
2	977211111	Řezání otvoru pro výtahovou šachtu (posupné)	m2	6,500	4 850,00	31 525,00	0,000
3	977151123 R	Pomocné jádrovévrtání DN 150 mm pro vložení pily	ks	9,000	1 410,00	12 690,00	0,001
4	977211113	Řezání otvoru nad schodištěm (posupné)	m2	15,200	4 850,00	73 720,00	0,003
5	977151123 R	Pomocné jádrovévrtání DN 150 mm nad schodištěm pro vložení pily	ks	12,000	1 410,00	18 875,00	0,002
6	977211115	Manipulace a zabezpečení vývrtů proti pádu do 2.NP	kpl.	1,000	38 900,00	38 900,00	0,001

Celkem

263 376,00

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu medicíny - ZL č. 19
---------	---

Datum vydání ZL	03.09.2018
-----------------	------------

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice
Objednatel:	Nemocnice Tábor a.s., kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Projektant:	AGP Nova spol.s r.o., Tř.28.října , 370 01 České Budějovice
TDI:	Tareka s.r.o., Ing. Pavel Strnad, Palackého 351/6, 390 01 Tábor

Cena bez DPH:	162 007,38 Kč
---------------	----------------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	332 575,56 Kč	-170 568,18 Kč	162 007,38 Kč

Popis změny technického řešení: Venkovní žaluzie

1) Žaluzie

Odpočet m2 žaluzií typu Z z SOD. Připočet žaluzií typu C na plastová okna 332 575,56 Kč -170 568,18 Kč 162 007,38 Kč

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum: Podpis
Objednatel: Nemocnice Tábor a.s. kpt.Jaroše 2000 390 03 Tábor	Datum: Podpis
Projektant: AGP Nova spol.s r.o., Tř.28.října 370 01 České Budějovice	Datum: Podpis
TDS: Tareka s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Datum: Podpis



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby **Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny**

JKSO

Název objektu **Venkovní žaluzie na plastová okna**

EČO

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

14.11.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 332 575,56	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 332 575,56	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 332 575,56

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	332 575,56	69 840,87

Cena s DPH 402 416,43

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Venkovní žaluzie na plastová okna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
786	Čalounické úpravy	0,00	332 575,56	332 575,56	0,000	0,000
	Celkem	0,00	332 575,56	332 575,56	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Venkovní žaluzie na plastová okna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

786

Čalounické úpravy

332 575,56

1	R	786623121	D+M Venkovní předokenní žaluzie s viditelným boxem, box žaluzie je připevněn k hornímu rozšiřovacímu profilu okna spolu s vodícími lištami lamel, které jsou uchyceny po stranách oken, ovládání žaluzie ruční, typ "C"	m2	119,160	2 791,00	332 575,56
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

"nová okna 3np" 2,7*2*10+1,8*2*16+0,9*2*3+0,9*1,2*2

119,160

Součet

119,160

Celkem

332 575,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

JKSO

Název objektu: Odpočet rozdílu za žaluzie

EČO

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.11.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -170 568,18	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) -170 568,18	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -170 568,18

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-170 568,18	-35 819,32

Cena s DPH -206 387,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny
Objekt: Odpočet rozdílu za žaluzie

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
786	Čalounické úpravy	0,00	-170 568,18	-170 568,18	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-170 568,18	-170 568,18	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Odpočet rozdílu za žaluzie

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

786

Čalounické úpravy

-170 568,18

1	R	786623121	D+M Venkovní předokenní žaluzie s viditelným boxem, box žaluzie je připevněn k hornímu rozšiřovacímu profilu okna spolu s vodícími lištami lamel, které jsou uchyceny po stranách oken, ovládání žaluzií elektrické vypínačem vedle okna, typ "Z"	m2	-59,880	2 848,50	-170 568,18
			126,36-(59,28+1,8*2*2)		59,880		
			Součet		59,880		

Celkem

-170 568,18

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu medicíny - ZL č. 25
---------	---

	Datum vydání ZL.	16.04.2018
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice Tábor a.s., kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor	
Projektant:	AGP Nova spol. s r.o., Tř. 28. října, 370 01 České Budějovice	
TDI:	Tareka s.r.o., Ing. Pavel Strnad, Palackého 351/6, 390 01 Tábor	

Cena bez DPH:	280 211,52 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	409 017,12 Kč	-128 805,60 Kč	280 211,52 Kč

Popis změny technického řešení: Záměna spádování střechy

1) Záměna spádování střechy

Na základě prováděcí projektové dokumentace, statického výpočtu a z důvodu zlepšení funkce střechy a snazší údržby bylo provedeno přespádování střechy s využitím rozháněcích klínů. Dále byl proveden přípočet skladby střešní konstrukce v místě původní strojovny pro vzduchotechniku. Dále bylo na části z důvodu požadavku akustiky provedeno použití 2 vrstev OSB na střeše (odhlučnění VZT jednotek).

271 232,99 Kč -116 232,60 Kč 155 000,39 Kč

2) Lávka

Z důvodu možnosti bezpečného přístupu na střechu požadoval objednatel zhotovení lávky na střeše delšího krčku

102 596,63 Kč 0,00 Kč 102 596,63 Kč

3) Stmívače do světlovodů

Na základě požadavku objednatele byly doplněny 3ks stmívače do světlovodů

35 187,50 Kč 0,00 Kč 35 187,50 Kč


Dále došlo ke sjednocení výšky vlny trapézového plechu - bez dopadu do ceny

3) odpočet neprovedených střešních vtoků

12 573,00 Kč 12 573,00 Kč

Příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum:
	Podpis
Objednatel: Nemocnice Tábor a.s. kpt. Jaroše 2000 390 03 Tábor	Datum:
	Podpis
Projektant: AGP Nova spol. s r.o., Tř. 28. října 370 01 České Budějovice	Datum:
	Podpis
TDS: Tareka s.r.o. Palackého 351/ 390 01 Tábor	Datum:
	Podpis

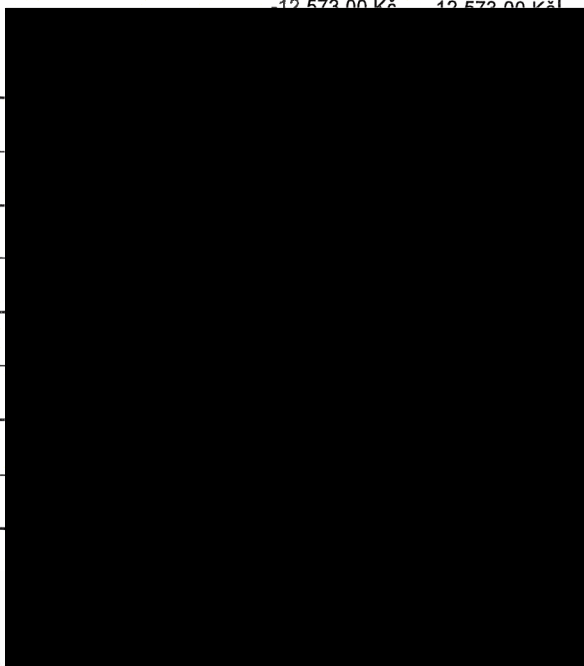

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		AG16-10-01 Stavební úpravy pavilonu akutní medicíny SO01 STAVEBNÍ ČÁST		Nová střecha - rozdílový rozpočet pro změnový list		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	712	Živičné krytiny				
122	63127280.A	Skelné rouno 1286*3*1,05	m2	-2 280,90	14,00	-31 932,60
125	712371801	Povlak.krytina střech,fólií PVC tm.šedá,kotvení vč.dod. fólie tl.2mm hydroizolační,odolná UV zář.	m2	1 686,00	-50,00	-84 300,00
Celkem za		712 Živičné krytiny				-116 232,60
		Nouzový přepad včetně montáže	ks	6,00	4 120,00	24 720,00
		Nouzový přepad				24 720,00
156	762421024	Obložení strop dřevoštěpkovou deskou 18 P+D šroub skladba S6:1286	m2	167,00	318,25	53 147,75
157	762341044	Bednění atik dřevoštěpková deska 18 P+D na rošt vč.desky a roštu horní část atiky_skladba S6:(262-47)*0,332	m2	250,63	494,95	124 049,32
		prostupy do střechy čtverec	ks	11,00	1 948,72	21 435,92
		prostupy do střechy kulaté	ks	76,00	630,00	47 880,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				246 512,99

Celkem bez DPH

155 000,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny	JKSO	
Název objektu	Lávka	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	07.11.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 9 017,62	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 59 889,65	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Extra nájezd jeřábu 19 100,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 14 589,36	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 83 496,63	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 19 100,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel




D Celkem bez DPH 102 596,63

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	102 596,63	21 545,29

Cena s DPH 124 141,92

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny
Objekt: Lávka

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 7. 11. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
767	Konstrukce zámečnické	9 017,62	74 479,01	83 496,63	0,582	0,001
	Celkem	9 017,62	74 479,01	83 496,63	0,582	0,001

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Lávka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

767

Konstrukce zámečnické

83 496,63

0,582

1	137001	Konstrukce lávky konstrukce šroubovaná, pozink	kg	476,270	121,00	57 628,67	0,476
6	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	106,000	27,70	2 936,20	0,106
3	13814223	pororošt stupeň 270x900mm	kus	6,000	944,40	5 666,40	0,000
4	13814183	pororošt 600x1000mm	kus	2,000	1 338,00	2 676,00	0,000
5	72531092.R	D+M gumová rohož	m2	8,400	1 662,00	13 960,80	0,000
7	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,582	1 080,00	628,56	0,000

Celkem

83 496,63

0,582

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby **Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny**

JKSO

Název objektu **Stmivače denního osvětlení**

EČO

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

08.10.2018


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	35 187,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		35 187,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel




D Celkem bez DPH 35 187,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	35 187,50	7 389,38

Cena s DPH 42 576,88

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny
Objekt: Smlívače denního osvětlení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 10. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	35 187,50	35 187,50	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	35 187,50	35 187,50	0,000	0,000
	Celkem	0,00	35 187,50	35 187,50	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Stmívače denního osvětlení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				35 187,50	0,000
	767	Konstrukce zámečnické				35 187,50	0,000
1	767330131	D+M stmívače denního osvětlení	kus	3,000	10 487,50	31 462,50	0,000
2	767330132	Rozebrání a zpětná instalace dvou světlovdů	kus	2,000	1 862,50	3 725,00	0,000
		Celkem				35 187,50	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Odpočet střešních vpustí

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

A-01




A-01 Vnitřní kanalizace

-12 573,90

1	R	01-054	montáž střešních vtoků plastových DN 100	ks	-2,000	146,70	-293,40
2	R	01-055	stř.vtok HL62.1H/1 se svislým odtokem DN100, kapac.,průtok max 10,70 l/s	ks	-2,000	4 210,00	-8 420,00
3	R	01-056	nástavec střeš.vtoku HL65P s PVC izolační přírubou	ks	-2,000	1 930,25	-3 860,50

Celkem

-12 573,90

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu medicíny - ZL č.26		
	Datum vydání ZL	03.09.2018	
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice Tábor a.s., kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor		
Projektant:	AGP Nova spol.s r.o., Tř.28.října , 370 01 České Budějovice		
TDI:	Tareka s.r.o., Ing. Pavel Strnad, Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:	-181 989,04 Kč		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	1 972 202,59 Kč	-2 154 191,63 Kč	-181 989,04 Kč
<u>Popis změny technického řešení: Záměna skladby podlahy</u>			
<u>1) Podlaha</u>			
	1 961 002,59 Kč	-2 090 543,63 Kč	-129 541,04 Kč
<u>2) Dveře do instalačního jádra</u>			
Projekt neřešil revizní dveře do velkého instalační jádra 338	11 200,00 Kč	0,00 Kč	11 200,00 Kč
<u>3) Odpočet neprovedených položek</u>			
prodloužení stoupaček pol. 154	0,00 Kč	-36 000,00 Kč	-36 000,00 Kč
plech hladký pol. 202	0,00 Kč	-27 648,00 Kč	-27 648,00 Kč
Příloha: rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice Tábor a.s. kpt.Jaroše 2000 390 03 Tábor	Datum:		
	Podpis		
Projektant: AGP Nova spol.s r.o., Tř.28.října 370 01 České Budějovice	Datum:		
	Podpis		
TDS: Tareka s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Datum:		
	Podpis		

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Změna skladby podlahy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV HSV 1 961 002,59 75,405

A33 Nová skladba podlahy 1 961 002,59 75,405

6	A33.1	Položení podlah šroubováním	m2	1 293,000	479,71	620 265,03	0,000
12	59030961.FMC	2 E 22 (EE 25) podlahový prvek fermacell,	m2	1 486,950	368,80	548 387,16	43,716
10	590421300	obvodový pás mirelon	m2	1 034,400	55,33	57 233,35	0,010
13	59030969.FMC	Vyrovnávací podsyp fermacell 0-4 mm, 50 l pytel (20kg)	litr	77 580,000	6,76	524 440,80	28,705
11	A33.1.a	Položení podlah - izolace Steico	m2	1 293,000	25,81	33 372,33	0,000
8	607151600	deska STEICO tl.20mm	m2	1 486,950	119,24	177 303,92	2,974

Celkem 1 961 002,59 75,405

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby **Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny**

Název objektu **Změna skladby podlahy**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

26.11.2018


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -2 090 543,63	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) -2 090 543,63	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel




D Celkem bez DPH -2 090 543,63

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-2 090 543,63	-439 014,16

Cena s DPH -2 529 557,79

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Změna skladby podlahy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 11. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	-353 342,51	-353 342,51	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	0,00	-222 431,28	-222 431,28	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	-1 514 769,84	-1 514 769,84	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-2 090 543,63	-2 090 543,63	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Změna skladby podlahy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
63		Podlahy a podlahové konstrukce				-353 342,51	0,000
1	632415210	Potěr samonivelační strojně hlazený tl. 9mm	m2	-1 499,756	235,60	-353 342,51	0,000
713		Izolace tepelné				-222 431,28	0,000
4	286007629	Měkčená folie z pěnového polyetylenu	m2	-1 415,043	21,00	-29 715,90	0,000
2	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm EPS T3500	m2	-1 347,660	125,00	-168 457,50	0,000
3	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	-1 347,660	18,00	-24 257,88	0,000
762		Konstrukce tesařské				-1 514 769,84	0,000
5	762512245	Položení podlah šroubováním včetně dodávky, deska cementovláknitá tl. 22 mm	m2	-2 695,320	562,00	-1 514 769,84	0,000
Celkem						-2 090 543,63	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny	JKSO	
Název objektu	Dveře do instalačního jádra	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.11.2018	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 11 200,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 11 200,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">11 200,00</td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">11 200,00</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">13 552,00</td> </tr> <tr> <td>E Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	11 200,00	DPH % Základ daně DPH celkem		snížená 15,0	0,00	základní 21,0	11 200,00	Cena s DPH	13 552,00	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	11 200,00																		
DPH % Základ daně DPH celkem																			
snížená 15,0	0,00																		
základní 21,0	11 200,00																		
Cena s DPH	13 552,00																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Dveře do instalačního jádra

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 11. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	11 200,00	11 200,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	11 200,00	11 200,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	11 200,00	11 200,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Dveře do instalačního jádra

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				11 200,00	0,000
	767	Konstrukce zámečnické				11 200,00	0,000
1	767691823	Dveře do instalačního jádra	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	0,000
		Celkem				11 200,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny	JKSO	
Název objektu	Měněpráce	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.12.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C				
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby				
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00		
2	Montáž	-63 648,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00		
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00		
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00		
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00		
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř.)	-63 648,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		-63 648,00		
				DPH		%	Základ daně	DPH celkem
				snížená		15,0	0,00	0,00
				základní		21,0	-63 648,00	-13 366,08
				Cena s DPH				-77 014,08
				E Přípočty a odpočty				
				Dodá zadavatel			0,00	
				Klouzavá doložka			0,00	
				Zvýhodnění			0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Měněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 12. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
720	Zdravotechnická instalace	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	-27 648,00	-27 648,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-63 648,00	-63 648,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
720		Zdravotechnická instalace				-36 000,00	0,000
1	72001	Prodloužení stávajících stoupaček (VZT, ZTI) na novou střechu dl. 5 m	kus	-30,000	1 200,00	-36 000,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické				-27 648,00	0,000
2	13756580	Plech hladký	T	-1,152	24 000,00	-27 648,00	0,000
Celkem						-63 648,00	0,000

Stavba:	Stavební úpravy pavilonu medicíny - ZL č.27
---------	--

Datum vydání ZL	03.09.2018
-----------------	------------

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice
Objednatel:	Nemocnice Tábor a.s., kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Projektant:	AGP Nova spol.s r.o., Tř.28.října , 370 01 České Budějovice
TDI:	Tareka s.r.o., Ing. Pavel Strnad, Palackého 351/6, 390 01 Tábor

Cena bez DPH:	-125 203,12 Kč
---------------	-----------------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	0,00 Kč	-125 203,12 Kč	-125 203,12 Kč

<u>Popis změny technického řešení: Řemesla</u>			
1) odpočet řemesla ZTI	-72 859,40 Kč	-72 859,40 Kč	
2) odpočet řemesla ÚT	-2 079,00 Kč	-2 079,00 Kč	
3) konečné méněpráce	-50 264,72 Kč	-50 264,72 Kč	
Příloha: rozpočet			

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum:
	Podpis
Objednatel: Nemocnice Tábor a.s. kpt.Jaroše 2000 390 03 Tábor	Datum:
	Podpis
Projektant: AGP Nova spol.s r.o., Tř.28.října 370 01 České Budějovice	Datum:
	Podpis
TDS: Tareka s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Datum:
	Podpis



Položkový rozpočet

Stavba :	AG16-10-01 Stavební úpravy pavilonu akutní medicíny	Rozpočet: 4	
Objekt :	SO04 ZDRAVOTNÍ INSTALACE	ZDRAVOTNÍ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
Díl: A-01		A-01 Vnitřní kanalizace					
4	01-004	NG-DN100 vodou 60°C, krátkodobé, zařízení horkou vodou 97°C, dlouhodobé zatížení, horkou vodou 95°C min. 10 min.	m	-8,00	1 199,70	-9 597,60	indiv.
60	01-061	upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C)	m	-12,00	19,80	-237,60	indiv.
72	01-073	kanalizace vnitřní v objektech výšky do 12 m	t	0,00	0,00	0,00	indiv.
Celkem za		A-01 A-01 Vnitřní kanalizace				-9 835,20	
Díl: A-02		A-02 Vnitřní vodovod					
81	02-009	PPR 25 Plastové polypropylenové potrubí, typové řady PP-R3 (provedení STABI) PN20	m	-6,00	210,00	-1 260,00	indiv.
90	02-018	upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C)	m	-6,00	28,80	-172,80	indiv.
94	02-022	montáž do DN 25 Ochrana potrubí, Termoizolační pásy bez samolepicího uzávěru	m	-6,00	11,70	-70,20	indiv.
96	02-024	hadice 22/6 mm Termoizolační pásy	m	-6,00	35,10	-210,60	indiv.
124	02-052	vodoměr závitový G3/4' (100°C) - montáž	soub	-1,00	148,50	-148,50	indiv.
125	02-053	bytový vodoměr PREMEX typ Jm3-V3 (studená voda)	soub	-1,00	559,80	-559,80	indiv.
160	05-024	příslušenství dřezu v kuchyňské sestavě	soub	-14,00	544,50	-7 623,00	indiv.
172	05-037	dvířka plastová z PH rozm. 15/30 cm	ks	-1,00	183,60	-183,60	indiv.
173	05-038	speciální zakrytá dvířka s možností povrchové úpravy keram.obkladem rozm. 30/30 cm (magnetická)	soub	-19,00	346,50	-6 583,50	indiv.
174	05-039	úpravy keram.obkladem rozm. 30/30 cm (magnetická)	soub	-19,00	544,50	-10 345,50	indiv.
Celkem za		A-02 A-02 Vnitřní vodovod				-27 157,50	
Díl: A-05		A-05 Zařizovací předměty					
137	05-001	A1 samostatné textové části TABULKY, která slouží zároveň jako obecně závazný standard je součástí výpisu materiálů této	soub	-1,00	7 980,00	-7 980,00	indiv.
143	05-007	B1 samostatné textové části TABULKY, která slouží zároveň jako obecně závazný standard je součástí výpisu materiálů této	soub	-1,00	8 120,00	-8 120,00	indiv.
146	05-010	C2	soub	-1,00	16 614,00	-16 614,00	indiv.
156	05-020	mont.klozetů diturvit. komplet ostatních typů	soub	-1,00	534,60	-534,60	indiv.
157	05-021	montáž umyvadel ostatních typů	soub	-1,00	311,40	-311,40	indiv.
159	05-023	montáž sprch ostatních typů	soub	-1,00	1 534,50	-1 534,50	indiv.
165	05-029	montáž bat.stojánkových ost.typů,s ker.kartuší, záruka min.5let	soub	-1,00	223,20	-223,20	indiv.
166	05-030	montáž bat.nástěnných G1/2x150 ost.typů	soub	-1,00	247,50	-247,50	indiv.
168	05-032	mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150 s nastavitelnou výškou sprchy,s ker.kartuší, záruka min.5let	soub	-1,00	272,70	-272,70	indiv.
170	05-035	mont.zápach uzávěrky umyvadlové do DN 40	ks	-1,00	28,80	-28,80	indiv.
Celkem za		A-05 A-05 Zařizovací předměty				-35 866,70	
POZNÁMKA:						- K	

-72 859,40

Položkový rozpočet

Stavba :	AG16-10-01 Stavební úpravy pavilonu akutní medicíny	Rozpočet: 4
Objekt :	Ústřední vytápění	ZDRAVOTNÍ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
77	85	KLC1220.600 RAL 9016 Otopné těleso - trubkové horní a spodní připojení..	ks	-1,00	2 079,00	-2 079,00
Celkem za <i>Ústřední vytápění</i>						-2 079,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny	JKSO	
Název objektu	Konečné méněpráce	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
	Dne		
	14.11.2018		


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -50 264,72	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) -50 264,72	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel




D Celkem bez DPH -50 264,72

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-50 264,72	-10 555,59

Cena s DPH -60 820,31

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Tábor - pavilon akutní medicíny

Objekt: Konečné méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
713		Izolace tepelné				-15 415,01	0,000
2	713121118	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky dilatace - DLE PD	m	-237,154	65,00	-15 415,01	0,000
771		Podlahy z dlaždic a obklady				-7 983,36	0,000
1	771577131	Hrana schodů z nerezového profilu	m	-50,400	158,40	-7 983,36	0,000
776		Podlahy povlakové				-20 616,75	0,000
8	776981121	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin	m	-83,300	247,50	-20 616,75	0,000
786		Čalounické úpravy				-6 249,60	0,000
3	786622211	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2	-10,080	620,00	-6 249,60	0,000
Celkem						-50 264,72	0,000
