

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 210/2018

na kompletní realizaci stavby

„Rekultivace odkaliště Lipina“**Objednatel:****Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace

se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

bankovní spojení: ██████████/██████, ██████████

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:**AQUATEST a. s.**

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

zastupuje: Daniel Kraft, předseda představenstva

IČO: 44794843

DIČ: CZ44794843

bankovní spojení: ██████████/██████, ██████████

e-mail: ██████████, telefon: +420 ██████████

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

d o d a t e k.**I.****Prohlášení smluvních stran**

Dne 03.08.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. SD 210/2018, jejímž předmětem byla kompletní rekultivace odkaliště Lipina.

II.**Změnová ujednání**

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:



Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH **6 676 734,15 Kč**

DPH **1 402 114,17 Kč**

Cena celkem včetně DPH **8 078 848,32 Kč**

(slovy: osmmilionůsmdesatosmtisícsmsetčtyřicetosm korun českých a třicetdva haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

3. V návaznosti na provedení víceprací se čl. 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.1. pododstavec 3.1.3 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

3.1.3. Termín pro předání a převzetí díla

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

do 7 měsíců od předání a převzetí staveniště.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

dne 20 -12- 2018

za organizace
Ing. Jiří Machek, ředitel
Kladrub nad Labem č.p. 1
CZ720 288 000 000
za objednatele

V Praze

dne 12 -12- 2018

Daniel Kraft, předseda představenstva
za zhotovitele

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 vyhotovený dne 11.12.2018 (pevně připojená příloha)

Příloha č. 2 - Harmonogram prací (volně připojená příloha)

ZMĚNOVÝ LIST

Odtěžení uložených kalů - odkaliště Lipina			
SoD	SD210/2018		číslo ZL:
objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem		ZL 1
zhotovitel:	Aquatest a.s. Praha 5 IČ : 44794843		
název ZL:	Odtěžení uložených kalů		
předmět změny:	Likvidace kalů		
zdůvodnění:	Dle PD se předpokládala mocnost vrstvy kalů 2m. Dle laboratorních rozborů je vzhledem k zasažení dna předpokládaná mocnost 2,2m. Přesné objemy budou stanoveny po skončení prací na základě vážních lístků z uložení kalů		
	rozpočet:	v příloze ZL	
	cena:	bez DPH	282 408,75 Kč
		21%DPH	59 305,84 Kč
		celkem	341 714,59 Kč
vliv na cenu díla:	ANO		celkem ZL
		cena:	bez DPH 6 676 734,15 Kč
		21%DPH	1 402 114,17 Kč
		celkem	8 078 848,32 Kč
vliv na termín dokončení:	ANO		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE	- specifikace	
přílohy :	1. rozpočet ZL		
podpis zhotovitele:	[redacted]	[redacted]	Datum []
vyjádření TDI :	[redacted]	[redacted]	Datum 17.12.2018
vyjádření investora :	[redacted]	[redacted]	Datum 17.12.2018

Změnový list č.1

Stavba: Odtěžení uložených kalů - odkaliště Lipina							
Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Zhotovitel: AQUATEST a.s., Praha 5 Místo: Kladruby nad Labem						11.12.2018	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava

HSV Práce a dodávky HSV

282 408,75

1 Zemní práce

18 720,00

7	K	131201103	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 <i>"technická zpráva B, kap. B.8, odst. h)" 2340</i>	m3	234,000	30,00	7 020,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	234,000	30,00	7 020,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4	m3	234,000	20,00	4 680,00	CS ÚRS 2017 01
							263 688,75	
		D Ostatní						
12	K	ODP011d	Přeprava odpadů k odstranění <i>objemová hmotnost 1500kg/m3</i>	t	351,000	181,25	63 618,75	
13	K	ODP020	Odstranění vytěžených kalů a kontaminované zeminy v souladu s legislativou <i>objemová hmotnost 1500kg/m3</i>	t	351,000	570,00	200 070,00	

Časový harmonogram realizace díla

Rekultivace odkaliště Lipina - Národní hřebčín Kladruby nad Labem

	3.9.-9.9.	10.9.-16.9.	17.9.-23.9.	24.9.-30.9.	1.10.-7.10.	8.10.-14.10.	15.10.-21.10.	22.10.-28.10.	29.10.-4.11.	5.11.-11.11.
činnost/týden	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
dokumentace a inženýrská činnost										
příprava území										
instalace zařízení staveniště, dekontaminační stanice, úprava komunikací										
odvodnění odkaliště kalů před odtěžbou a odvozem kalů										
odvodnění odkaliště kalů během odtěžby a přípravy *										
příprava (bagrista) - bagrovací práce před odvozem kalů										
odtěžení a odvoz kalů zeminy (bagrista + odvoz)								498,66 tun	408,92 tun	
bourání opevnění, demontáž oplocení										
terénní úpravy, rekultivace území, úprava cest										
dodání zeminy										
sanační monitoring, sled a řízení prací								vzorkování		

Poznámky:

* odvodnění - sanační práce - sčerpávání vody během odtěžby a odvozu kalů - není kontinuální - cca 2 x týdně/půl dne - podle potřeby
ds - dekontaminační sanační stanice


5.1.- 6.11. - skládka nepřijímá

** xxx tun - ideální týdenní odvoz kalů na skládku při nejlepší konstelaci (skládka nepojme víc jak 100 tun kalů naší konzistence denně)


harmonogram je zpracován na cca 4300 tun odvozu kalů a zemin dle projektu a dalších propočtů dle prací, byl upravován dle skutečnosti a dle okolností (počasí...)

zpracovala: [redacted], řešitel zakázky

10.12.2018



12.11.-18.11.	19.11.-25.11.	26.11.-2.12.	3.12.-9.12.	10.12.-16.12.	17.12.-23.12.	24.12.-30.12.	31.12.-6.1.	7.1.-13.1.19	14.1.-20.1.19	21.1.-27.1.19	28.1.-3.2.19	4.2.-10.2.19	11.2.-17.2.19	18.2.-24.2.19	25.2.-3.3.19
46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								odvoz ds							
16.11.konec čerpání															
269,52 tun	374,78	446,64	185,26	**500 tun	**300 tun		**200 tun	**400 tun	**400 tun	zbytek					
KD		KD		KD											

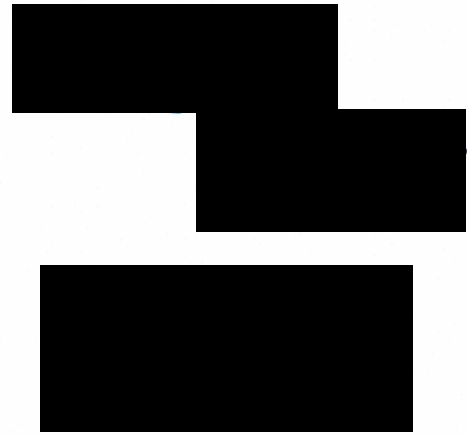

IC: 25078045 DIČ
 233 14 Křižíkova
 a.s. Hluboká nad Vltavou
 MYSLOUBA HNECENÍ K.V.



✓
