

DODATEK č.9 SMLOUVY O DÍLO

č. S/RVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 52
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8.)

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Skalický, pověřen řízením

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 4, 150 5 Praha 5 Smíchov
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1930

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01, na základě plné moci

IČ: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 1, se SMLOUVA O DÍLO č. S/RVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKU č. 1 ze dne 13. 8.2010, DODATKU č. 2 ze dne 15.10.2010, DODATKU č. 3 ze dne 29.03.2011, DODATKU č. 4 ze dne 15.06.2011, DODATKU č. 5 ze dne 26.10.2011, DODATKU č. 6 ze dne 24.02.2012, DODATKU č. 7 ze dne 9.7.2012 a DODATKU č. 8 ze dne 30.01.2013 upravuje takto:

- 1) Z důvodu časové náročnosti a složitosti jednání s dotčenými institucemi, se v čl. IV. „TERMÍN PLNĚNÍ“ vypouští původní odst. 1 a nahrazuje se novým odst. 1 v tomto znění:
1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí do 31.12.2013
- 2) Z výše uvedeného důvodu se dále v čl. IV. „TERMÍN PLNĚNÍ“ vypouští z původního odst. 2 text:

Zajištění záborového elaborátu a jeho aktualizace při provádění majetkoprávní přípravy (dle čl. II, odst. 1, odrážka 2 smlouvy o dílo)	do 30.6.2013	do 30.6.2013	do 30.6.2013
--	--------------	--------------	--------------

a nahrazuje se v tomto odst. 2 novým textem v tomto znění:


Dílčí plnění / SO	SO 209	SO 210	SO 211
Zajištění záborového elaborátu a jeho aktualizace při provádění majetkoprávní přípravy (dle čl. II, odst. 1, odrážka 2 smlouvy o dílo)	do 31.12.2013	do 31.12.2013	do 31.12.2013

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKU č. 1 ze dne 13. 8.2010, DODATKU č. 2 ze dne 15.10.2010, DODATKU č. 3 ze dne 29.03.2011, DODATKU č. 4 ze dne 15.06.2011, DODATKU č. 5 ze dne 26.10.2011, DODATKU č. 6 ze dne 24.02.2012, DODATKU č. 7 ze dne 9.7.2012 a DODATKU č. 8 ze dne 30.01.2013, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.


V Praze dne 25.6.2013

Za OBJ

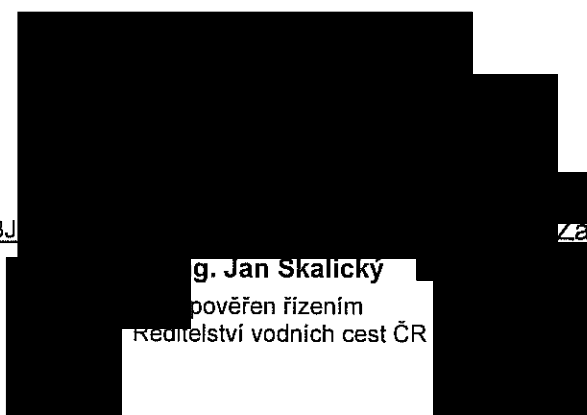


g. Jan Skalický

pověřen řízením
Ředitelství vodních cest ČR

① 
Ředitelství
vodních
cest
ČR
Vinohradská 184, 130 52 Praha 3

Za ZHOTOVITELE.....



Ing. J. Trýba

ředitel divize 01
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.


VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-9-
