

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 17\_017 ze dne 20. 6. 2017 uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

### Smluvní strany

**Zhotovitel:** **Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní dopravní studio**  
 fyzická osoba, podnikatel  
 sídlo: Gorkého 59/9, 602 00 Brno – Veveří  
 kancelář: Františkánská 6, 602 00 Brno  
 IČ: 64313743  
 DIČ: CZ5705302526  
 bankovní spojení: Raiffeisen Bank, pob. Brno, Jánská 1/3, 602 00 Brno  
 č.účtu : 535084001/5500

tel. oprávněné osoby: +420 604 730 164  
 e-mail: jebavy@ados.cz

*(dále jen „zhotovitel“)*

a

**Objednatel:** **město Uherské Hradiště**  
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
 IČ: 00291471  
 DIČ: CZ00291471  
 bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště  
 zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města  
 ve věcech technických: Ing. Petr Baxa – odbor investic, 572 525 275, 730 812 527  
 e-mail: petr.baxa@mesto-uh.cz

*(dále jen „objednatel“)*

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 17\_017 na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Cyklotrasa Mojmir v Uherském Hradišti“, kterou změnily dne 5. 3. 2018 dodatkem č. 1 a následně dne 12. 7. 2018 dodatkem č. 2 (smlouva ve znění dodatků dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem č. 3 se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatek č. 3 je uzavírán na základě požadavku objednatele, s ohledem na vzniklé komplikace v souvislosti s plánovaným kácením dřevin v 1. a 2. úseku původní trasy cyklotrasy (1. úsek - etapa Hráz 1 a 2. úsek - etapa Hráz 2). Důvodem je nesouhlas orgánu ochrany přírody a správy zeleně s vyvolaným kácením stromů při vedením cyklotrasy po vzdušné patě hráze. Jejich pokácením by v několika případech nebyla splněna podmínka udržitelnosti dříve realizovaného dotačního projektu. Zhotovitel předložil v případě 1. úseku nový návrh trasy s dotčením pozemků, na kterých nedojde při realizaci stavby k významnému zásahu do stávající zeleně, přičemž 2. úsek – etapa Hráz 2 byl celý zrušen. V 3. úseku – etapa Škola se nebude realizovat úprava chodníku vedeného na zrušený 2. úsek- etapa Hráz 2 (v situaci č.v.C2 objekt SO 102 a SO 103). Ostatní úseky zůstávají beze změny.

Tato změna trasy se promítne do všech stupňů PD. Současně bude nutno znovu zajistit projednání PD a vydání kladných stanovisek a vyjádření dotčených subjektů v rámci územního řízení a v dalším stupni stavebního řízení.

Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem č. 3 se mění předmět plnění smlouvy, což má vliv na cenu díla a termín plnění.

JK

Tímto dodatkem se vedle změny předmětu plnění v rozsahu uvedeném shora mění smlouva dále tak, že:

v článku 4. **Termíny a místo plnění, odst. 4.3.1.2.** se termín pro vyhotovení a předání upravené dokumentace pro územní řízení (DUR III) objednateli sjednává na 30 dnů ode dne podpisu Dodatku č.3 oběma smluvními stranami. Termín předání DUR III včetně vyjádření dotčených orgánů k DUR III se sjednává na 60 dnů od podpisu Dodatku č.3 oběma smluvními stranami.

v článku 4. **Termíny a místo plnění, odst. 4.3.1.3.** se termín pro vyhotovení a předání dokumentace pro stavební řízení (DSP) objednateli sjednává na 60 dnů od vydání územního rozhodnutí. Termín předání DSP včetně vyjádření dotčených orgánů k DSP se sjednává na 150 dnů od vydání územního rozhodnutí.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. dokladové části, výkazu výměr a rozpočtu bude vyhotovena a předána objednateli do 150 dnů od vydání územního rozhodnutí.

Lhůty plnění mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

v článku 5. **Cena za předmět díla, se odstavce 5.1.3 , 5.1.4 a 5.1.5** ruší a nahrazují novými, a to v následujícím znění:

5.1.3 Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Cena bez DPH	197.230,- Kč
Výše DPH	41.418,- Kč
Cena včetně DPH	238.648,- Kč

5.1.4 Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Cena bez DPH	110.366,- Kč
Výše DPH	23.177,- Kč
Cena včetně DPH	133.543,- Kč

5.1.5 Inženýrská činnost

Cena bez DPH	128.232,- Kč
Výše DPH	26.929,- Kč
Cena včetně DPH	155.161,- Kč

Za odstavec 5.1.6 se doplňuje nový odstavec 5.1.7, který zní:

5.1.7 Úprava dokumentace pro územní řízení (DUR III)

Cena bez DPH	43.000,- Kč
Výše DPH	9.030,- Kč
Cena včetně DPH	52.030,- Kč

v článku 5. **Cena za předmět díla** se s ohledem na shora sjednané změny **odstavec 5.1. Cena celkem za úplné provedení díla a úplný výkon požadovaných služeb** ruší a nahrazuje novým, a to v následujícím znění:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>805.333,- Kč</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>169.120,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>974.453,- Kč</b>

**Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.**

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.



Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 988/59/RM/2017/Veřejný ze dne 30. 5. 2017.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č.1 – Cenová nabídka ze dne 3. 1. 2019

V Uherském Hradišti, dne 21-01-2019

V Brně, dne 9.1. 2019

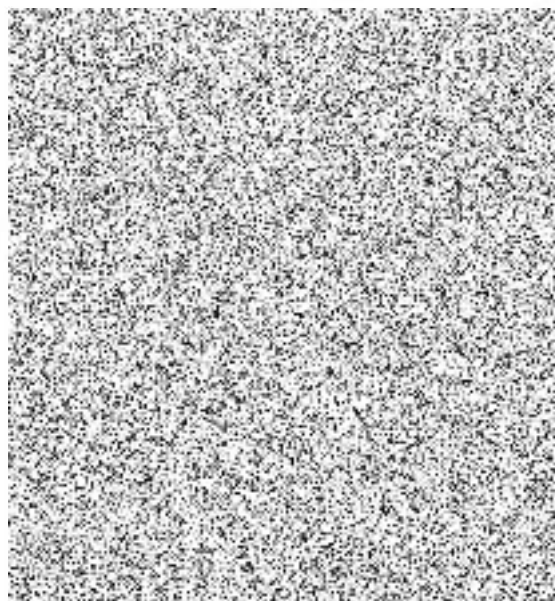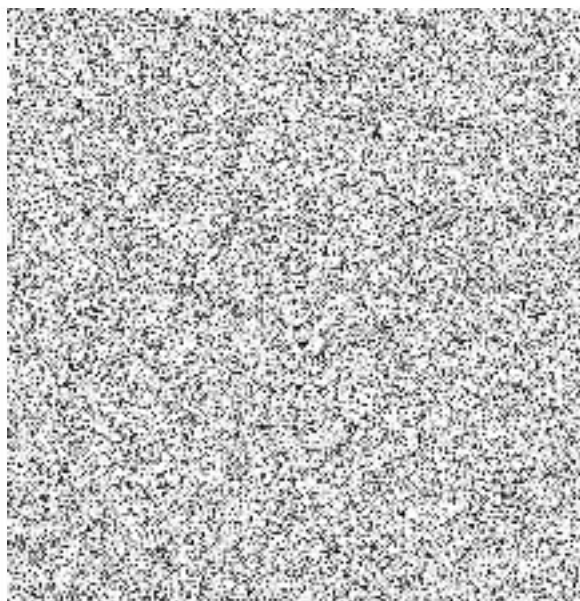

Handwritten mark or signature in the bottom left corner.

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

**CYKLOTRASA MOJMÍR V UHERSKÉM HRADIŠTI - DODATEK III**

**A. Údaje o uchazeči**

UCHAZEČ	
Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)	<b>Ing. Adolf Jebavý</b>
Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Sídlo: (jedná-li se o právnickou osobu)	Gorkého 59/9, 602 00 Brno
Místo podnikání (jedná-li se o fyzickou osobu)	Františkánská 6, 602 00 Brno
- celá adresa včetně PSČ	
Právní forma:	OSVČ
Identifikační číslo:	643 13 743
Daňové identifikační číslo:	CZ5705302526
Statutární zástupce	Ing. Adolf Jebavý
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Ing. Adolf Jebavý
Telefon	420 604 730 164
Fax	
E-mail	<a href="mailto:jebavy@ados.cx">jebavy@ados.cx</a>

**B. Cenová nabídka**

	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (KČ)	DPH (KČ)	NABÍDKOVÁ CENA VČ. DPH (KČ)
Zajištění podkladů	55 000 Kč	12 160 Kč	70 180 Kč
DUR projekční I	182 120 Kč	38 245 Kč	220 365 Kč
DUR projekční II	86 385 Kč	18 141 Kč	104 526 Kč
DUR projekční III	<b>43 000 Kč</b>	<b>9 030 Kč</b>	<b>52 030 Kč</b>
DUR inženýrská I	62 768 Kč	13 181 Kč	75 949 Kč
DUR inženýrská II	21 948 Kč	4 609 Kč	26 557 Kč
DUR inženýrská III	6 000 Kč	1 260 Kč	7 260 Kč
DSP projekční	197 230 Kč	41 418 Kč	238 648 Kč
DSP inženýrská	37 516 Kč	7 878 Kč	45 394 Kč
DPS	110 366 Kč	23 177 Kč	133 543 Kč
<b>Celková cena</b>	<b>805 333 Kč</b>	<b>169 120 Kč</b>	<b>974 453 Kč</b>

**UPŮZORNĚNÍ**


Do krycího listu nelze doplňovat žádné jiné než požadované údaje. Celková cena v krycím listu musí být totožná s údaji obsaženými v návrhu smlouvy

**C. Termínová nabídka**

DUR projekční III	30 dnů od podpisu dodatku
DUR inženýrská III	60 dnů od podpisu dodatku
DSP projekční	60 dnů od vydání územního rozhodnutí
DSP inženýrská	150 dnů od vydání územního rozhodnutí
DPS	150 dnů od vydání územního rozhodnutí

V Brně

03.01.2019



# CYKLISTICKÁ STEZKA MOJMÍR UH

100%

		KOMUNIKACE	OSTATNÍ
Odhad stavebních nákladů			
CYKLOSTEZKA HRÁZ 01	0.000-0.306	2 239 004 Kč	398 000 Kč
KOMUNIKACE			
OSTATNÍ			
CYKLOSTEZKA HRÁZ 02	0.000-0.146.85	- Kč	- Kč
KOMUNIKACE			
OSTATNÍ			
CYKLOSTEZKA ŠKOLA	0.395-0.741.44	10 150 010 Kč	2 151 028 Kč
KOMUNIKACE			
OSTATNÍ			
CYKLOSTEZKA ŠKOLKA	0.750-0.930	1 131 220 Kč	501 582 Kč
KOMUNIKACE			
OSTATNÍ			
Odhad stavebních nákladů		13 520 234 Kč	3 050 610 Kč
UNIKA		13 520 234 Kč	3 050 610 Kč
		770 000 Kč	281 100 Kč

**Cena**

<b>PODKLADY</b>			
Zaměření			10 000 Kč
Geologický průzkum			48 000 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>			<b>58 000 Kč</b>
DPH			12 180 Kč
<b>CELKEM S DPH</b>			<b>70 180 Kč</b>
<b>DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ I</b>			
Dokumentace pro územní rozhodnutí projekční část			182 120 Kč
Dokumentace pro územní rozhodnutí inženýrská část			62 768 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>			<b>244 888 Kč</b>
DPH			51 426 Kč
<b>CELKEM S DPH</b>			<b>296 314 Kč</b>
<b>ÚPRAVA DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ II</b>			
Dokumentace pro územní rozhodnutí projekční část			86 385 Kč
Dokumentace pro územní rozhodnutí inženýrská část	102 505 Kč		21 948 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>			<b>108 333 Kč</b>
DPH			22 750 Kč
<b>CELKEM S DPH</b>			<b>131 082 Kč</b>
<b>ÚPRAVA DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ III</b>			
Dokumentace pro územní rozhodnutí projekční část			43 000 Kč
Dokumentace pro územní rozhodnutí inženýrská část	33 816 Kč		6 000 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>			<b>49 000 Kč</b>
DPH			10 290 Kč
<b>CELKEM S DPH</b>			<b>59 290 Kč</b>
<b>DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ III</b>			
Dokumentace pro stavební povolení projekční část			197 230 Kč
Dokumentace pro stavební povolení inženýrská část	45 394 Kč		37 516 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>			<b>234 746 Kč</b>
DPH			49 297 Kč
<b>CELKEM S DPH</b>			<b>284 042 Kč</b>
<b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY III</b>			
Dokumentace pro provedení stavby			110 366 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>			<b>110 366 Kč</b>
DPH			23 177 Kč
<b>CELKEM S DPH</b>			<b>133 543 Kč</b>
<b>CENA CELKEM</b>			
Cena celkem bez DPH			805 333 Kč
DPH			169 120 Kč
Cena včetně DPH			<b>974 453 Kč</b>

**ADOS**
