



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo Objednatele: S-1691/DOP/2018

číslo Dodavatele: AV.18005.1.150

„Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic veřejných zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 12459

zastoupený: Ing. Michaelem Dibonem, ředitelem Závodu dopravních staveb, a Ing. Kamilem Vykydalem,

výrobním ředitelem, na základě plné moci

IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:

dále jen „dodavatel“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo





Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 09.05.2018 (č. smlouvy Objednatele: **S-1691/DOP/2018**, č. smlouvy Dodavatele: AV.18005.1.150 (dále jen „**Smlouva**“), následovně:

a) Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1.1 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

„Předmět díla se navyšuje o vícepráce spočívající v přidání semaforových soustav na objízdnu trasu a celkové navýšení počtu dopravních značek z důvodu změn v objízdnych trasách. Detailní zdůvodnění jednotlivých změn je přílohou ZBV č. 1, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy.“

b) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 14.224.796,14 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, doplněnému aktualizovanými soupisy prací, které jsou součástí ZBV č.1 které je přílohou č.1 dodatku č. 1 smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 2.987.207,19 Kč.

Cena díla dle SOD:

Cena bez DPH	13.496.125,71 Kč
DPH	2.834.186,40 Kč
Cena včetně DPH	16.330.312,11 Kč

Cena díla v Dodatku č.1:

Cena bez DPH	728.670,43 Kč
DPH	153.020,79 Kč
Cena včetně DPH	881.691,22 Kč

Cena díla dle SOD včetně Dodatku č.1:

Cena bez DPH	14.224.796,14 Kč
DPH	2.987.207,19 Kč
Cena včetně DPH	17.212.003,33 Kč





c) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 se doplňuje následujícím textem:


„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 smlouvy, se doplňuje aktualizovanými soupisy prací s výkazem výměr, který je součástí ZBV č.1, které je přílohou č.1 dodatku č. 1 smlouvy.“

2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovené Dodatkem č. 1 činí celkem – 5,40 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 a 4 činí celkem 5,61% závazku a nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 095-39/2018/RK ze dne 17.12.2018.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: ZBV č. 1

Příloha č. 2: plná moc GEOSAN GROUP

V Praze dne 18 -01- 2019

Dodavatel:

GEOSAN GROUP a. s.



Ing. Michael Dibon
ředitel Závodu dopravních staveb
na základě plné moci



Ing. Jaromír Kazda
obchodní náměstek Závodu dopravních staveb
na základě plné moci

V Praze dne 24 -01- 2019

Objednatel:

STŘEDOČESKÝ KRAJ



Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 901_901a / 01	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 901 DIO _ 901a Dopravní značky		

Objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČ: 281 69 522

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-13 917,80	742 588,23	728 670,43

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-13 917,80	742 588,23	728 670,43

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 901 DIO _ 901a Dopravní značky	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 901_901a / 01	Číslo ZBV: 1
---	---	----------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-1691/DOP/2018 (AV.18005.1.150) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 9.5.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	RDK
6. Přehled dalších dokladů		
7. Další doklady	22	

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

901 DIO _ 901a Dopravní značky

V projektové dokumentaci PDPS se počítalo s celkovou uzavírkou a s objízdnou trasou přes Radočovice-Bílkovice-Divišov-Struhařov Chotýšany. Na základě ústního jednání dne 15.8.2018 a ustanovení Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství bylo rozhodnuto o rozáhlejší změně DIO. Z důvodu dopravy místních obyvatel byla upravena trasa pro pohyb veřejné dopravy, která byla oproti PDPS značně zkrácena díky využití místních silnic II a III třídy. Z důvodu menších rozměrů silnic bylo nezbytné rizikové úseky opatřit soupravou semaforů. Dále byla objízdna trasa rozšířena o trasu na Benešov směřující jižně od Vlašimi přes Votice.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-13 917,80	742 588,23	728 670,43	756 506,03

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (vedoucí projektové týmu)	jméno	Ing. Šimon Mytzyk	datum	24-10-2018	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Komanec	datum	24.10.2018	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. František Hlinovský	datum	24.10.2018	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Martin Herman	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	24-10-2018	podpis
	jméno	Ing. Jaromír Kazda	datum	24-10-2018	podpis
					Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 901_901a / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 901 DIO _ 901a Dopravní značky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
220 952,24

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	220 952,24	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-13 917,80	742 588,23	742 588,23	336,09%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-13 917,80	949 622,67	728 670,43	329,79%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (vedoucí projektového týmu):

Ing. Šimon Mytzyk

24 -10- 2018

Projektant (autorský dozor):

Ing. Jan Komanec

24.10.2018

Stavební dozor:

Souhlasím

Ing. František Hlinovský

24.10.2018

Zástupce Objednatele:

Bc. Zdeněk Dvořák

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Aleš Čermák, Ph.D.,
MBA

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín
 Číslo a název SO/PS: SO 901_DIO
 Číslo a název rozpočtu: SO 901a Dopravní značky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO901_901a / 1

Skupina Změn: 3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	91400.	DOČASNE ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	12.000	101.000	89.000	57,26	687,12		5 096,14	5 783,26	5 096,14	841,67%
2	914122.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	30.000	110.000	80.000	549,66	16 489,80		43 972,80	60 462,60	43 972,80	366,67%
3	914123.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30.000	110.000	80.000	237,04	7 111,20		18 963,20	26 074,40	18 963,20	366,67%
4	914129.	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OČEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	5 460,000	27 055,000	21 595,000	17,18	93 802,80		371 002,10	464 804,90	371 002,10	495,51%
5	914422.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	16.000	21.000	5.000	2 152,81	34 444,96		10 764,05	45 209,01	10 764,05	131,25%
6	914423.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	16.000	21.000	5.000	279,40	4 470,40		1 397,00	5 867,40	1 397,00	131,25%
7	914429.	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OČEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 912,000	5 145,000	2 233,000	17,18	50 028,16		38 362,94	88 391,10	38 362,94	176,68%
8	916312.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4.000	0,000	-4,000	231,31	925,24	-925,24			-925,24	-100,00%
9	916313.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4.000	0,000	-4,000	121,38	485,52	-485,52			-485,52	-100,00%
10	916319.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	728.000	0,000	-728.000	17,18	12 507,04	-12 507,04			-12 507,04	-100,00%
		Nové položky										0,00	
12	916152.	SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM (OTSKP)	KUS	0,000	2,000	2,000	3 710,00	0,00		7 420,00	7 420,00	7 420,00	100,00%
13	916153.	SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ (OTSKP)	KUS	0,000	2,000	2,000	1 040,00	0,00		2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
11	916159.	SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ (OTSKP)	KSDEN	0,000	490,000	490,000	497,00	0,00		243 530,00	243 530,00	243 530,00	100,00%
		Celkem						220 952,24	-13 917,80	742 588,23	949 622,67	728 670,43	329,79%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín**

1	Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH	13 496 125,71
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	14 224 796,14
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	17 212 003,33
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	105,40%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,10%

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	728 670,43	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,40%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 048 837,71	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,61%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
10A=31+35	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	756 506,03	
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 746 062,86	

12=(36+37)/1*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=36+37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-13	Zbývá do limitu	149 224 000,00

Skupiny změn

ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn																			
					-1- Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			-2- Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			-3- Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				-4- Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				-5- Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					
					Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %			
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(36+37)/1*100		
		Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín	- 13 917,80	742 588,23	728 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 917,80	742 588,23	728 670,43	756 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
901a	1	Dopravní značky - rozšíření	- 13 917,80	742 588,23	728 670,43			0,00	0,00		0,00	- 13 917,80	742 588,23	728 670,43	756 506,03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	901 DIO _ 901a Dopravní značky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	901_901a / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací	3	
Zápis z ústního jednání	3	
Stanovisko TDI k ZBV	1	
Stanovisko AD k ZBV	2	
Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM	13	
Počet listů celkem	22	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín

Objekt: SO901_901a

Místo: Domašín
 Projektant: Pontex s.r.o.
 Zadavatel: Středočeský kraj
 Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Kód	Popis	MJ	zadáni		změna		po změně		
				Množství	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
					220 952,24		728 670,43		949 622,67	
1	91400	DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zakrytí a následné odkrytí <i>původní počet značek pro zakrytí - 12 ks [A]</i> <i>nový počet značek pro zakrytí - 101 ks [B]</i> <i>rozdíl [B] - [A]=89 ks [C]</i> <i>12=12,0000 [A]</i> zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění	KUS	12,000	57,26	687,12	89,00	5 096,14	101,000	5 783,26
2	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní <i>původní počet značek pro montáž s přemístěním - 30ks [A]</i> <i>nový počet pro montáž s přemístěním - 110ks [B]</i> <i>rozdíl [B] - [A]=80 ks [C]</i> <i>14+7+4+4+1=30,0000 [A]</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	30,00	549,66	16 489,80	80,00	43 972,80	110,00	60 462,60
3	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní <i>původní počet značek pro demontáž - 30ks [A]</i> <i>nový počet pro demontáž - 110ks [B]</i> <i>rozdíl [B] - [A]=80ks [C]</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	30,00	237,04	7 111,20	80,00	18 963,20	110,00	26 074,40
4	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní	KSDEN	5 460,00	17,18	93 802,80	21 595,00	371 002,10	27 055,00	464 804,90

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
		<p>Změna v době realizace a počtu dopravních značek</p> <p>původní doba dopravního značení realizace - 26 týdnů = 182 dní nová doba 1 sady dopravního značení realizace - 35 týdnů = 245 dní nová doba 2 sady dopravního značení realizace - 36 týdnů = 252 dní</p> <p>původní počet značek - 30 nový počet značek 1 sady - 95 nový počet značek 2 sady - 15</p> <p>původní počet MJ - 182*30=5 460 cena 5 460*17,18=93 802,80 Kč nový počet MJ 1 sady - 245*95=23 275 cena 23275*17,18=399 864,50 Kč nový počet MJ 2 sady - 252*15=3 780 cena 3780*17,18=64 940,40 Kč celková změna ceny - 464 804,90 Kč</p> <p>rozdíl MJ 21 595 (23275+3780-5460) rozdíl v ceně 399864,50+64940,40-93802,80= 371 002,10 Kč</p> <p>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</p>								
5	914422	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</p> <p>dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní původní počet značek pro montáž - 16 [A] nový počet pro montáž - 21[B] (značka IP22) rozdíl ve změně [B]-[A]= 5 [C] položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky</p>	KUS	16,00	2 152,81	34 444,96	5,00	10 764,05	21,00	45 209,01
6	914423	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ</p> <p>dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní původní počet značek pro demontáž - 16[A] nový počet pro demontáž - 21[B] (značka IP22) rozdíl ve změně [B]-[A]= 5 [C] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	16,00	279,40	4 470,40	5,00	1 397,00	21,00	5 867,40
7	914429	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ</p> <p>dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní</p> <p>Změna v době realizace a počtu dopravních značek</p> <p>původní doba realizace - 26 týdnů = 182 dní nová doba realizace - 35 týdnů = 245 dní</p> <p>původní počet značek - 16 nový počet značek - 21</p> <p>původní počet MJ - 182*16=2 912 cena 2 912 *17,18= 50 028,16 Kč nový počet MJ - 245*21=5 145 cena 5145*17,18=88 391,10 Kč</p> <p>rozdíl MJ 2 233 (5145-2912) rozdíl v ceně 88391,10-50028,16= 38 362,94 Kč</p>	KSDEN	2 912,00	17,18	50 028,16	2 233,00	38 362,94	5 145,00	88 391,10

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
		položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití								
8	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,00	231,31	925,24	-4,00	-925,24	0,00	0,00
		Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků								
		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
9	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,00	121,38	485,52	-4,00	-485,52	0,00	0,00
		Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků								
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
10	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	728,00	17,18	12 507,04	-728,00	-12 507,04	0,00	0,00
		Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby 26 týdnů = 182 dnů 182*4=728.0000 [A]								
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití								
Nové položky - JC dle OTSKP SPK 2018										
11	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	497,00	0,00	490,00	243 530,00	490,00	243 530,00
		<i>doba realizace - 35 týdnů = 245 dní [A]</i> <i>počet semaforových přenosných souprav - 2 ks</i>								
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
12	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	3 710,00	0,00	2,00	7 420,00	2,00	7 420,00
		<i>cena za montáž s přesunem 2ks semaforových souprav</i>								
		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie								
13	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	1 040,00	0,00	2,00	2 080,00	2,00	2 080,00
		<i>cena za demontáž 2ks semaforových souprav</i>								
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								

ZÁPIS

z ústního jednání
ze dne 15.8.2018

Předmětem ústního jednání je zahájené správní řízení ve věci úplné uzavírky mostů v Domašíně z důvodu oprav mostů.

Termín: 17.9.2018 – 19.5.2019

Návrh objízdné trasy v důsledku úplné uzavírky.

Po dobu úplné uzavírky je navrženo vedení dopravy po objízdné trase pro veškerou silniční dopravu ze silnice č. II/112 z Domašína přes Vlašim na silnici č. II/125 přes Kondrac, Louňovice pod Blaníkem na silnici č. II/150 přes Zvěstov, Ratměřice, Jankov, Votice na silnici I/3 přes Olbramovice, Bystřice do Benešova zpět na silnici č. II/112.

Přítomni: dle prezenční listiny

Vyjádření:

Zhotovitel - 17 prací na mostech č. 015 budeme
kalkulovat a předat 17.9. a na mostech č. 017
a 16 dní předtím 10.10.2018.
17.9. - bude probíhat na obou mostech
příprava na mosty.

17.9. - nutné doplnit seznamy na silnici
(a podrobně) → na silnici

(17.9.) - doplnit seznamy, které obsahuje seznamy
Domašín (celý úsek mezi silnicemi)
+ prostor mezi rybníkem a silnicí
doplnit seznamy na sil. III. tř. (od uličky)
! Bude v seznamu cizí a k tomu k příloze - zápis.

USA) meuzor - dala p'elurani' shakuridu



Bude p'os'ida'ur o nane' DID; OSSH propolna'
m'isledni' s P'K'BN!

L'mofiu - damaini' - d'ap'at D'Z (K'ilos 3, 5 +)
M'ime B'LV.

Stoniat, p'it'us, p'olyt'ur 15. 8 2018, 10, 00 h
(M'as)' (no p'elurani' l'ok'na)

PREZENČNÍ LISTINA

Ústní jednání ze dne 15.8.2018
v rámci řízení ve věci úplné uzavírky silnice č. II/112, mosty v Domašíně

Organizace adresa	Jméno a příjmení	telefon	Podpis
MĚSTO VLAŠIM	Eva Lupačová		
ČAD BENETOV	Jiří Beneš		
KSUS SK p.o.	Vít Bares		
KSUS SK z.s.	Miroslav Fohungel		
KSUS SK z.s.	Pavel Šuch		
GEOSAN GROUP a.s.	Šimon Hříztek		
MĚSTO VLAŠIM	Karel Kroupa		

VÁŠ DOPIS ZNAČKY: [Zadejte značku]
ZE DNE: [Vyberte datum]
NAŠE ZNAČKA: [Zadejte značku]

VYŘIZUJE: Ing. František Hlinovský
TEL.: 
E-MAIL: 
IDDS: nd9sqty

MÍSTO / DATUM: Praha 15. října 2018

GEOSAN GROUP a.s.
Závod dopravních staveb
Ing. Petr Vlnář
U Průhonu 1516/32 [Město]
170 00 Praha7
Česká republika

Věc: Oprava mostu ev. č. 112 – 017, most přes strouhu v obci Domašín a oprava mostu ev.č. 112 – 015, most přes strouhu v obci Domašín – stanovisko TDI k ZBV č. 1 – změna DIO - odsouhlasení

Vážený pane inženýre,

jako zplnomocněná osoba pro výkon technického dozoru investora (objednatel) jsem dne 24.09.18 obdržel Vaši žádost, jako zástupce zhotovitele, o vydání písemného stanoviska k návrhu ZBV č. 1 – změna rozsahu DIO – SO 901.

Jako doklad změny mi byly Vámi doloženy následující podklady:

1. Nový návrh uspořádání DIO listy č. 1 – 9 zpracovaný v 08/2018 společností QUO s.r.o. na základě zápisu z ústního jednání dne 15.8.2018
2. Zápis z ústního jednání ze dne 15.8.2018 ve věci úplné uzavírky mostů ev. č. 112-015 a 112-017 včetně kopie Prezenční listiny
3. Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydaná MÚ Vlašim – odborem dopravy a silničního hospodářství pod Č.j. ODSH 54420/18 MaE (Č. spisu 4355/2018, č. ev. 2018/198) dne 3.9.2018
4. ROZHODNUTÍ Č.j. ODSH 56949/18 MaE (č. spisu 4355/2018, č. ev. 2018/201) vydané MÚ Vlašim, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 10.9.18

Po jejich prostudování a kontrole v porovnání se zadávací dokumentací pro SO 901, vypracovanou společností PONTEX s.r.o. v 04/2017, vydávám jako zplnomocněná osoba pro výkon Technického dozoru na výše jmenované akci své **SOUHLASNÉ STANOVISKO k vystavení ZBV č. 1.**

 SUDOP PRAHA a.s.
130 80 Praha 3, Olšanská 1a
210 - středisko technických dozorů
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
-7-

S pozdravem

Ing. František Hlinovský

Technický dozor investora



KSÚS Středočeského kraje p.o.

Stanislav Pohunek

Zborovská 11

150 21 Praha 5

e-mail:

Č.j. : **PX5499/2018**

Datum : Praha, 16. 10. 2018

Vyřizuje : Ing. Jan Veselý, tel.:

e-mail:

**Akce : Oprava mostu ev. č. 112-017 Most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112 - 015
Most přes strouhu v obci Domašín**

Věc : Vyjádření AD č. 01 - k návrhu ZBV 1

Vážení,

dne 15. 10. 2018 jsme obdrželi od zhotovitele návrh na změnu během výstavby č. 1, kde dochází ke změně objízdné trasy DIO a dočasného dopravního značení (viz příloha).

S navrženým řešením z pohledu AD souhlasíme.

S pozdravem
Ing. Jan Veselý
Pontex spol. s r.o.

PONTEx spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4



Přílohy: žádost zhotovitele o vyjádření

Předmět: ZBV1 Domašín

Od: Petr Vinař 

Datum: 15.10.2018 8:53

Komu: 

Kopie: 

Dobrý den pane Veselý,

potřeboval bych vyjádření ke změnovému listu od AD. ZBV č. je už v revizi u paní Stupkové.

ve zkratce ZBV1:

šlo o změnu dočasného dopravního značení.

Změna se týká většího počtu dopravních značek a změny objízdné trasy

přidání semaforové soupravy kvůli průjezdu autobusů veřejné dopravy skrze Domašín

v příloze zasílám soupis prací a zápis z jednání.

Ing. Petr Vinař

připravář

GEOSAN GROUP a. s.

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

mobil: 

Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost GEOSAN GROUP a. s. nenese žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoli jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi společností GEOSAN GROUP a. s. a adresátem e-mailu, dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran jak uvedeno shora, přičemž jakákoliv změna v dohodnutém obsahu smlouvy je považována za novou nabídku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoli fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

Společnost GEOSAN GROUP a. s. zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury společnosti GEOSAN GROUP a. s. je Criminal compliance program (viz www.geosan-group.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za společnost GEOSAN GROUP a. s. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze jej považovat za jednání v rámci nebo v zájmu společnosti GEOSAN GROUP a. s. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně, způsoby uvedenými na www.geosan-group.

Přílohy:

ZBV 1 soupis prací.xlsx	18 bajtů
Zápis z jednání II-112 Domašín, mosty.pdf	18 bajtů

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: OOP - přech. DZ - úplná mosty Domašín
ID zprávy: 603904909
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 4.9.2018 v 12:19:17

Odesílatel: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 25801 Vlašim, CZ
ID schránky: zbjbfmb
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: ODSH 54420/18-MaE
Naše spisová značka: ODSH/4355/2018-MaE
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

[OOP_přechodné_Dz_-_úplná_uzavírka.pdf \(624,89 kB\)](#)
[DIO_II-112_Domašín,_mosty_270818.pdf \(2,7 MB\)](#)

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M

odbor dopravy a silničního hospodářství

Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

Číslo jednací : ODSH 54420/18 MaE

Číslo spisu: 4355/2018

Číslo evidenční: 2018/198

Oprávněná úřední osoba: Eva Matějková

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Vlašim, 3.9.2018

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na základě žádosti společnosti GEOSAN GROUP a.s., IČ: 281 69 522, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III a ve smyslu ustanovení 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a s odkazem na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní úpravu provozu na pozemních komunikacích

stanovuje

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu


přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace
na silnicích č. II/112, č. II/113, č. II/125, č. II/150, č. III/1257 a č. III/11213
v územní působnosti ORP Vlašim
a místní komunikace ve Vlašimi a MK Znosim – Domašín


**pro úplnou uzavírku mostů ev.č. 112-015 a 112-017 v Domašíně,
v termínu od 17.9.2018, 8:00 h do 19.5.2019, 18:00 h dle přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto stanovení.**

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: provádění stavby: „Oprava mostu ev. č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev. č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín“

Odpovědná osoba:

Dopravní značení - p. V. Zárybnický (QUO s.r.o.), mob: 

Stavba – Ing. Šimon Mytzyk, (Geosan Group a.s.), mob.: 

Další podmínky:

1. Osazení přechodného dopravního značení bude provedeno dle výše uvedeného a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a dle Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
2. Dopravní značení č. B 28 (Zákaz zastavení) bude umístěno na dotčená místa (viz příloha tohoto stanovení) 7 dní přede dnem úplného uzavření výše uvedených mostů.
3. Instalaci svislého dopravního značení provede oprávněná organizace (odborná osoba) k provádění dopravního značení.
4. Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto stanovení změnit či doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 26.7.2018 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim, žádost společnosti GEOSAN GROUP a.s., IČ: 284 69 522, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III v zastoupení na základě doložené plné moci společnosti QUO s.r.o., IČ: 264 87 985, Křižíkova 2158, 256 01 Benešov o stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu úplné uzavírky mostů ev.č. 112-015 a č. 112-017 v Domašíně k provádění stavebních prací v rámci stavby: „Oprava mostu ev. č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev. č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín“ a to v termínu 17.9.2018, 8:00 h – 19.5.2019, 18:00 h.

Dne 3.9.2018 projednal správní orgán přechodné dopravní značení s Policií ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 01 Benešov (viz DIO a zápisy z jednání).

K návrhu přechodného dopravního značení se Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ve věci umístění přechodného dopravního značení – světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích – vydává se opatřením obecné povahy. Taková přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek (ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu).

Poučení:

V souladu ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5-tým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Jiří Vondruška

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů
a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: _____

Sejmuto dne: _____

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Městys Louňovice p. Bl. (obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat potvrzení o vyvěšení na úřední desce příslušné obce).

Příloha: Dopravně inženýrské opatření

Obdrží:

QUO s.r.o., Křížíkova 2158, 256 01 Benešov

Město Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Městys Louňovice p. Bl., 257 06 Louňovice p. Bl.

Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 Smíchov


Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov

Městská policie Vlašim, Komenského, 258 01 Vlašim

Policie ČR, OO Vlašim, J. Masaryka, 258 01 Vlašim

Vypraveno dne:

Digitálně podepsal Eva Matějková
Datum: 03.09.2018 16:43:21 +02:00



POZOR
IP22 (ZMĚNA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ)



B4(3,5 t)
P2
E2b



E13 (VJÍZDĚ DO ÚSEKU ŘÍZENÉHO SEMAFORY)



IP22 (ZMĚNA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ)

E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY)
P4 (stávající - zakrytý)

most ev.č. 112-015



B4 (stávající)
E14 (stávající)

III/11213

DOMAŠIN



A22 (stávající - skříňová)
E13



II/112

E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY)
P4 (stávající - zakrytý)

most ev.č. 112

II/11213





A22 (stávající - skříňová)
E13



POZOR
IP22 (ZMĚNA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ)

OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN A MOSTU ev. č. 112-015, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN (DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)	Vypracoval: Quo s.r.o.
	Datum: 8/2018
	List č.: 2
Název výkresu: Vedení objízdné trasy	

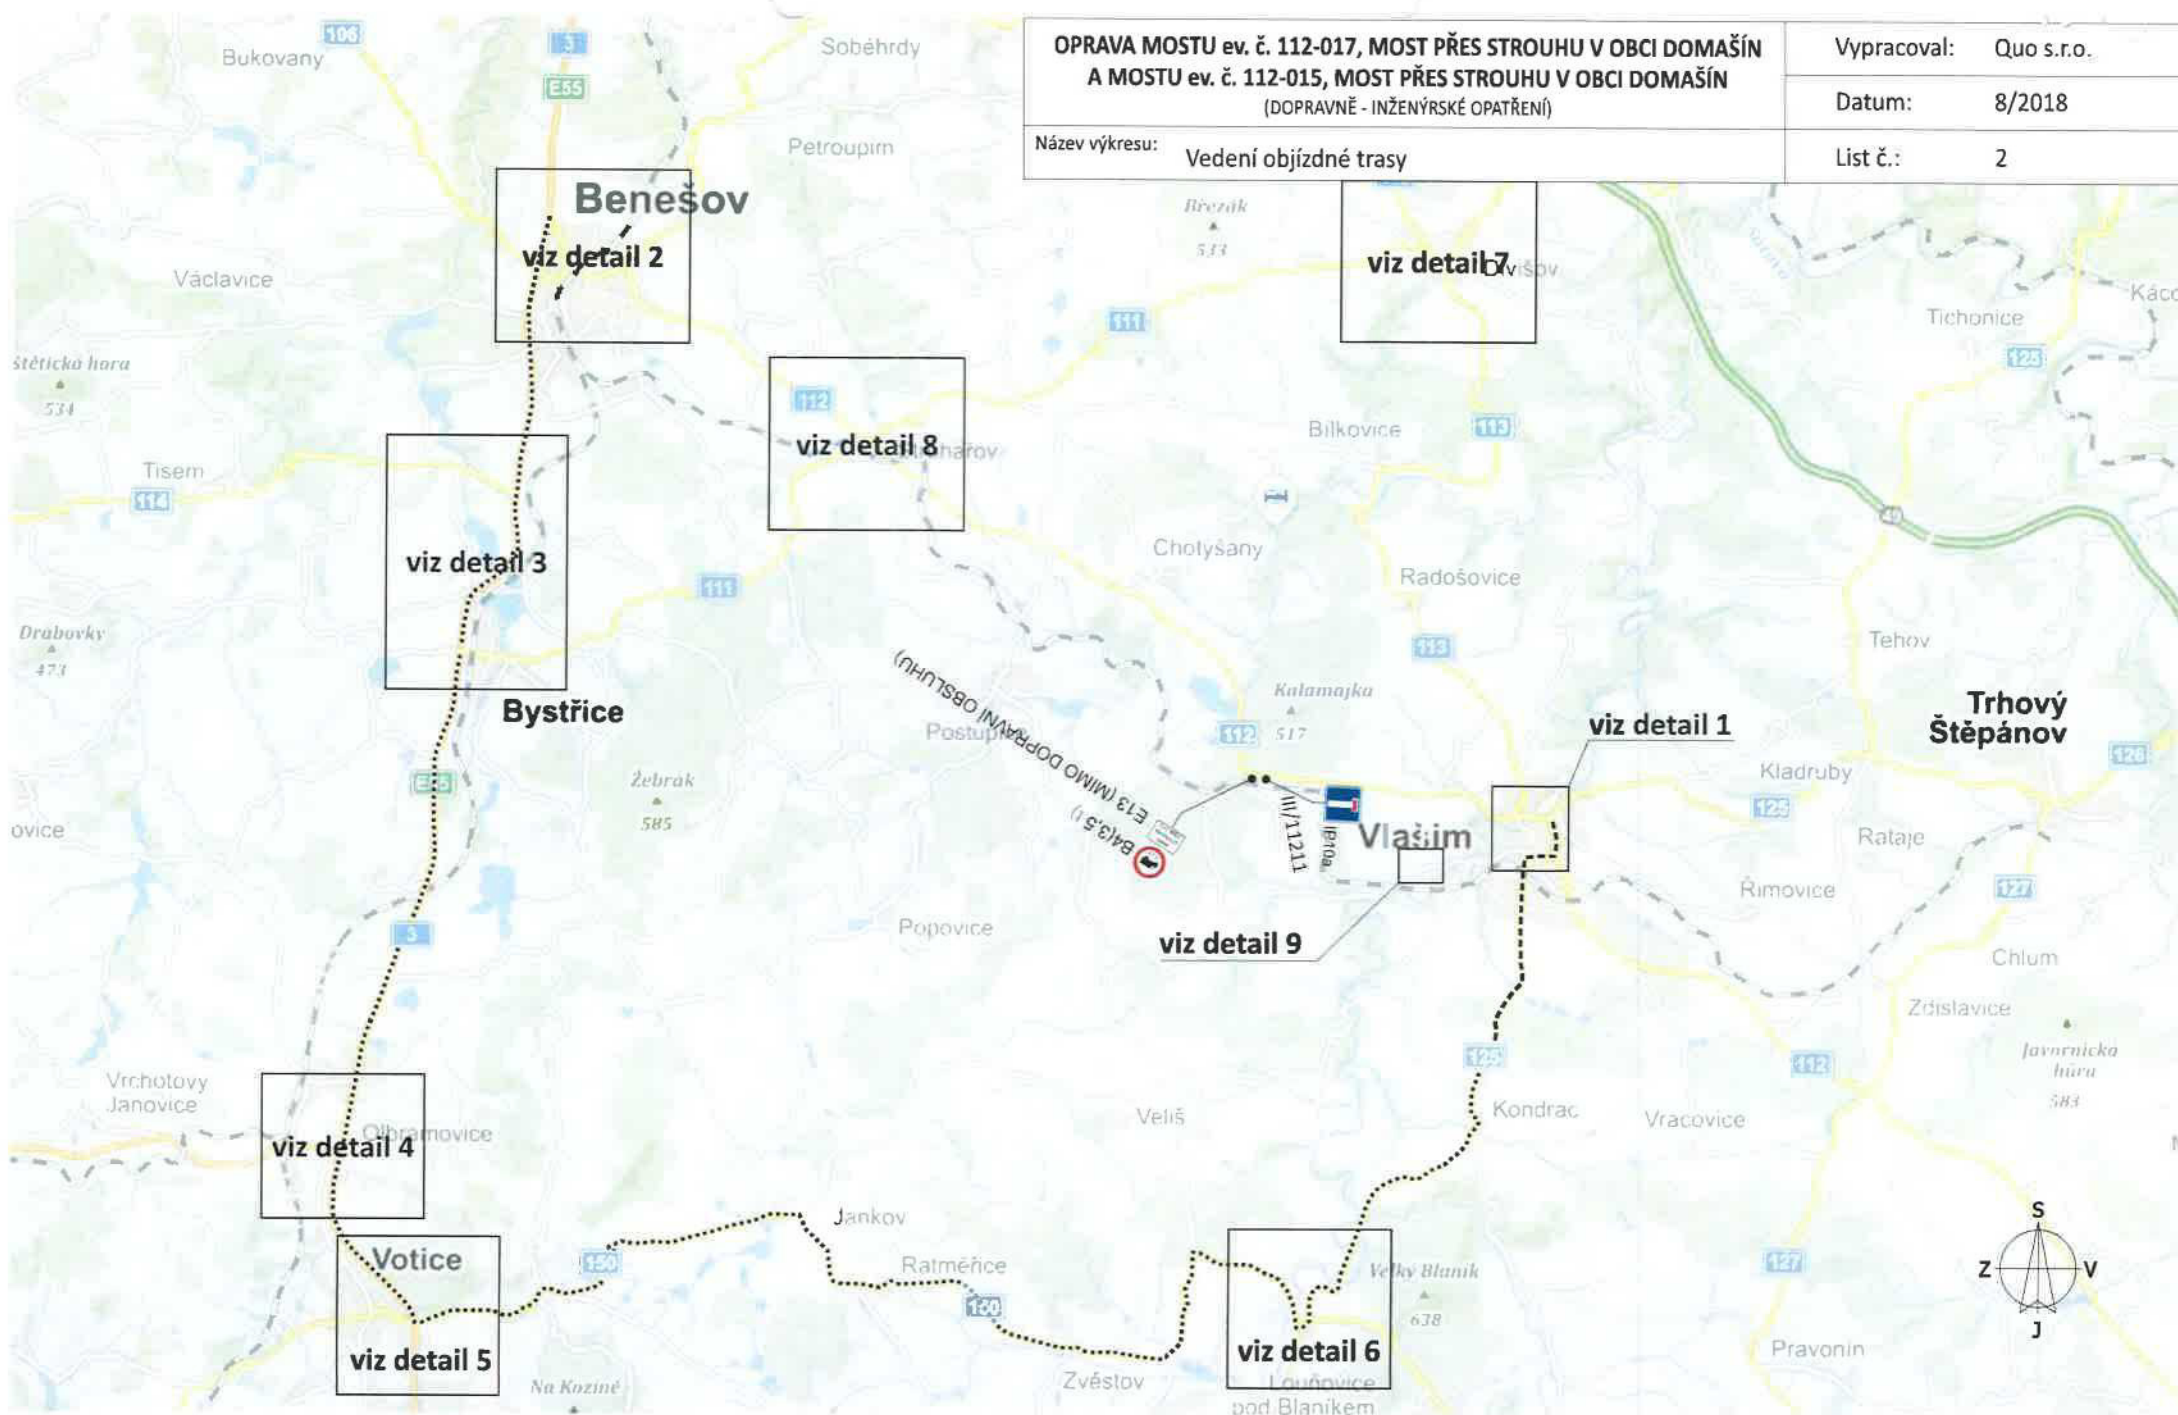

**OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
A MOSTU ev. č. 112-015, MOST PŘES STROUHU V O. DOMAŠÍN
(DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)**

Název výkresu: Detail 1

Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018

List č.: 3

**STÁVAJÍCÍ DZ V ROZPORU
S DIO BUDE ŠKRTNUTO**



**OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
A MOSTU ev. č. 112-015, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
(DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)**

Vypracoval: Quo s.r.o.


Datum: 8/2018

Název výkresu: Detail 2

List č.: 4

**STÁVAJÍCÍ DZ V ROZPORU
S DIO BUDE ŠKRTNUTO**



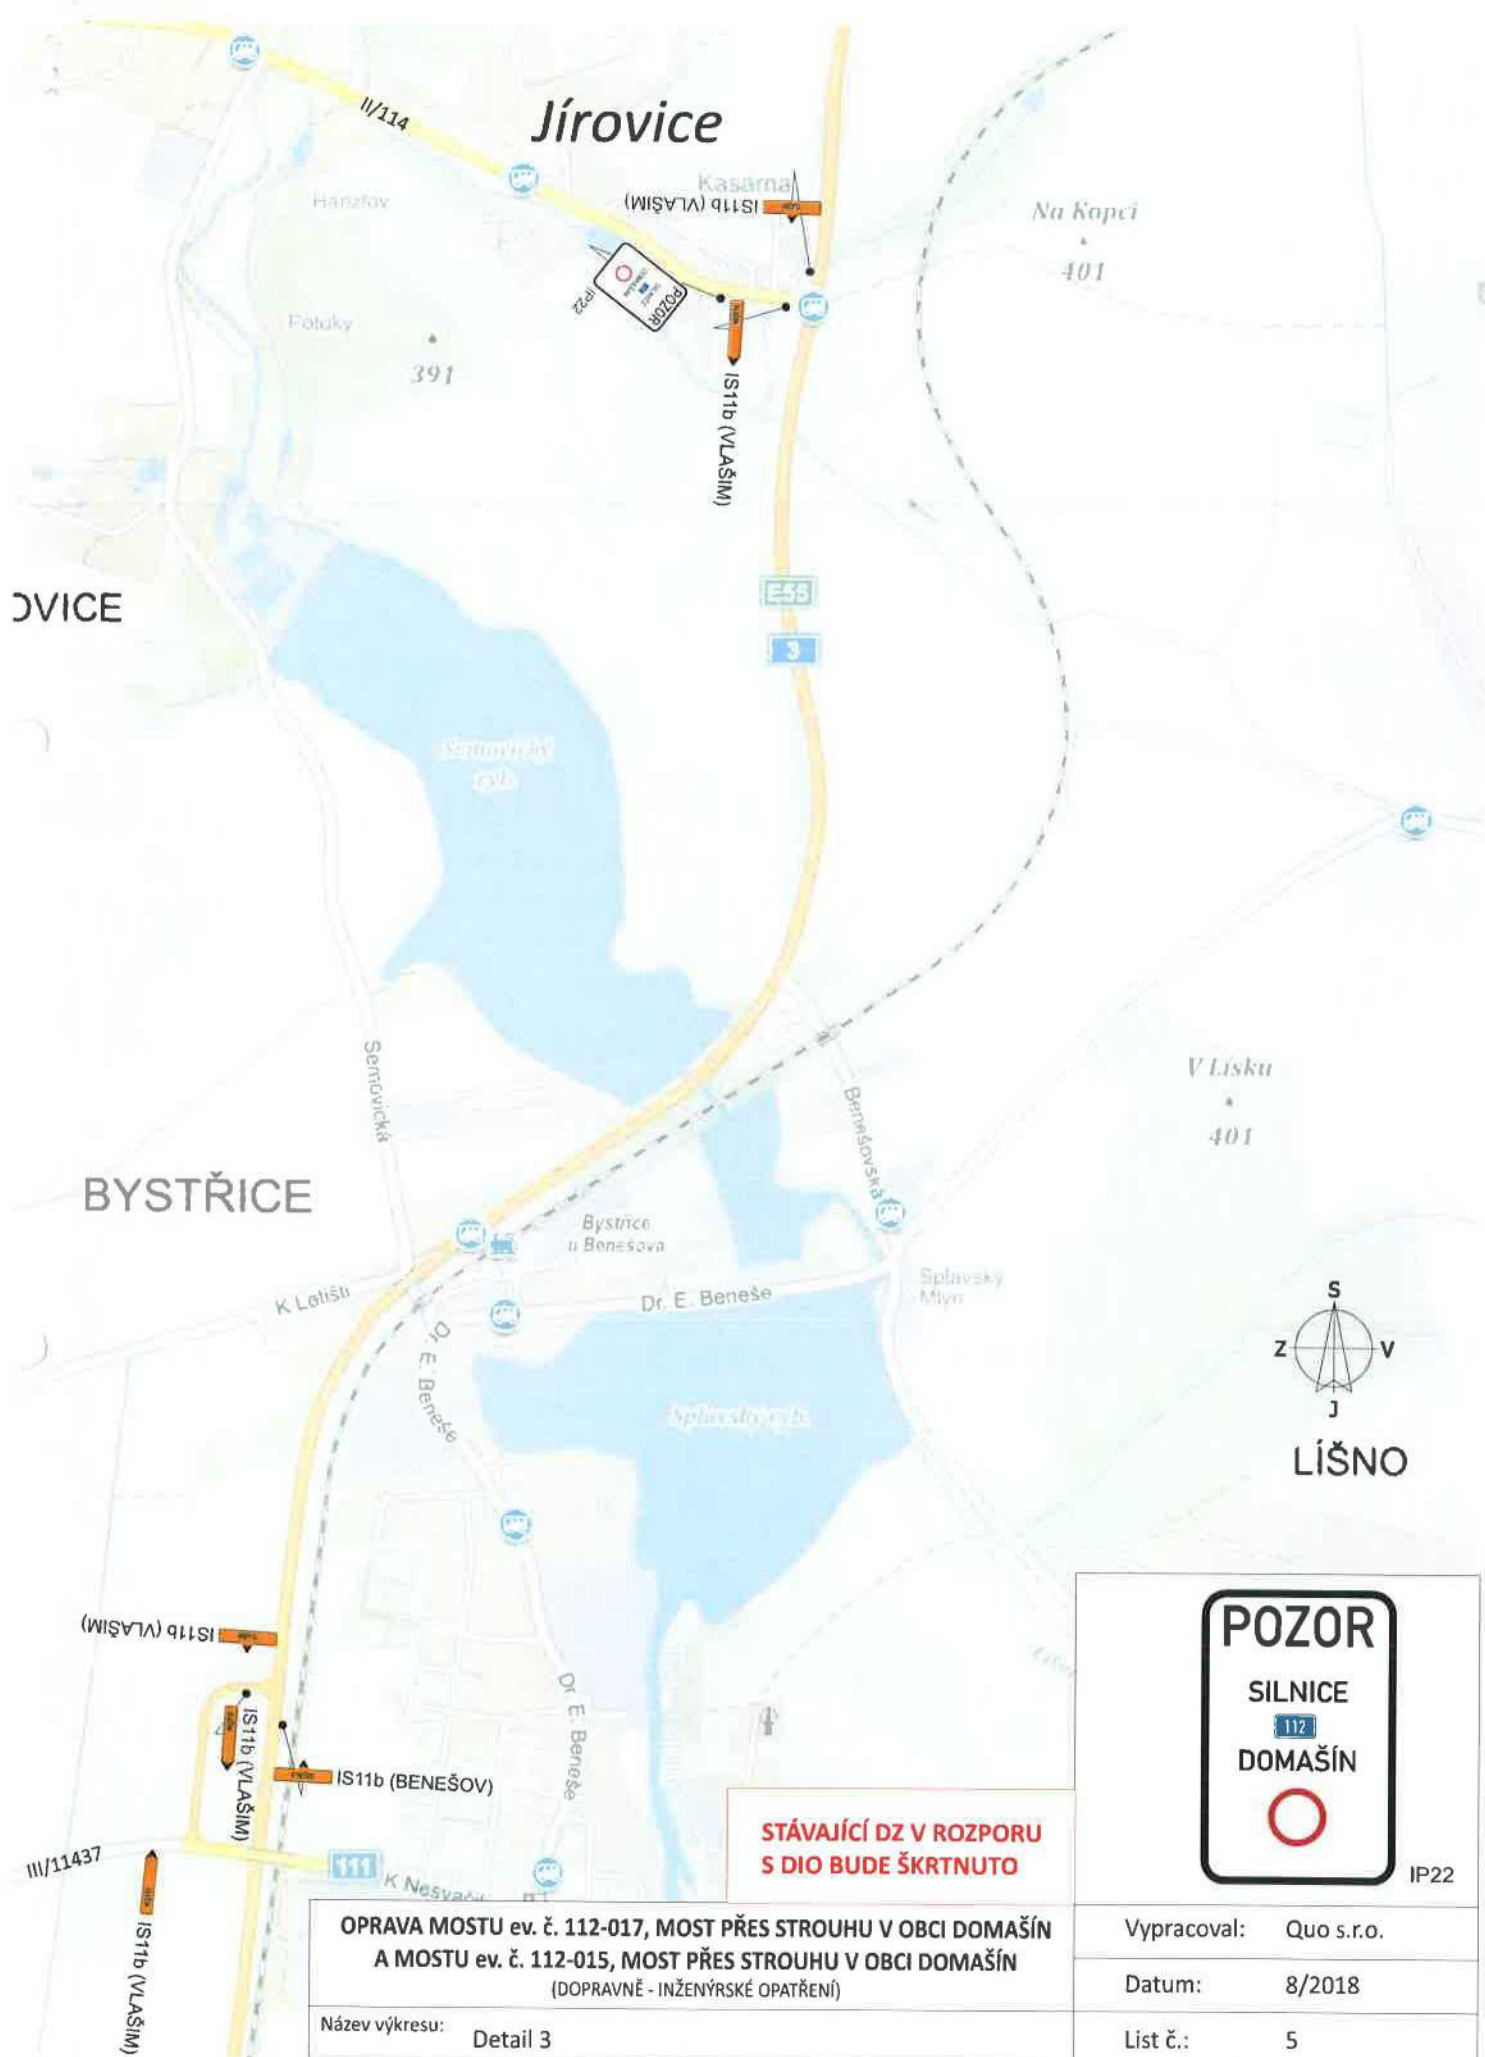

**OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
A MOSTU ev. č. 112-015, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
(DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)**

Název výkresu: **Detail 3**

**STÁVAJÍCÍ DZ V ROZPORU
S DIO BUDE ŠKRTNUTO**



IP22

Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018

List č.: 5


**OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
A MOSTU ev. č. 112-015, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
(DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)**

Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018

Název výkresu: Detail 4

List č.: 6

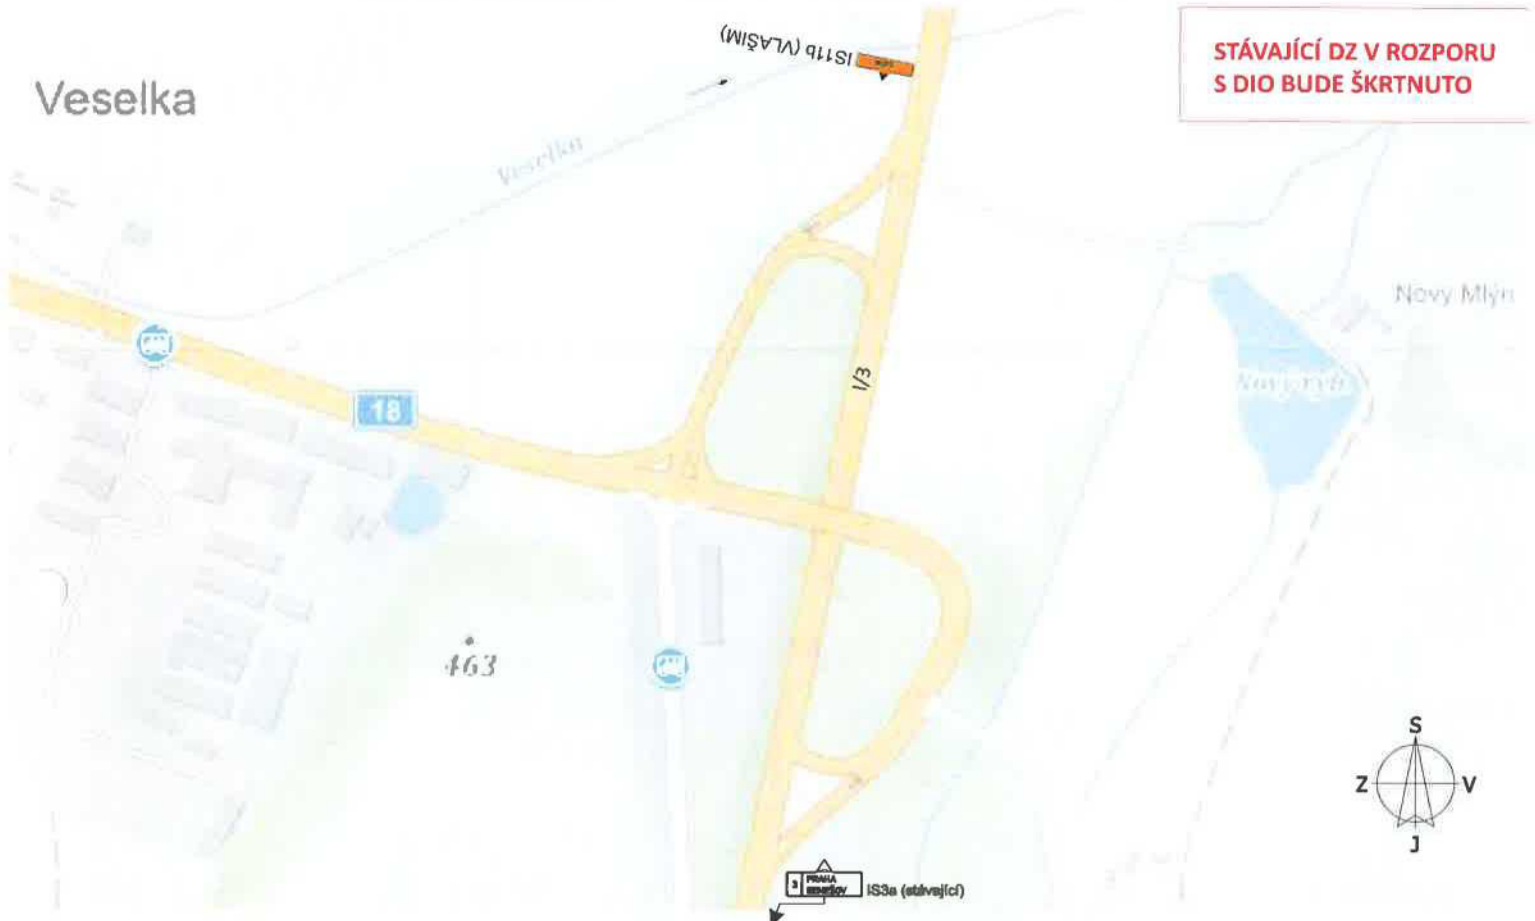

**OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
A MOSTU ev. č. 112-015, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
(DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)**

Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018

Název výkresu: Detail 5

List č.: 6



**OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
A MOSTU ev. č. 112-015, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
(DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)**

Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018


Název výkresu: Detail 6

List č.: 7

**STÁVAJÍCÍ DZ V ROZPORU
S DIO BUDE ŠKRTNUTO**



Louňovice
pod Blaníkem

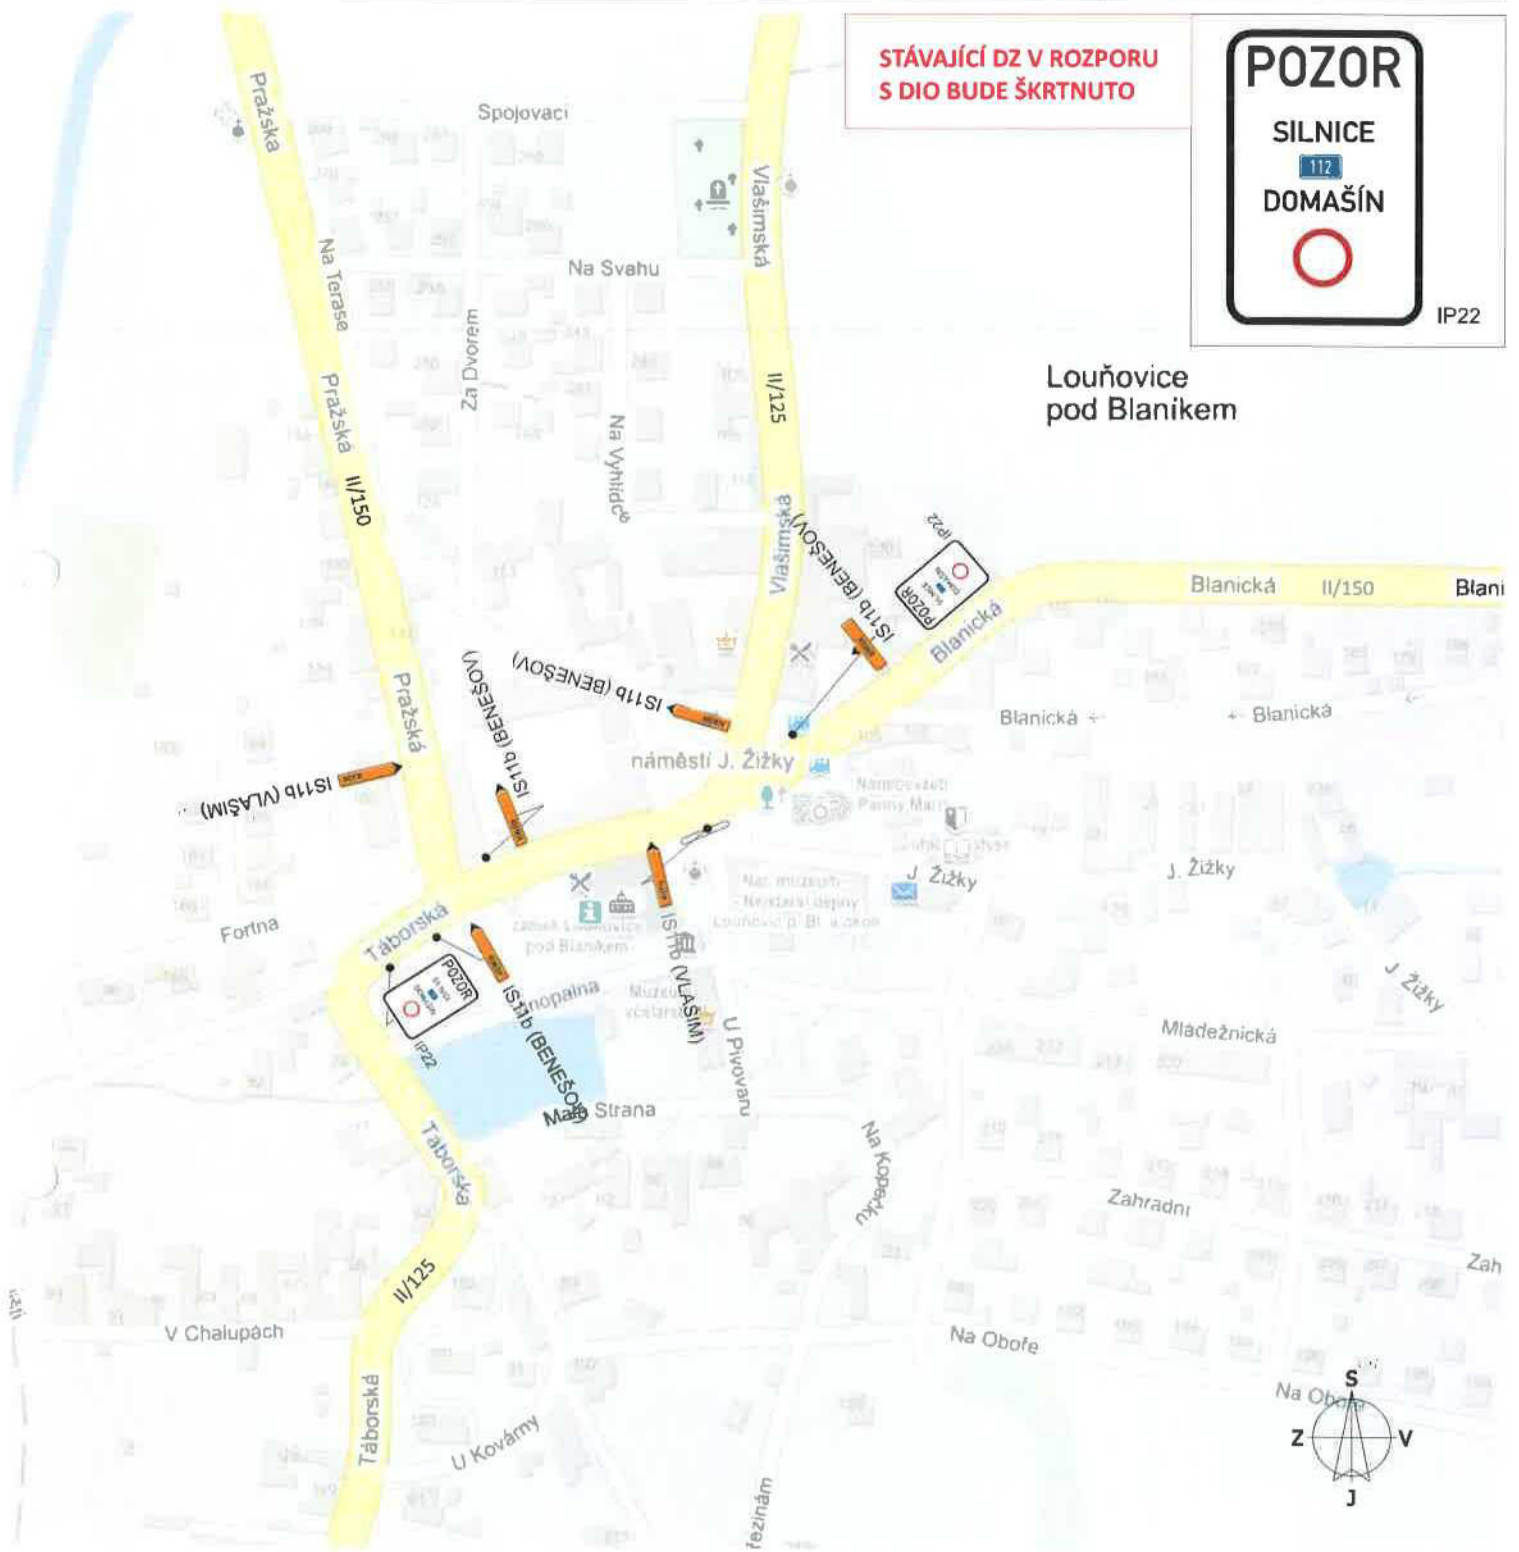

OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
 A MOSTU ev. č. 112-015, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
 (DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)

Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018

Název výkresu: Detail 7

List č.: 8

**STÁVAJÍCÍ DZ V ROZPORU
 S DIO BUDE ŠKRTNUTO**



OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
 A MOSTU ev. č. 112-015, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
 (DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)


Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018

Název výkresu: Detail 8

List č.: 8

**STÁVAJÍCÍ DZ V ROZPORU
 S DIO BUDE ŠKRTNUTO**

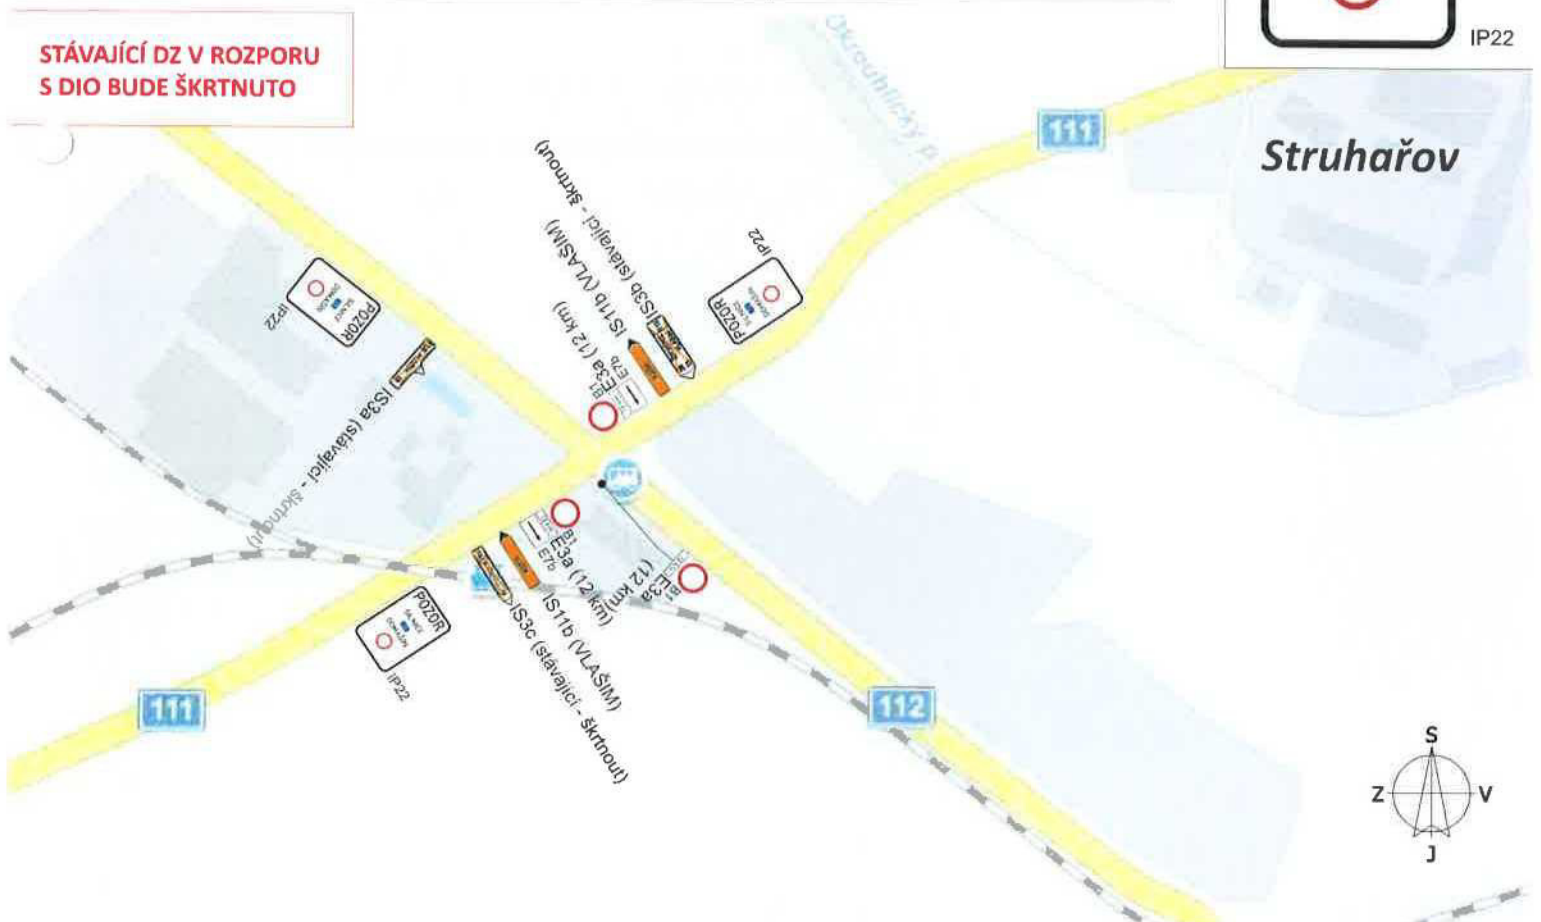

IP22



OPRAVA MOSTU ev. č. 112-017, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
A MOSTU ev. č. 112-015, MOST PŘES STROUHU V OBCI DOMAŠÍN
 (DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)

Název výkresu: Detail 9

Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018

List č.: 9



Příloha č. 2

Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

PLNÁ MOC

Společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ing. Kamila Vykydala, narozeného dne [redacted]

Ing. Roberta Schneidera, nar. dne [redacted]
ředitele Závodu pozemních staveb Úecny,

Ing. Miroslava Kašpara, narozeného dne [redacted]
obchodního náměstka,

Ing. Michaela Dibona, narozeného dne [redacted]
ředitele Závodu dopravních staveb,

Ing. Jaromíra Kazdu, narozeného dne [redacted]
Praha 10, obchodního náměstka,

Ing. Jiřího Chroustovského, narozeného dne [redacted]
ředitele Závodu ekologických a energetických staveb,

Michala Hrdličku, nar. dne [redacted]
pozemních staveb Brno

Milana Vokouna, nar. dne [redacted] ředitele Závodu
pozemních staveb Ostrava

aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.


V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **Ing. Kamil Vykydal**, a dále alespoň jeden z dalších sedmi zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne 8. října 2018



Luděk Kostka, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.



Přijímám zmocnění:



Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel



Ing. Robert Schneider
ředitel Závodu pozemních staveb Čechy



Ing. Miroslav Kašpar, obchodní náměstek



Ing. Michael Dibon,
ředitel Závodu dopravních staveb



Ing. Jaromír Kazda, obchodní náměstek



Ing. Jiří Chroustovský,
ředitel Závodu ekologických
a energetických staveb



Michal Hrdlička,
ředitel Závodu pozemních staveb Brno



Milan Vokoun,
ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **009923/481/2018/C**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem [REDACTED]

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devíti (9) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka

narozený dne [REDACTED]

bytem [REDACTED]

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. [REDACTED] vydaného Městským úřadem Kolín
dne [REDACTED]

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

Praha dne 8. října 2018



Mgr. Daniel Thelen, advokát

