

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 68**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	3.12.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Miličova 1,3	Dotčené výkresy
SB	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Úprava vzduchotechniky na správní budově

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu byla nad rámec díla:

- 1) Byla provedena úprava půdorysu 5.NP Zkušebna orchestru - změna vyústku z kruhového potrubí do SDK, doplnění potrubí VZT
 - 2) Byly provedena úprava půdorysu 4.NP Baletní sál - změna vyústku z kruhového potrubí do SDK
 - 3) Byla dodána protipožární mřížka do výtahové šachty
- Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

2.3 Cenové porovnání

Celkem

53 163,10 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova	
1	Vícepráce	53 163,10
2	Méněpráce	0,00
Celkem		53 163,10

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	53 163 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	26.11.2018	[Podpis]
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		01.12.18	[Podpis]
Za TDO:		3.12.18	[Podpis]

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to včetně všech vedlejších a režijních nákladů. Na základě další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 68

ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova			
D.1.4.6	VZT			
D.1.4.6	VZT	53 163,10	0,00	53 163,10
		53 163,10	0,00	53 163,10
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		53 163,10	0,00	53 163,10

Realizované práce celkem bez DPH	53 163,10
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	53 163,10
DPH 21%	11 164,25
Realizované práce celkem včetně DPH	64 327,35

ZL 68 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRŇONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA
 Objekt: Správní budova
 Část: Úprava vzduchotechniky na správní budově

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 3.12.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem	VcP		MP		Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							Vícepráce		Měně práce							
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM							0,00	53 163,10	0,00							
D.1.4.6 VZT							0,00	53 163,10	0,00							
Díl:	D.1.4.6	VZT				0,00		53 163,10								
		Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 60%, do DN315	bm			0,00	10,00	6 432,00	0,00	0,00	643,20	10,00	10,00	10,00	0,00	Dod. + 10%
		Vyústka do podhledu jednořadá 525x75 bez RAL, vč. upínacího rámečku a připovacího boxu	ks		1 366,20	0,00	14,00	19 126,80	0,00	0,00	1 366,20	14,00	14,00	14,00	0,00	SoD - Dod č.5
		Vyústka do podhledu jednořadá 325x75 bez RAL, vč. upínacího rámečku a připovacího boxu	ks		1 231,65	0,00	6,00	7 389,90	0,00	0,00	1 231,65	6,00	6,00	6,00	0,00	SoD - Dod č.5
		NOVA-A-A1-2-525X75-R1-UR-H-AN	ks			0,00	16,00	9 888,00	0,00	0,00	618,00	16,00	16,00	16,00	0,00	Dod. + 10%
		NOVA-A-A1-2-325X75-R1-UR-H-AN	ks			0,00	4,00	1 905,60	0,00	0,00	476,40	4,00	4,00	4,00	0,00	Dod. + 10%
		Napěňovací požární mřížka 400x300	ks			0,00	1,00	8 130,00	0,00	0,00	8 130,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod. + 10%
	998728203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%		0,55	0,00	528,72	290,80	0,00	0,00	0,55	528,72	528,72	528,72	0,00	SoD - Dod č.5
OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM							0,00	0,00	0,00							
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projektční řešení změny	hod	0,00	550,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%

Vícepráce	53 163,10
Měněpráce	0,00
Celkem vícepráce - měněpráce	53 163,10
DPH 21%	0,00

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 70**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	12.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Miličova 1, 3	Dotčené výkresy
SB	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Ostatní SDK konstrukce

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu, projekčních změn a z důvodů nepředvidaných skutečností bylo nutné provést úpravy SDK konstrukcí.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků objednatele

2.3 Cenové porovnání

Celkem

870 369,30 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova	
1	Vícepráce	892 369,30
2	Méněpráce	-16 944,00
Celkem		875 425,30

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	875 425 Kč
-----	---------------------------------	-------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 30 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Střešovice IČO: 43005560	26.11.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		12.12.18	
Za TDO:		12.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 70

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB	Milíčova 1, 3 - Správní budova			
	Architektonicko-stavební řešení			
SB1	SDK konstrukce	178 787,00	0,00	178 787,00
SB3	SDK konstrukce	114 263,96	0,00	114 263,96
SB	SDK konstrukce	577 318,35	-16 944,00	560 374,34
		870 369,30	-16 944,00	853 425,30
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova			
Díl: ON	Ostatní náklady	22 000,00	0,00	22 000,00
		22 000,00	0,00	22 000,00
Celkem		892 369,30	-16 944,00	875 425,30

Realizované práce celkem bez DPH	875 425,30
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	875 425,30
DPH 21%	183 839,31
Realizované práce celkem včetně DPH	1 059 264,61

OVN-celk

Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM

0,00

22 000,00

0,00

Díl:	ON	Ostatní náklady													
1	ON Z2	Projektční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	20,000	22 000,00	0,00	0,00	1 100,00	20,000	20,000	20,000	0,000

Vícepráce	870 369,30
Měněpráce	-16 944,00
Celkem vícepráce - měněpráce	853 425,30
DPH 21%	179 219,31
Vícepráce - měněpráce vč. DPH	1 032 644,61

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 105**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	3.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Milíčova 1,3	Dotčené výkresy
SB	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Nová skladba podlahy m.č. C 2.10

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu byla nad rámec díla provedena nová skladba podlahy v m.č. C 2.10 - ředitelna
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

2.3 Cenové porovnání

Celkem

45 618,69 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla




Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova	
1	Vícepráce	45 618,69
2	Méněpráce	0,00
Celkem		45 618,69

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	45 619 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČ: 43005560	20.11.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		2.12.18	
Za TDO:		3.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to včetně všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 105

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova			
SO 02	Nový stav			
762	Konstrukce tesařské	45 618,69	0,00	45 618,69
		45 618,69	0,00	45 618,69
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		45 618,69	0,00	45 618,69

Realizované práce celkem bez DPH	45 618,69
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	45 618,69
DPH 21%	9 579,93
Realizované práce celkem včetně DPH	55 198,62

ZL 105 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍI 14, OSTRAVA
 Objekt: Správní budova
 Část: Nová skladba podlahy m.č. C 2.10

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 3.12.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM						0,00	45 618,69		0,00							
SO 02 Nový stav						0,00	45 618,69		0,00							
Díl:	762	Konstrukce tesařské														
		Liapor - větší vrstva, Adipan 5,5mm, OSB Desky 15mm 2vrstvy	m2			0,00	43,30	42 325,75	0,00	0,00	977,50	43,30	43,30	43,30	0,00	Dod. + 10%
	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	1 247,200	7,78	9 699,24	423,26	3 292,94	0,00	0,00	7,78	423,26	1 670,46	423,26	0,00	SoD
OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM						0,00	0,00		0,00							
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projektční řešení změny	hod	0,00	550,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%

Vícepráce 45 618,69
 Méněpráce 0,00
 Celkem vícepráce - méněpráce 45 618,69
 DPH 21% 0,00

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 106**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	3.12.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Miličova 1,3	Dotčené výkresy
SB	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Nová skladba podlahy

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu byla nad rámec díla provedena nová skladba podlahy v 3. a 4. NP. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

2.3 Cenové porovnání

Celkem

62 439,54 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova	
1	Vícepráce	62 439,54
2	Méněpráce	0,00
Celkem		62 439,54

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

62 440 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	26.11.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		3.12.18	
Za TDO:		3.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova			
SO 02	Nový stav			
762	Konstrukce tesařské	62 439,54	0,00	62 439,54
		62 439,54	0,00	62 439,54
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		62 439,54	0,00	62 439,54

Realizované práce celkem bez DPH	62 439,54
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	62 439,54
DPH 21%	13 112,30
Realizované práce celkem včetně DPH	75 551,84

ZMĚNOVÝ LIST


ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA - ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
číslo návrhu: ZL 107
číslo revize:
Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 ul. Čs. legií 148/14
 701 04 Ostrava
 IČ: 00100528
 DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10
 IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	26.9.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Milíčovská 3	Dotčené výkresy
SB3	Správní budova 3	DPS

Popis změny / rozsah

4NP - mč. D404 Baletní sál - trám pro posuvné prosklené stěny
1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu bylo nutné na rámec díla provést tuhou konstrukci pro kotvení prosklené stěny. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny
2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

13 466,48 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:
Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB3	Správní budova 3	
1	Vícepráce	13 466,48
2	Méněpráce	0,00
Celkem		13 466,48

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO




 vyčíslení více(+)/méně(-) práce **13 466 Kč**
Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 25 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	26.11.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		26.11.18	
Za TDO:		26.11.18	


Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vř. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.


Všecké práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

OVN-celk		Ostatní a vedlejší náklady - Správní budova,														
DI:	ON															
1	ON Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	2,00	1 100,00	0,00	0,00	550,00	2,000	2,000	2,000	0,000	dod+10%

Vícepráce	13 466,48
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	13 466,48
DPH 21%	2 827,96
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	16 294,44

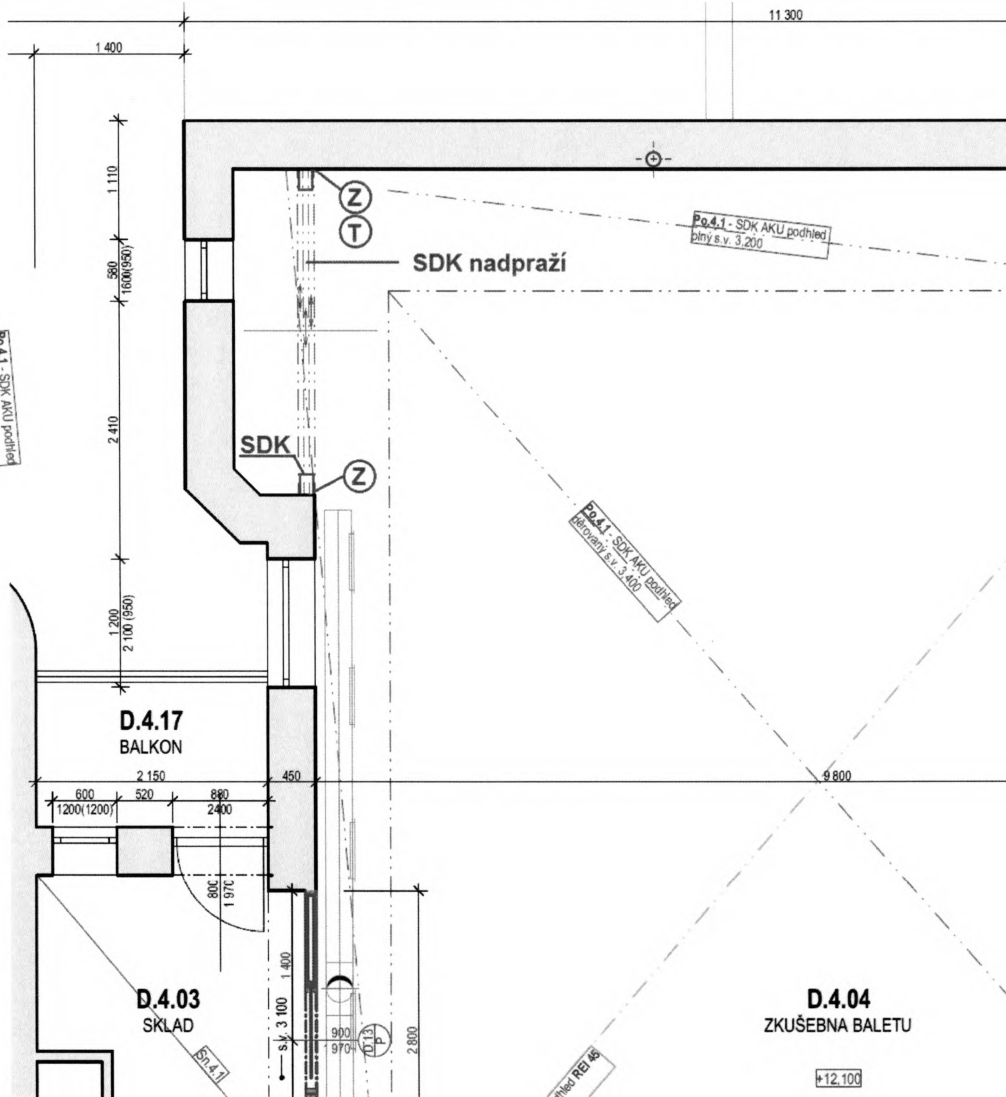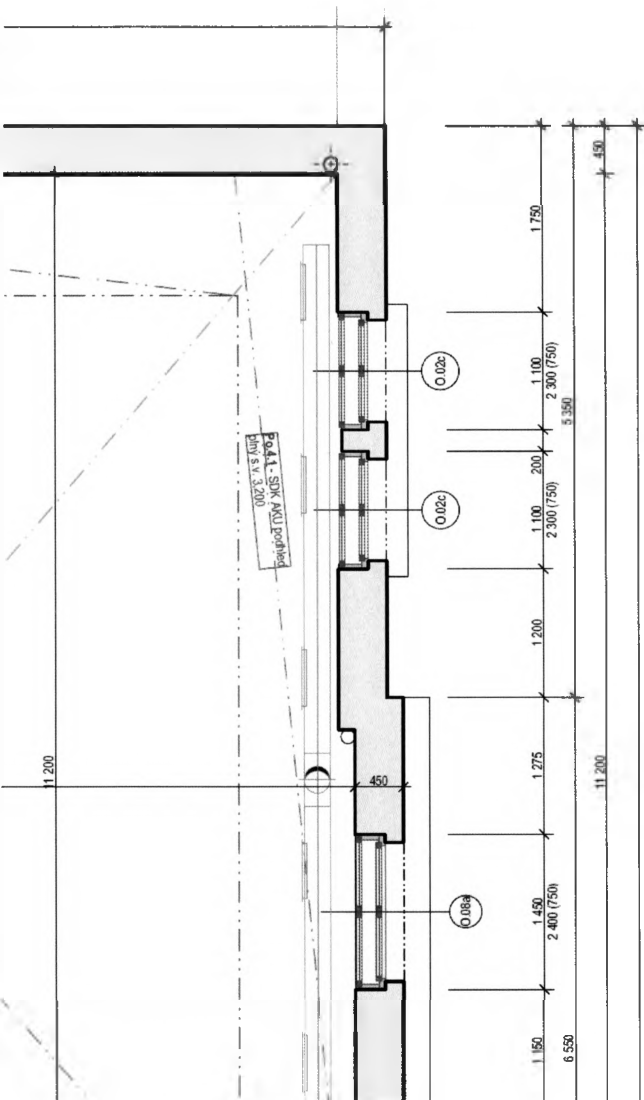ZL 107





ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 108
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005580
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum:	16.1.2019	požadavek od: <i>náhradní</i>
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy:
DJM, MS	Divadlo J. Myrona a Malá scéna	DPS
Popis změny / rozsah		

Pískovcové sokly méněpráce

1. Zdůvodnění změny

Odpočít neprováděných prací na pískovcových soklech fasád.
Změna předmětu díla vznikla z nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

2.3 Cenové porovnání

Celkem

-143 290,57 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílečty vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM, MS	Divadlo J. Myrona a Malá scéna	
1	Vícepráce	0,00
2	Méněpráce	-143 290,57
Celkem		-143 290,57

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	-143 291 Kč
------------	--	--------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

0 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu vstavení

NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	[redacted]	16.1.2019	[redacted]
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	[redacted]	16.1.2019	[redacted]
Za TDO:	[redacted]	16.1.2019	[redacted]

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísli cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Zhotovitel dále finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno / předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 108

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
MS	Malé scéna			
82	Úpravy povrchů vnější	0,00	-3 117,44	-3 117,44
DJM	Divadlo J. Myrona			
SO04				
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00	-140 173,13	-140 173,13
		0,00	-143 290,57	-143 290,57
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	-143 290,57	-143 290,57

Realizované práce celkem bez DPH	-143 290,57
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	-143 290,57
DPH 21%	-30 091,02
Realizované práce celkem včetně DPH	-173 381,59

