

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 04. 05. 2018**

číslo objednatele: S-1693/DOP/2018

číslo Zhotovitele: 18-ST02

**„II/229 Vsesulov, most ev.č. 229-009“**

Objednatel

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic veřejných zakázek,

na základě usnesení Rady Středočeského kraje č.101-22/2018/RK ze dne  
9.7.2018

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

**„Společnost Vsesulov – ROBSTAV + AZ SANACE“**

se sídlem Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek

**Vedoucí společník:**

**ROBSTAV Stavby k.s.**

se sídlem Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek

IČO: 274 30 774 DIČ: CZ274 30 774

zastoupen: Ing. Michalem Tichovským, na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle  
A, vložka 11191

**Společník:**

**AZ SANACE a.s.**

se sídlem Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 33 514 DIČ: CZ25033514.

zastoupen: Ing. Tomášem Novákem a Mgr. Bc. Petrem Dvořákem, členy představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B,  
vložka 1093

dále jen „zhotovitel“

Vedoucí společník na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16.1.2018 (viz příloha č. 3)

Vzhledem k tomu, že:

- A. Strany uzavřely dne 09. 05. 2018 smlouvu o dílo, ke stavbě „II/229 Všesulov, most ev. č. 229-009“ (dále jen „**Smlouva**“);
- B. Strany si přejí změnit některá ustanovení Smlouvy z důvodu víceprací;

uzavírají strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

### **Článek I. Předmět Dodatku č. 1**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva následovně:

- a) Předmět díla se navyšuje o vícepráce, které budou provedeny z důvodu upřesnění skutečného počtu značek dopravního značení. Na základě požadavku třetí neopomenutelné strany PČR.

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	171 265,60 Kč
DPH 21%	35 965,78 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>207 231,38 Kč</b>

Detailní zdůvodnění jednotlivých víceprací je uvedeno v příloze č. 1 (ZBV č. 1) tohoto Dodatku č. 1.

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 doplňuje přílohu č. 8 Smlouvy (Oceněný výkaz výměr) o aktualizované soupisy prací s výkazem výměr.

**b) S ohledem na výše uvedené se článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy nahrazuje následujícím textem:**

„3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **7.031.864,65 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, doplněnému aktualizovanými soupisy prací, které jsou součástí ZBV č.1, jež tvoří přílohou č.1 Dodatku č. 1 Smlouvy.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 1.476.691,58 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **8.508.556, 23 Kč**

Cena díla dle SOD:

Cena bez DPH	6.860.599,05 Kč
DPH 21%	1.440.725,80 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>8.301.324,85 Kč</b>

Cena víceprací dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH	171 265,60 Kč
DPH 21%	35 965,78 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>207 231,38 Kč</b>

Cena díla dle SOD včetně Dodatku č. 1:

Cena bez DPH	7.031.864,65 Kč
DPH 21%	1.476.691,58 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>8.508.556, 23 Kč“</b>

**c) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 se doplňuje následujícím textem:**

„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 smlouvy, se doplňuje aktualizovanými soupisy prací s výkazem výměr, který jsou součástí ZBV č. 1, jež tvoří přílohu č.1 Dodatku č. 1 Smlouvy.“

2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 stanovené Dodatkem č. 1 činí celkem – 2,49 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 činí celkem 2,49% závazku a nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

**Článek II.**

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 064-07/2019/RK ze dne 25.02.2019
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
  - Příloha č. 1: ZBV č. 1
  - Příloha č. 2: Plná moc
  - Příloha č. 3: Smlouva o společnosti

V Praze dne.....

V Praze dne *12.3.2019*

Zhotovitel:

**Společnost Vsesulov – Robstav +  
AZ SANACE**  
Zastoupena vedoucím společníkem:  
**ROBSTAV STAVBY K.S**



Ing. Michal Tichovský

na základě plné moci

Objednatel:

**Středočeský kraj**



Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/229 Všesulov, most ev.č. 229-009**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Dopravní opatření**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**102 / 1**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel: Středočeský kraj  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 70891095

Zhotovitel: Společnost Všesulov - ROBSTAV + AZ SANACE

Vedoucí společnosti IČ: 27430774

Název a sídlo: **ROBSTAV stavby k.s.**  
**Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí**  
**397 01 Písek**

Společník IČ: 250 33 514

Název a sídlo: **AZ SANACE a.s.**  
**Pražská 53/37**  
**Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem**

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	171 265,60	171 265,60

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>171 265,60</b>	<b>171 265,60</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**102 Dopravní opatření**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

**1**

Strany smlouvy o dílo č. S-1693/DOP/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.5.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Vsesulov - ROBSTAV + AZ SANACE

ROBSTAV stavby k.s. Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí 397 01 Písek

AZ SANACE a.s. Pražská 53/37 Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	list
2. Změnový list	1	list
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	list
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	list
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	list
6. Přehled dalších dokladů	1	list
další doklady	32	listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor
5	RDK

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Jedná se o upřesnění skutečného počtu dopravního značení.

PČR vyjádřila dne 15.6.2018 nesouhlas s navrženou přechodnou úpravou dle PDPS. Na základě vyjádření bylo DIO přepracováno a dne 26.6.2018 PČR schváleno. Počet a druh dopravního značení byl v rámci tohoto povolenáčního řízení pro uzavírku upraven.

Tato změna vznikla na základě požadavku třetí neopomenutelné strany stavebního řízení - státního orgánu - Policie ČR.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>171 265,60</b>	<b>171 265,60</b>	<b>171 265,60</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Tomáš Cseri	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Josef Jírotka	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Michal Pietsch	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum	12.3.2019	podpis
--	-------	---------------	-------	-----------	--------

Zhotovitel	jméno	Ing. Michal Tichovský	datum		podpis
------------	-------	-----------------------	-------	--	--------

Číslo paré:

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: II/229 Všesulov, most ev.č. 229-009	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní opatření	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
77 475,20

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			77 475,20	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce		171 265,60	171 265,60	221,06%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	248 740,80	171 265,60	221,06%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		jméno	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Tomáš Cseri		
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Josef Jirotko		
Stavební dozor:	souhlasím	Michal Pietsch		
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny:	souhlasím	Ing. Jan Fidler		

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

## Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby: II/229 Všesulov, most ev.č. 229-009

Číslo a název SO/PS: 102 Dopravní opatření

Číslo a název rozpočtu: 102 Dopravní opatření

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS DOPRAV ZNAČKY ZAKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KPL	1,000	1,000	0,000	5 500,00	5 500,00			5 500,00	0,00	0,00
1	914164	B1 2ks., IS11c 18ks, IP10a 2ks, E13 2ks	KUS	24,000	166,000	142,000	132,00	3 168,00		18744	21 912,00	18 744,00	591,67
6	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KSDEN	2 880,000	19 920,000	17 040,000	6,82	19 641,60		116212,8	135 854,40	116 212,80	591,67
5	914464	IP 22 11ks	KUS	12,000	23,000	11,000	132,00	1 584,00		1452	3 036,00	1 452,00	91,67
7	914469	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 440,000	2 760,000	1 320,000	13,09	18 849,60		17278,8	36 128,40	17 278,80	91,67
2	914954	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMONT	KUS	32,000	130,000	98,000	11,00	352,00		1078	1 430,00	1 078,00	306,25
8	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÄJEMNÉ DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODAVKA, MONTÁŽ,	KSDEN	3 840,000	15 600,000	11 760,000	1,10	4 224,00		12936	17 160,00	12 936,00	306,25
4	916134	DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	330,00	660,00			660,00	0,00	0,00
10	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÄJEMNÉ	KSDEN	240,000	240,000	0,000	88,00	21 120,00			21 120,00	0,00	0,00
3	916314	DOPRAVNÍ ZÄBRANY Z2 - DODÄVKA, MONTÄŽ, DEMONTÄŽ	KUS	2,000	5,000	3,000	132,00	264,00		396	660,00	396,00	150,00
9	916319	DOPRAVNÍ ZÄBRANY Z2 - NÄJEMNÉ	KSDEN	240,000	600,000	360,000	8,80	2 112,00		3168	5 280,00	3 168,00	150,00
		<b>Celkem</b>						77 475,20	0,00	171 265,60	248 740,80	171 265,60	221,06

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/229 Vsesulov, most ev.č. 229-009

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	6 860 599,05
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7 031 864,65
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,50%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (6), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	171 265,60
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,60%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 058 179,72

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,50%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	171 265,60
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 430 299,53

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142668000-37		142 668 000,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -						
		Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis						
ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
	II/229 Vsesulov, most ev.č. 229-009	0,00	171 265,60	171 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 265,60	171 265,60	171 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	1	Dopravní opatření / upřesnění počtu značení	0,00	171 265,60	171 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 265,60	171 265,60	171 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1	
Název a evidenční číslo stavby:	II/229 Všesulov, most ev.č. 229-009	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravní opatření	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102 / 1	
<b>Součást dokumentace ZBV</b>		
Doklad	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací po všech změnách SO	1	
Policie ČR -schválení DIO + Dopravně inženýrské opatření-projekt RDS číslo zakázky DIO-98-6/2018 od firmy ADSUM spol. s r.o.	13	
Stanovisko Policie ČR k přechodné úpravě provozu na PK - nesouhlas z 15.6.2018 - původní DIO	1	
Rozhodnutí Mú Rakovník - povolení uzavírky včetně uváděných stanovení	15	
Stanovisko TDI	1	
Stanovisko AD	1	
počet listů celkem	32	

## ASPE 9

## Soupis prací po všech změnách SO

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 3005/08 II/229 VŠESULOV - MOST EV.Č. 229-009  
 číslo a název SO: 102 Dopravní opatření  
 číslo a název rozpočtu: 102 Dopravní opatření

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				5 500,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914164		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT B1 2ks., IS11c 18ks, IP10a 2ks, E13 2ks 2+18+2+2=24,000 [A]	KUS	166,000	132,00	21 912,00
6	914169		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ 24*120=2 880,000 [A]	KSDEN	19 920,000	6,82	135 854,40
5	914464		DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT IP 22 11ks	KUS	23,000	132,00	3 036,00
7	914469		DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ 12*120=1 440,000 [A]	KSDEN	2 760,000	13,09	36 128,40
2	914954		SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD, MONT, DEMON 12+18+2=32,000 [A]	KUS	130,000	11,00	1 430,00
8	914959		SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ 32*120=3 840,000 [A]	KSDEN	15 600,000	1,10	17 160,00
4	916134		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	330,00	660,00
10	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ 2*120=240,000 [A]	KSDEN	240,000	88,00	21 120,00
3	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	5,000	132,00	660,00
9	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ 2*120=240,000 [A]	KSDEN	600,000	8,80	5 280,00
9			Ostatní konstrukce a práce				243 240,80
C e l k e m							248 740,80
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
Celkem							248 740,80



Pomáhat a chránit

PCR - Schvařené DIO - KOLE



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor vnější služby Rakovník  
Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPS-197471-2/ČJ-2018-011206

Rakovník, dne 27. června 2018

Počet listů: 1

**Vyjádření k přechodné úpravě provozu na PK a k objízdné trase**  
K Vaší žádosti ze dne 26.6.2018, DIO-98-6/2018

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Rakovník vydává na základě ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích, na základě ustanovení § 24 odst. 2, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a na podkladě ustanovení § 77 odst. 2, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích následující písemné vyjádření ve věci:

**Uzavírka silnice II/229 – oprava mostu Všesulov**

**1) Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci**  
Dle předloženého schématu

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Rakovník, **souhlasí** s přechodnou úpravou na PK dle předloženého schématu za dodržení níže uvedených podmínek:

- dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno, provedeno a instalováno dle Technických podmínek 66 (II. vydání) Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci a v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., a vyhl. MDaS č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

**2) vyjádření k uzavírce**

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Rakovník, souhlasí s uzavírkou a stanovenou objízdnou trasou pro osobní a nákladní dopravu bez připomínek v rámci okresu Rakovník

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Rakovník, si vyhrazuje právo toto vyjádření změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.

**TOTO VYJÁDŘENÍ PLATÍ PRO OKRES RAKOVNÍK**

Vyřizuje:

por. Zby



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT RAKOVNÍK  
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 40  
269 33 RAKOVNÍK

www.policie.cz

npot  
vedc



Dukelských hrdinů 2319  
269 33 Rakovník

Tel.  
Ema





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ-VENKOV  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT



Č.j. KRPP-95645-2/ČJ-2018-031106-48

Plzeň 26.6.2018  
Počet listů: 1  
Přílohy: pdf DIO sign.

ADSUM spol. s r.o.  
Havlíčková 923  
273 51 UNHOŠŤ  
ISDS

**II/229 Všesulov – most ev.č. 229-009 (RA) - stanovisko k návrhu přechodné úpravy provozu na PK a vedení objízdné trasy**

k č.j.: bez ze dne 26.6.2018

DI Plzeň-venkov, v souladu s § 77 odst. 2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb., **souhlasí** s návrhem přechodné úpravy provozu na PK, za účelem realizace opravy mostu ev.č. 229-009 v obci Všesulov (RA) s tím, že:

- na silnici II/229 zejména v průtahu obcí Kožlany doporučujeme opakovaně doplnit SDZ IP 22 s příslušným textem

Schéma SDZ označeno a zasláno žadateli. Stanovisko je platné pro územní působnost zdejšího DI (situace č.1,2 a 3).

Práce na opravě mostu budou probíhat za úplné uzavírky PK v předmětném úseku. S vedením objízdné trasy souhlasíme.


Stanovisko je určeno k řízením podle zákona 361/2000 Sb. a 13/1997 Sb., v platném znění.

npor. Mgr. Pavel BURDĚJ  
vedoucí DI

Z.r.

por. Ing. Jaroslav FRONĚK  
dopravní inženýr DI

Doručovací adresa: Anglické náměstí 7, 306 09 Plzeň  
Zpracoval: por. Ing. Jaroslav Froněk





• **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ** •  
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM



Příloha k č.j. KRPP-95645-2/ČJ-2018-031106-48 ze dne 26.6.2018



Vypracoval: <b>Martin Frolík</b> tel.: [redacted]	Zodpovědný projektant, kontrola: <b>Martin Frolík</b>	 • <b>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</b> • PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM  ADSUM spol. s r.o. Havlíčková 923, 273 51 Unhošť provozovna: Lidička 7, 273 51 unhošť  <small>Č. 451 44 961, DIČ: CZ 451 44 961, IČ: 602016, z.s. 601703141/0100 Společnost veškerá od 21. února 1992 u Městského soudu v Praze, IČO: 601703141/0100</small>
Investor: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje</b> přísp. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5		
Objednatel (stavebník): <b>ROBSTAV stavby k.s.</b> Na Stínadlech 495, 397 01 Písek		
Stavba: <b>II/229 VŠESULOV</b> <b>MOST ev.č. 229-009</b>	Číslo zakázky: <b>DIO-98-6/2018</b>	
Objekt: <b>Dopravně inženýrské opatření - DIO</b> <b>Uzavírka silnice II/229</b>	Datum: <b>červen 2018</b>	
	Stupeň: <b>RDS</b>	
	Měřítko: <b>-</b>	
	Počet formátů: <b>10xA4</b>	
	Číslo přílohy:	Paré:



• **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ** •  
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM



Vypracoval: <b>Martin Frolík</b> tel.: 	Zodpovědný projektant, kontrola: <b>Martin Frolík</b>
Investor: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje</b> přísp. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5	
Objednatel (stavebník): <b>ROBSTAV stavby k.s.</b> Na Stínadlech 495, 397 01 Písek	



• **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ** •  
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM

ADSUM spol. s r.o.  
Havlíčková 923, 273 51 Úhořetice  
provozovna: Lidická 7, 273 51 Úhořetice



Č.Ú. 44 891, IČO: 44 891, IČ: 154206, I.Ú. 4032473/1/2006  
Společnost vznikla 30.11.2006 a 1.1.2007 byla přejmenována v Praze, společnost č.Ú. 44 891

Stavba:  
**II/229 VŠESULOV**  
**MOST ev.č. 229-009**

Číslo zakázky: <b>DIO-98-6/2018</b>
Datum: <b>červen 2018</b>
Stupeň: <b>RDS</b>
Měřítko: <b>-</b>
Počet formátů: <b>10xA4</b>

Objekt:  
**Dopravně inženýrské opatření - DIO**  
**Uzavírka silnice II/229**



Číslo přílohy:  
**POLICIE ČESKÉ**  
**KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ**  
**STŘEDOČESKÉHO**  
**DOPRAVNÍ INSPEKCE**  
**POŠTOVNÍ SCHRÁNKA**  
**273 33 RAKOVNÍK**








# Plzeňský kraj

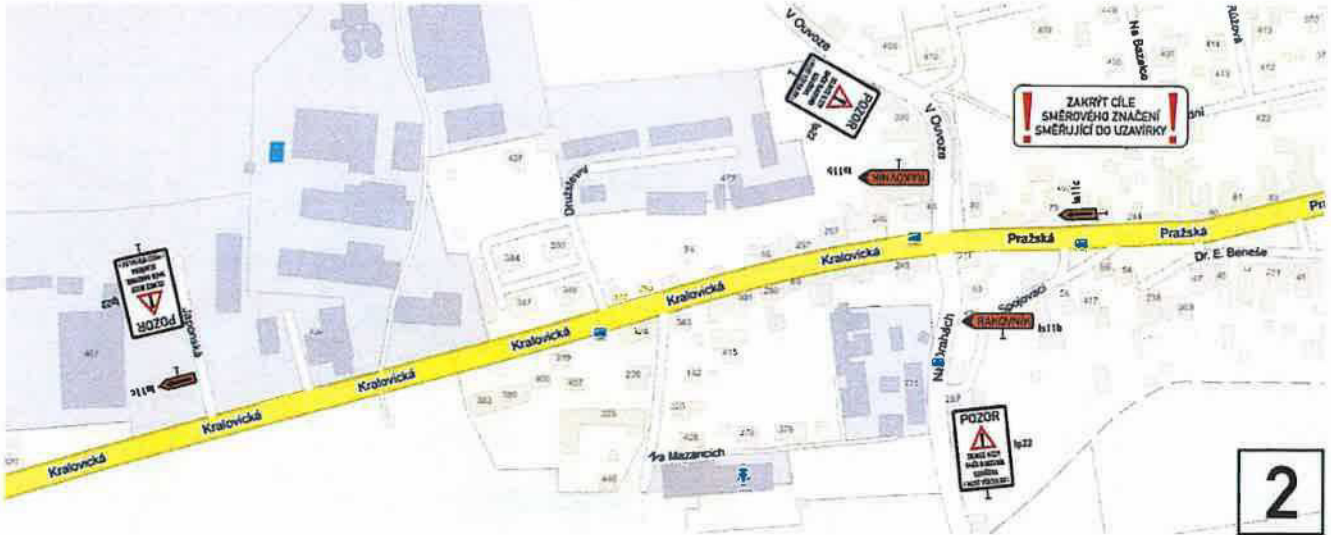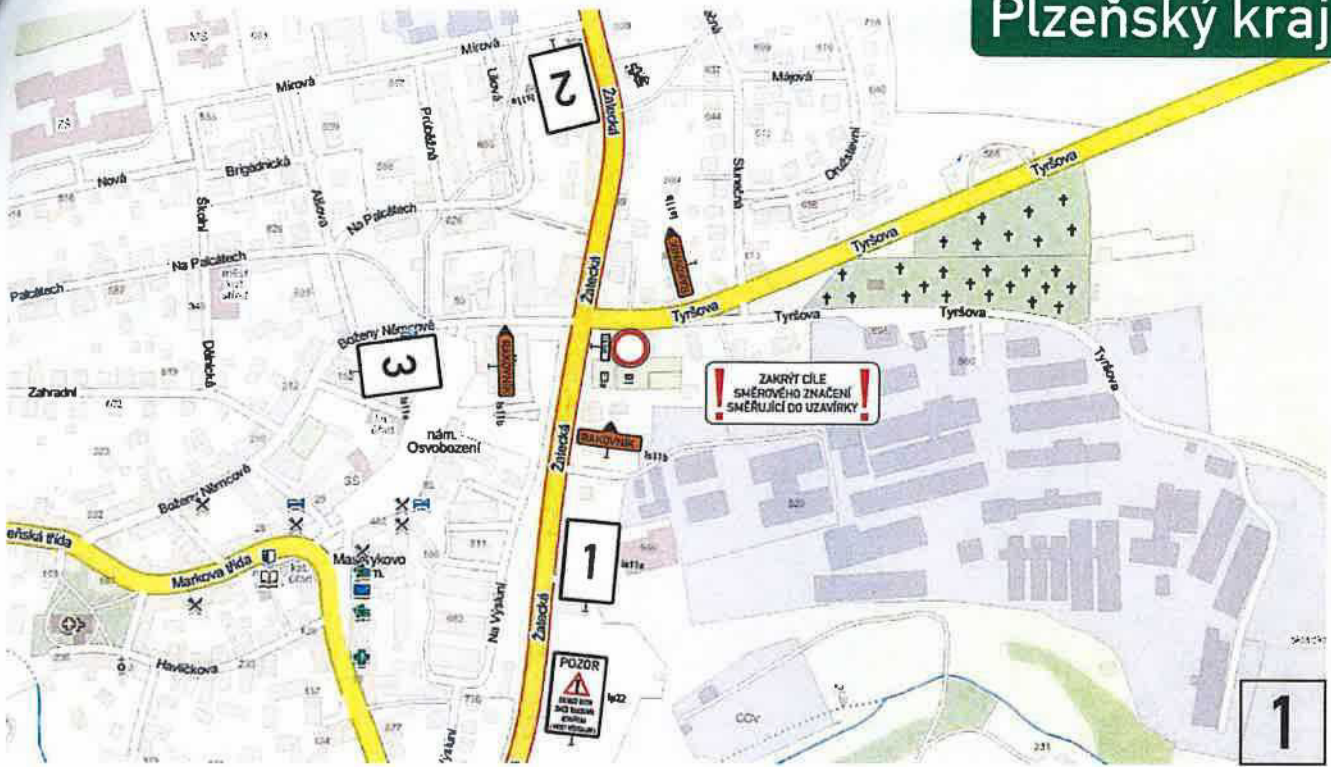

# Středočeský kraj

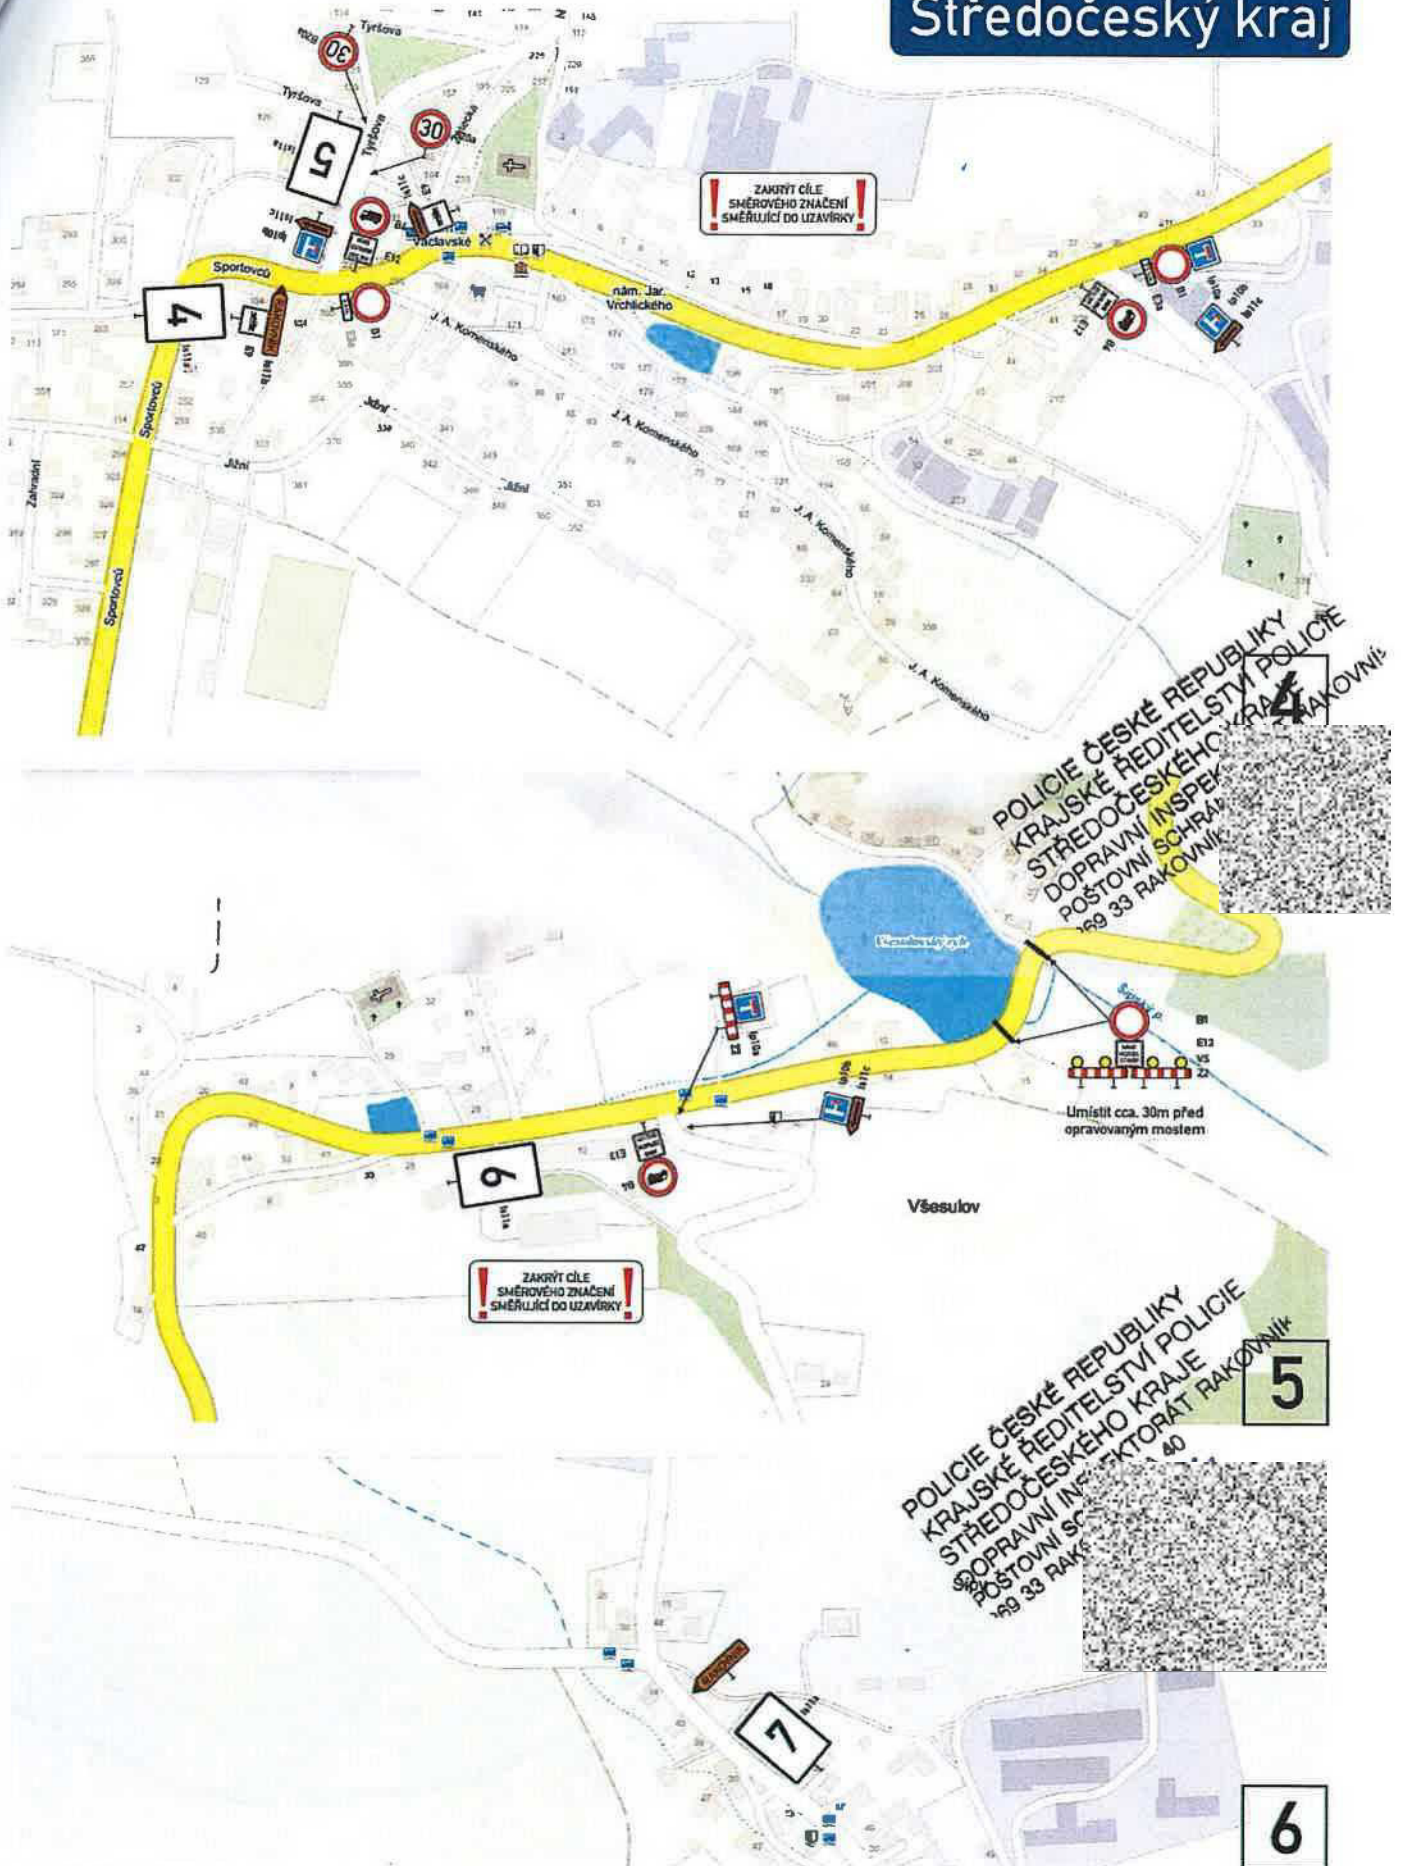


# Středočeský kraj

Zdeslav




7

Zavidov

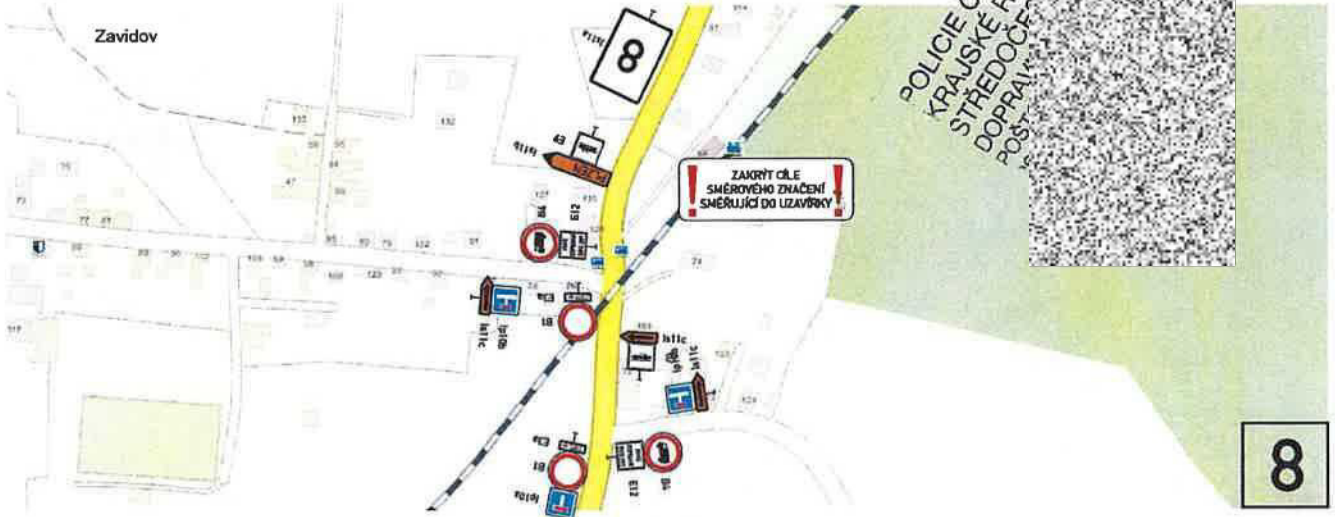


8

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT RAKOVNÍK  
PRÁNKÁ 40

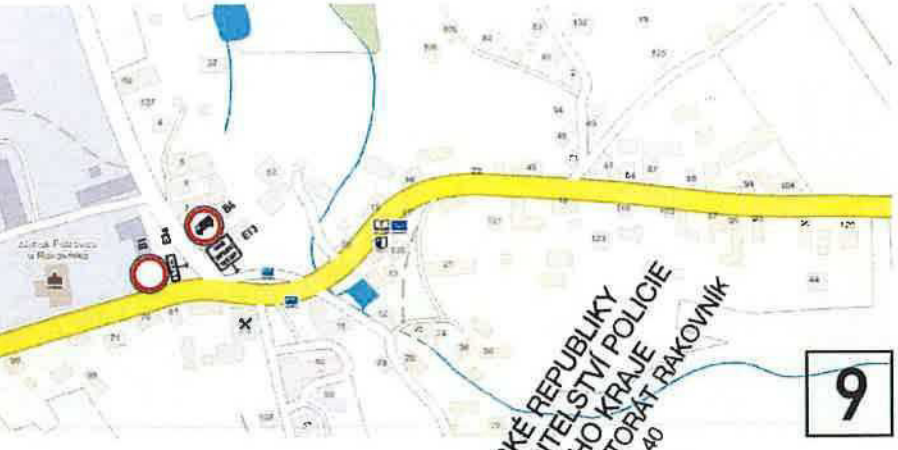

9


POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT RAKOVNÍK  
PRÁNKÁ 40

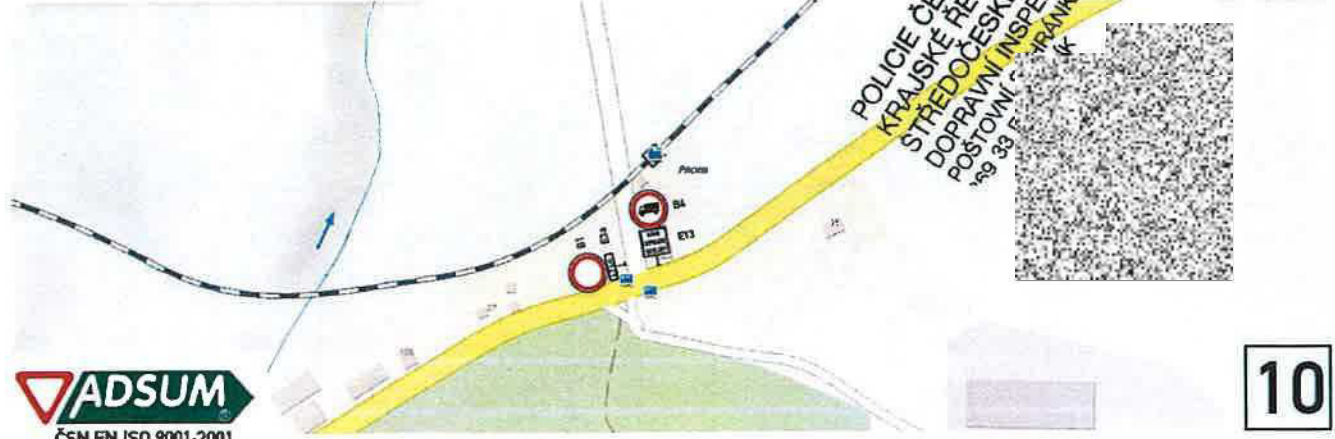

10



# Středočeský kraj

11

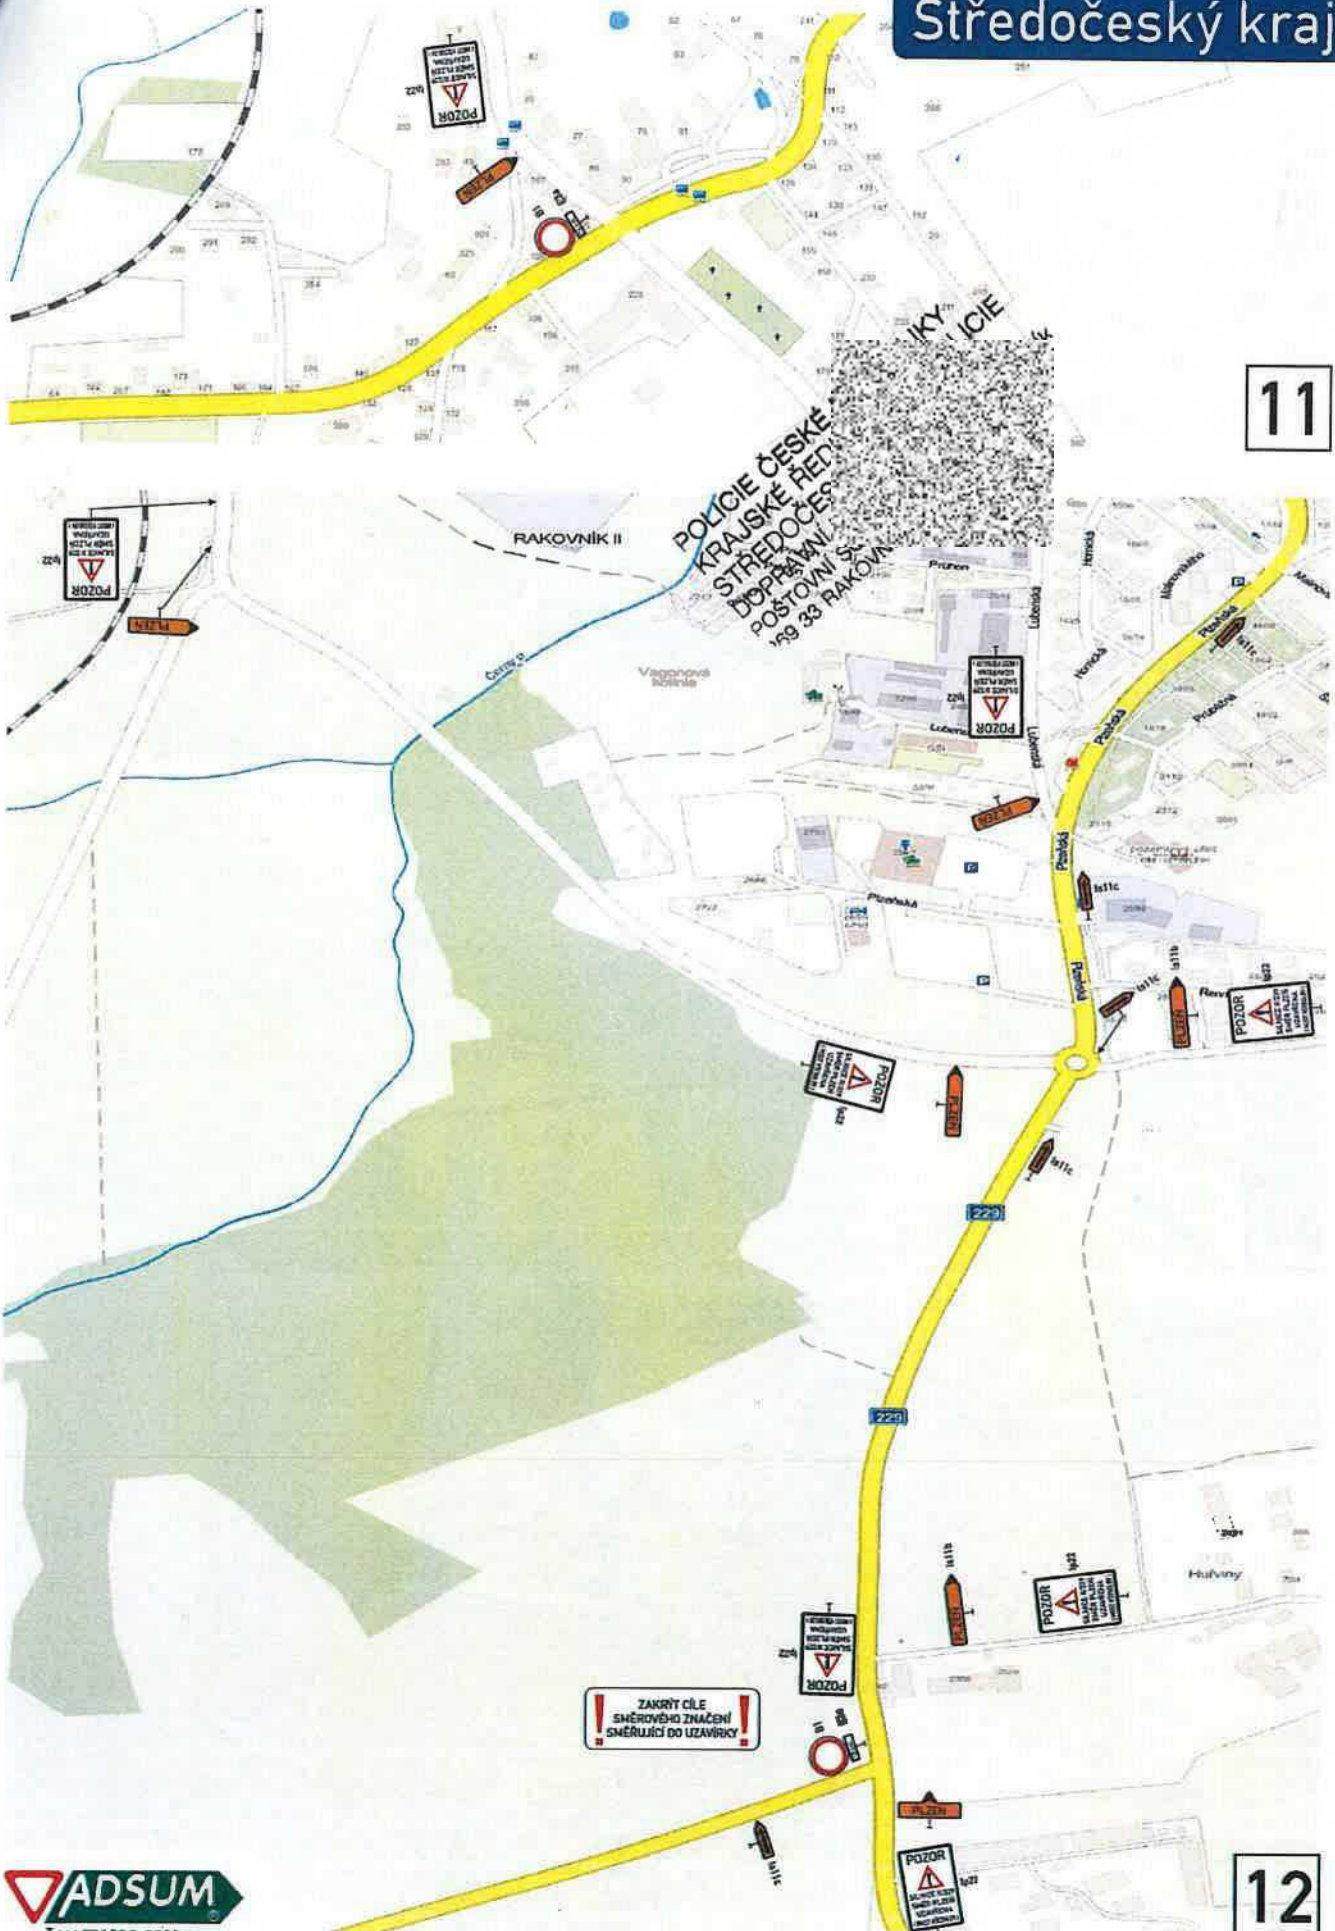


12


# Středočeský kraj

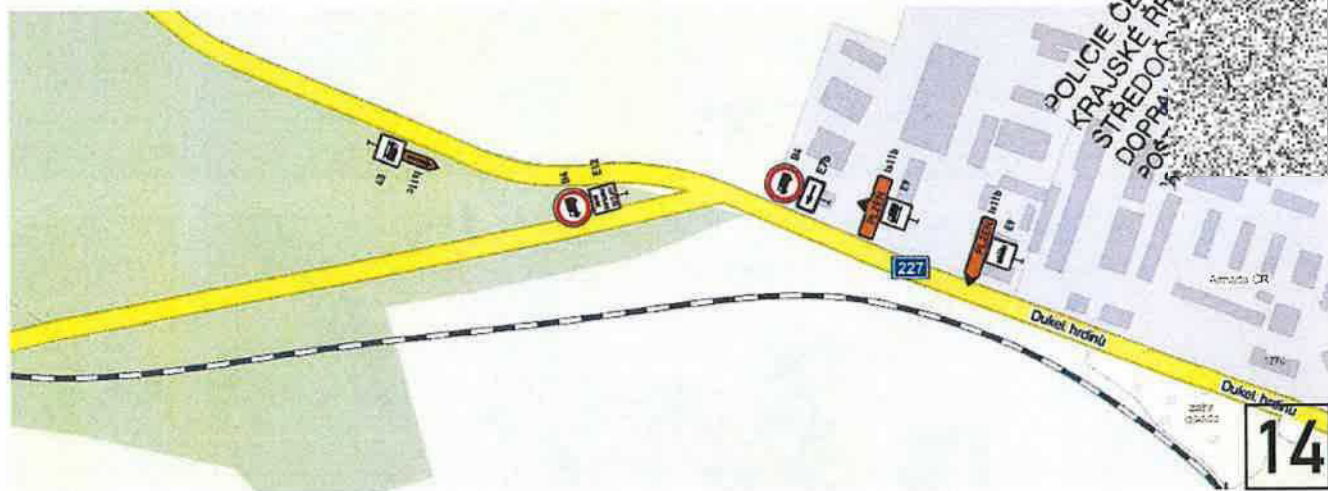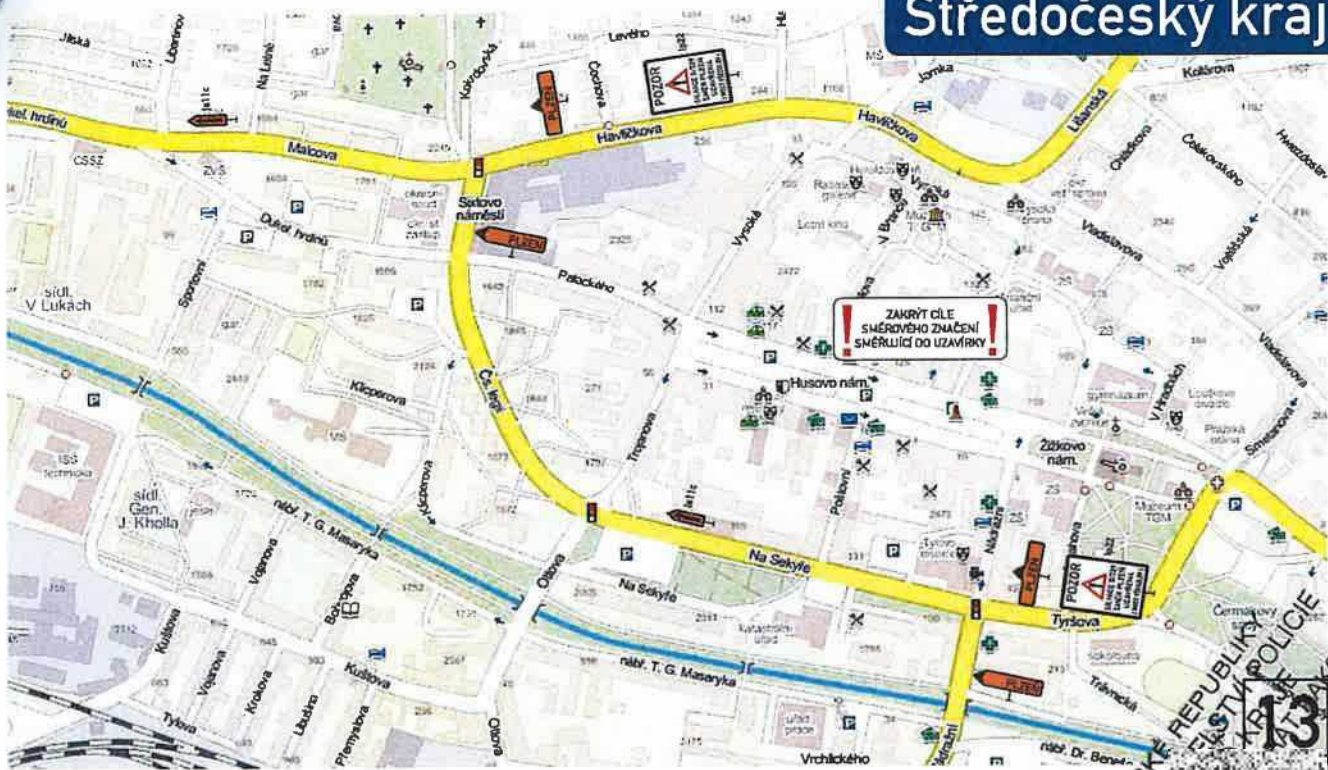


# Středočeský kraj

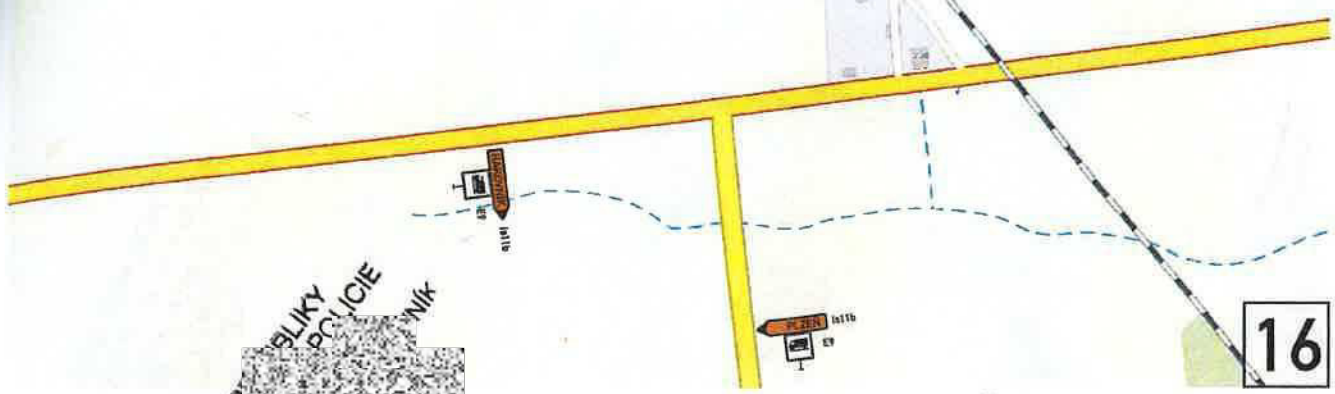

16

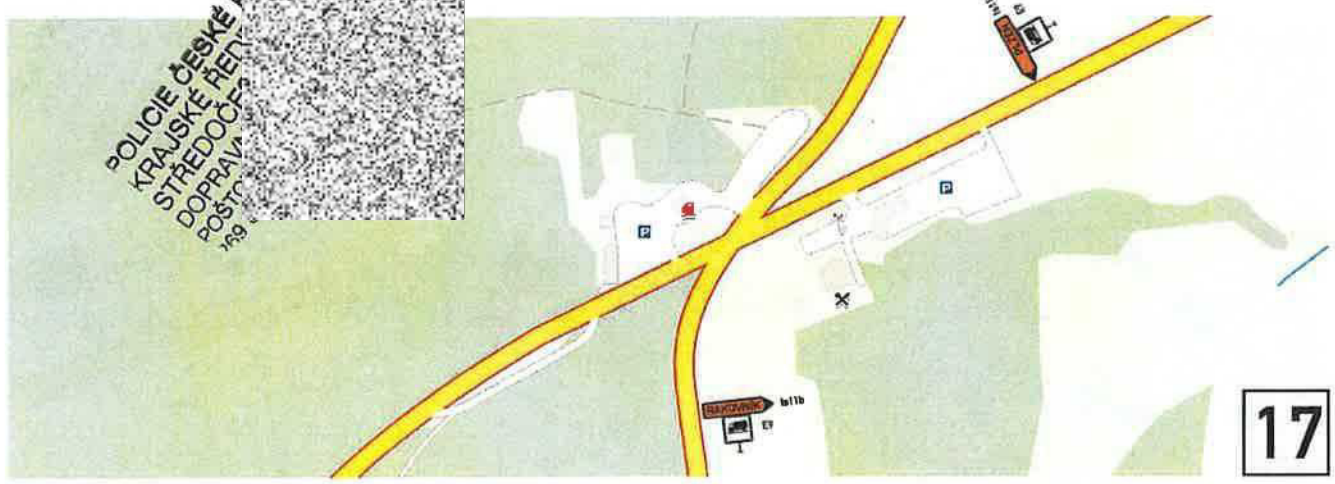

17

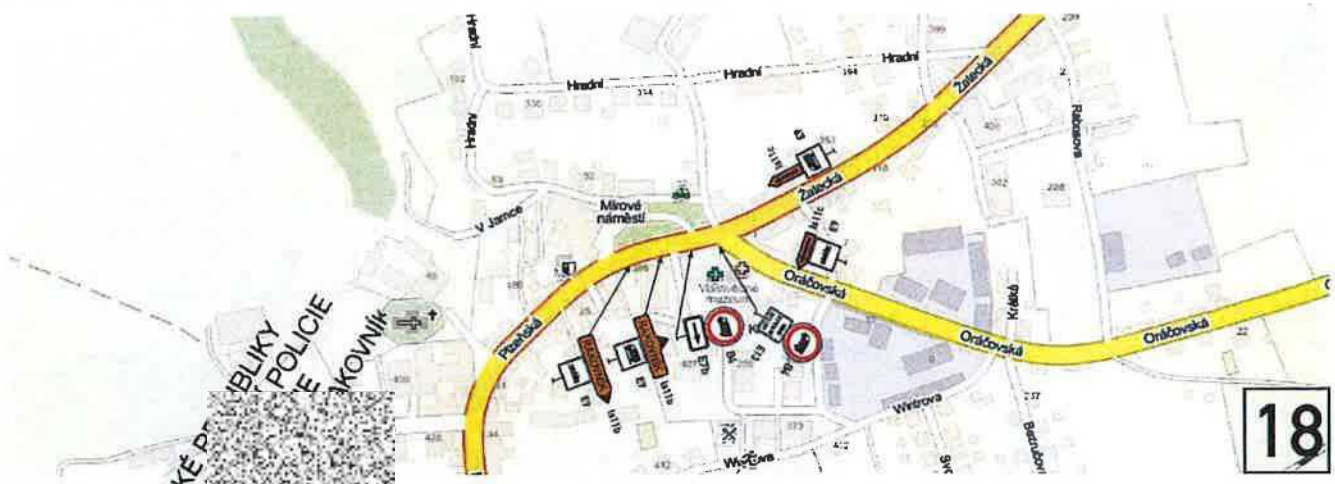

18



19



IS11a 1.



IS11a 2.



IS11a 3.



IS11a 4.




IS11a 5.



IS11a 6.



IS11a 7.

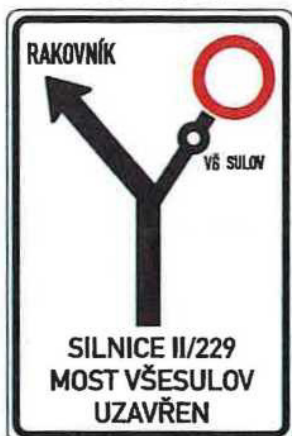

IS11a 8.





# POP - NESOUHLAS S PŘECHODNÝM DIO



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor vnější služby Rakovník  
Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPS-185150-2/ČJ-2018-011206

Rakovník, dne 15. června 2018

Počet listů: 1

**Vyjádření k přechodné úpravě provozu na PK a k uzavírce**  
K Vaší žádosti ze dne 14.6.2018

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Rakovník vydává na základě ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích, na základě ustanovení § 24 odst. 2, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a na podkladě ustanovení § 77 odst. 2, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích následující písemné vyjádření ve věci:

**„II/229 Vsesulov – most ev.č. 229 - 009“**

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Rakovník, **nesouhlasí** s přechodnou úpravou na PK dle předloženého schématu.

Odůvodnění:

Rekonstrukce výše uvedeného mostu v obci Vsesulov je relativně velký a dlouhodobý zásah do plynulosti silničního provozu. S navrženou objízdnou trasou pro nákladní automobily souhlasíme, avšak dle našeho názoru je její značení nedostatečné. S navrženou objízdnou trasou pro osobní vozidla nesouhlasíme. Je vedena po komunikacích III. třídy, kde jsou komunikace užší a v průběhu trasy je mnoho ostrých zatáček. Vzhledem k tomu, že uzavírka silnice II/229 je plánovaná na 5 měsíců, nesouhlasíme s navrženou objízdnou trasou. Objízdnou trasu pro osobní automobily navrhuje po silnici I/27 do obce Jesenice a dále po silnici II/228 do Rakovníka.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem požadujeme přepracování navržených objízdných tras (OA) a s tím související přechodné dopravní značení. Zejména klademe důraz na označení zákazů vjezdu pro nákladní automobily na silnici III. tříd při objízdné trase pro OA a na silnici II/229 (pro NA nerespektující objízdnou trasu).



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT RAKOVNÍK  
POŠTOVNÍ ÚŘAD  
269 33 RAKOVNÍK

npc  
ved



www.policie.cz

Dukelských hrdinů 2319  
269 33 Rakovník

