

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1610/00066001/2018
Číslo smlouvy Zhotovitele: 180012-1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

MaGe Construction s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
IČ: 24166189
DIČ: CZ24166189
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 184802
Jednající: Ing. Filip Kostelecký
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Filip Kostelecký
(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.06.2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č. 3275-2 přes potok Klejnarku za Starým Kolínem**“ a dále dne 21.11.2018 dodatek ke Smlouvě č. 1 (dále jen „**Dílo**“).

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou a dodatkem č. 1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 7 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na skutečnost, že došlo k přerušení plnění Díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, není možné pokračovat v plnění Smlouvy dle původního harmonogramu. Původně zamýšlené provedení bednění počítalo s využitím podskružení nosné konstrukce, která ale musela být kompletně demontována z důvodu ohrožení průchodu vodního toku v období jarního tání. Z důvodu zachování kvality správce mostního objektu nepovolil provádění izolace mostu v nevhodných klimatických podmínkách. Zároveň bylo dohodnuto nové řešení - monolitické římsy budou provedeny za využití lícových betonových prefabrikátů, které nevyžadují samostatné podskružení. Za tímto účelem Zhotovitel přepracoval výrobní projektovou dokumentaci a popsal výrobce lícových římsových prefabrikátů. Dodací lhůty všech výrobců na trhu limitují tuto stavbu z hlediska stanovení reálného harmonogramu pro její dokončení.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dále v souladu s čl. 6.7 bod a) Smlouvy ve znění dodatku č. 1 dohodly na změně termínu dokončení Díla a jeho předání Zhotoviteli. Článek 4.1. Smlouvy věta první se proto mění následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 10 dní od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 15.05.2019.“
2. Prodloužení plnění Díla bude probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a doplňuje tak Přílohu č. 5 Smlouvy - Časový plán výstavby - časový harmonogram ve znění dodatku č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Seznam příloh:

1. časový plán výstavby – časový harmonogram

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel:


**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

MaGe Construction s.r.o.
Ing. Filip Kostecký, jednatel

HARMONOGRAM

STAVBA: III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č.3275-2 přes potok Klejnarku za Starým Kolínem

Zhotovitel: MaGe Construction, s.r.o.

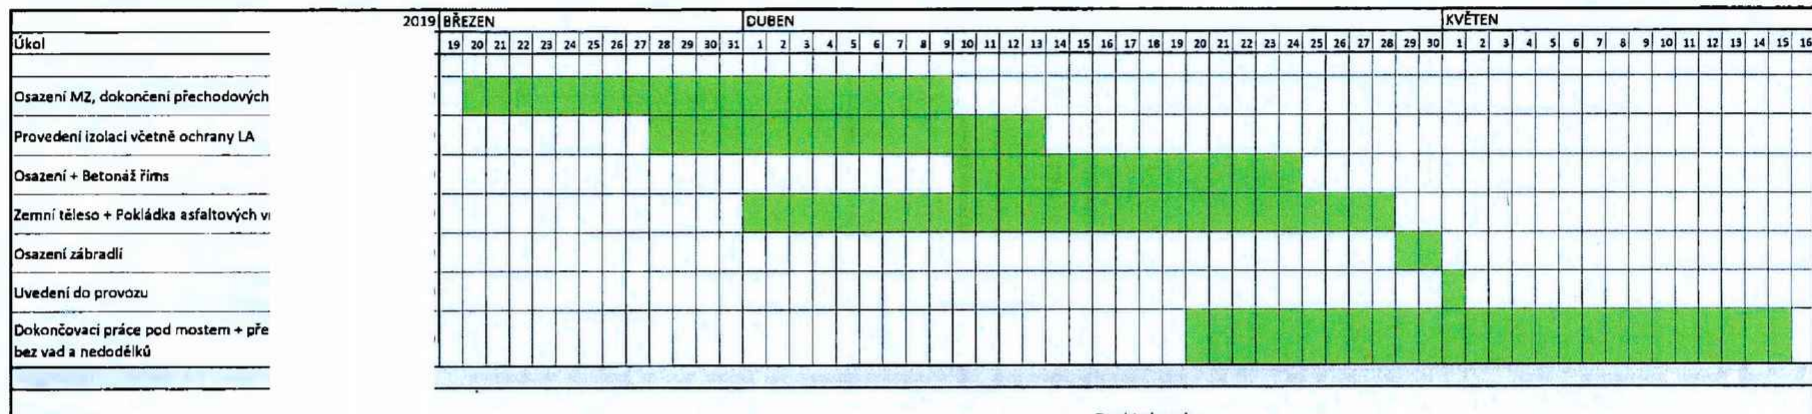

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V
