

## Technický list změny (TLZ) č. 5

<b>TLZ č./verze:</b>	ZL č. 5
<b>Datum předložení TLZ:</b>	21.01.2019
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	1862995011
<b>Ze dne:</b>	17.09.2018
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002477
<b>Stavba:</b>	INFRASTRUKTURA_Rekonstrukce laboratoří-opakování
<b>Objekt:</b>	budova A, budova B Praha 6 Technická 3 - 5
<b>Název změny:</b>	AH 03 - Stavební práce na chodbě
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>V PD ve výkrese laboratoře NÁVRH-Stavba je vyznačena zděná konstrukce pro obezdění vedení odsávání digestoří z laboratoře H 03. Do rozpočtu stavby tato konstrukce nebyla zahrnuta.</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Provedení zdění pórobetonové příčky, omítek, zastropení prostoru a dodávka dveří a zárubní v rozsahu dle přiloženého rozpočtu.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<p>AD s uvedeným návrhem na provedení změny souhlasí.</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	



Stavební a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce, úpravy povrchu, úpravy povrchu vnitřní, staveništní přesun hmot, konstrukce zámečnické, malby, VRN

**Přílohy:**

- 1) Položkový rozpočet VCP - 3xA4;
- 2) Půdorys laboratoře s vyznačením změn - 1xA4;

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	bez dopadu
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-
	Přípočet:	36 415, 32 Kč + DPH
	<b>Celkem:</b>	<b>36 415, 32 Kč +DPH</b>
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXXXX	26.02.2019		
Za TDI:	XXXXX	26.02.2019		
Za projektanta:	XXXXX	26.02.2019		
Za zhotovitele:	XXXXX	26.02.2019		



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200-06a** **Praha 6 - VŠCHT 2016**  
**ZL č. 5** **A H03**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 415,32 CZK
Základní DPH	21 %	7 647,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **36 415,32 CZK**

**Cena celkem s DPH** **44 062,54 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
<b>21</b>	<b>A H03</b>	<b>0</b>	<b>36 415</b>	<b>7 647</b>	<b>44 063</b>
1	VRN	0	760	160	919
2	Stavební	0	35 655	7 488	43 143
Celkem za stavbu		0	36 415	7 647	44 063

#### Poznámka:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

### Položkový rozpočet

S:	200-06a	Praha 6 - VŠCHT 2016
O:	ZL č.5	A H03
R:	1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				<b>759,88</b>
1	005121 R	Zařízení staveniště	kpl	1,00	75,99	75,99
2	005122 R	Provozní vlivy	kpl	1,00	37,99	37,99
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	75,99	75,99
4	005124010R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00	569,91	569,91
<b>Celkem</b>						<b>759,88</b>



### Položkový rozpočet

S:	200-06a	Praha 6 - VŠCHT 2016
O:	ZL č. 5	A H03
R:	2	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>6 938,28</b>	
1	317121047RT4	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	ks	1	351,00	351,00	RTS
2	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	9,23	636,00	5 870,28	RTS
3	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m2	6,00	119,60	717,00	RTS
Díl:	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 078,06</b>	
4	41602112R	SDK zaklopení, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	1,56	690,00	1 078,06	Indiv.
Díl:	6	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>2 568,71</b>	
7	602012142RT1	Štuk vnitřní i vnější, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	18,46	139,16	2 568,71	SOD
Díl:	61	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>4 264,26</b>	
12	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	18,46	231,00	4 264,26	SOD
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 274,25</b>	
43	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	1,24	961,29	1 192,00	SOD
44	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	1,24	66,98	82,25	SOD
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>17 165,90</b>	
60	767.R	D+M 800/1970/L plechové dveře vč. bezpečnostního kování, vložky a povrchové úpravy	ks	1	16 800,00	16 800,00	Indiv.
64	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr.	%	168,00	2,18	365,90	SOD
Díl:	784	<b>Malby</b>				<b>2 365,98</b>	
82	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	8,10	32,78	265,52	SOD
83	784191301R00	Penetrace podkladu protiplísňová, 1x	m2	25,39	26,29	667,57	SOD
84	784195612RP0	Malba tekutá protiplísňová, bílá, 3x	m2	25,39	56,48	1 432,89	SOD
<b>Celkem</b>						<b>35 655,44</b>	



## Technický list změny (TLZ) č. 6

TLZ č./verze:	ZL č. 6
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	1862995011
Ze dne:	17.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002477
Stavba:	INFRASTRUKTURA_Rekonstrukce laboratoří-opakování
Objekt:	budova A, budova B Praha 6 Technická 3 - 5
Název změny:	A 229, 229a - Doplnění mycího centra
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>V místnosti A 229 nebyly do realizace zařazeny mycí centra položka č.01a náležící k laboratorním stolům. Chybějící část dodávky, která byla uvažována v PD stavby byla proto doplněna do rozpočtu a předána k realizaci.</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Dodávka a montáž mycího centra laboratorního stolu položka č. 01a v počtu 2 ks.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<p>souhlasí</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	





Interiér

**Přílohy:**

- 1) Položkový rozpočet VCP - 3xA4;
- 2) Půdorys laboratoře s vyznačením změn - 1xA4;

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	bez dopadu
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-
	Přípočet:	178 316,40 Kč + DPH
	<b>Celkem:</b>	<b>178 316,40 Kč + DPH</b>
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	
Za objednavatele:	xxxxx	26.02.2019		
Za TDI:	xxxxx	26.02.2019		
Za projektanta:	xxxxx	26.02.2019		
Za zhotovitele:	xxxxx	26.02.2019		





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 200-06a VŠCHT Infrastruktura 2018**  
**ZL č.6 A 229, 229a - Doplnění mycího centra**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	178 316,40 CZK
Základní DPH	21 %	37 446,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH 178 316,40 CZK**

**Cena celkem s DPH 215 762,84 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
<b>25</b>	<b>A 229, 229a</b>	<b>0</b>	<b>178 316</b>	<b>37 446</b>	<b>215 763</b>
1	VRN	0	3 496	734	4 231
9	Interiér	0	174 820	36 712	211 532
Celkem za stavbu		0	178 316	37 446	215 763

### Položkový rozpočet


S:	200-06a	Praha 6 - VŠCHT 2016
O:	ZL č.6	A 229, 229a
R:	1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	005121 R	Zařízení staveniště	kpl	1,00	349,64	349,64
2	005122 R	Provozní vlivy	kpl	1,00	174,82	174,82
	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	349,64	349,64
3	005124010R	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00	2 622,30	2 622,30
<b>Celkem</b>						<b>3 496,40</b>

### Položkový rozpočet

S:	200-06a	Praha 6 - VŠCHT 2016
O:	ZL č.6	A 229, 229a
R:	8	Interiér

P.č.	laboratoř/ učebna	popis výrobku a prací	MJ	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH
č.01a	25 A-229,229a	Celoplastové mycí centrum	ks	2	87 410,00	174 820,00
						<b>174 820,00</b>

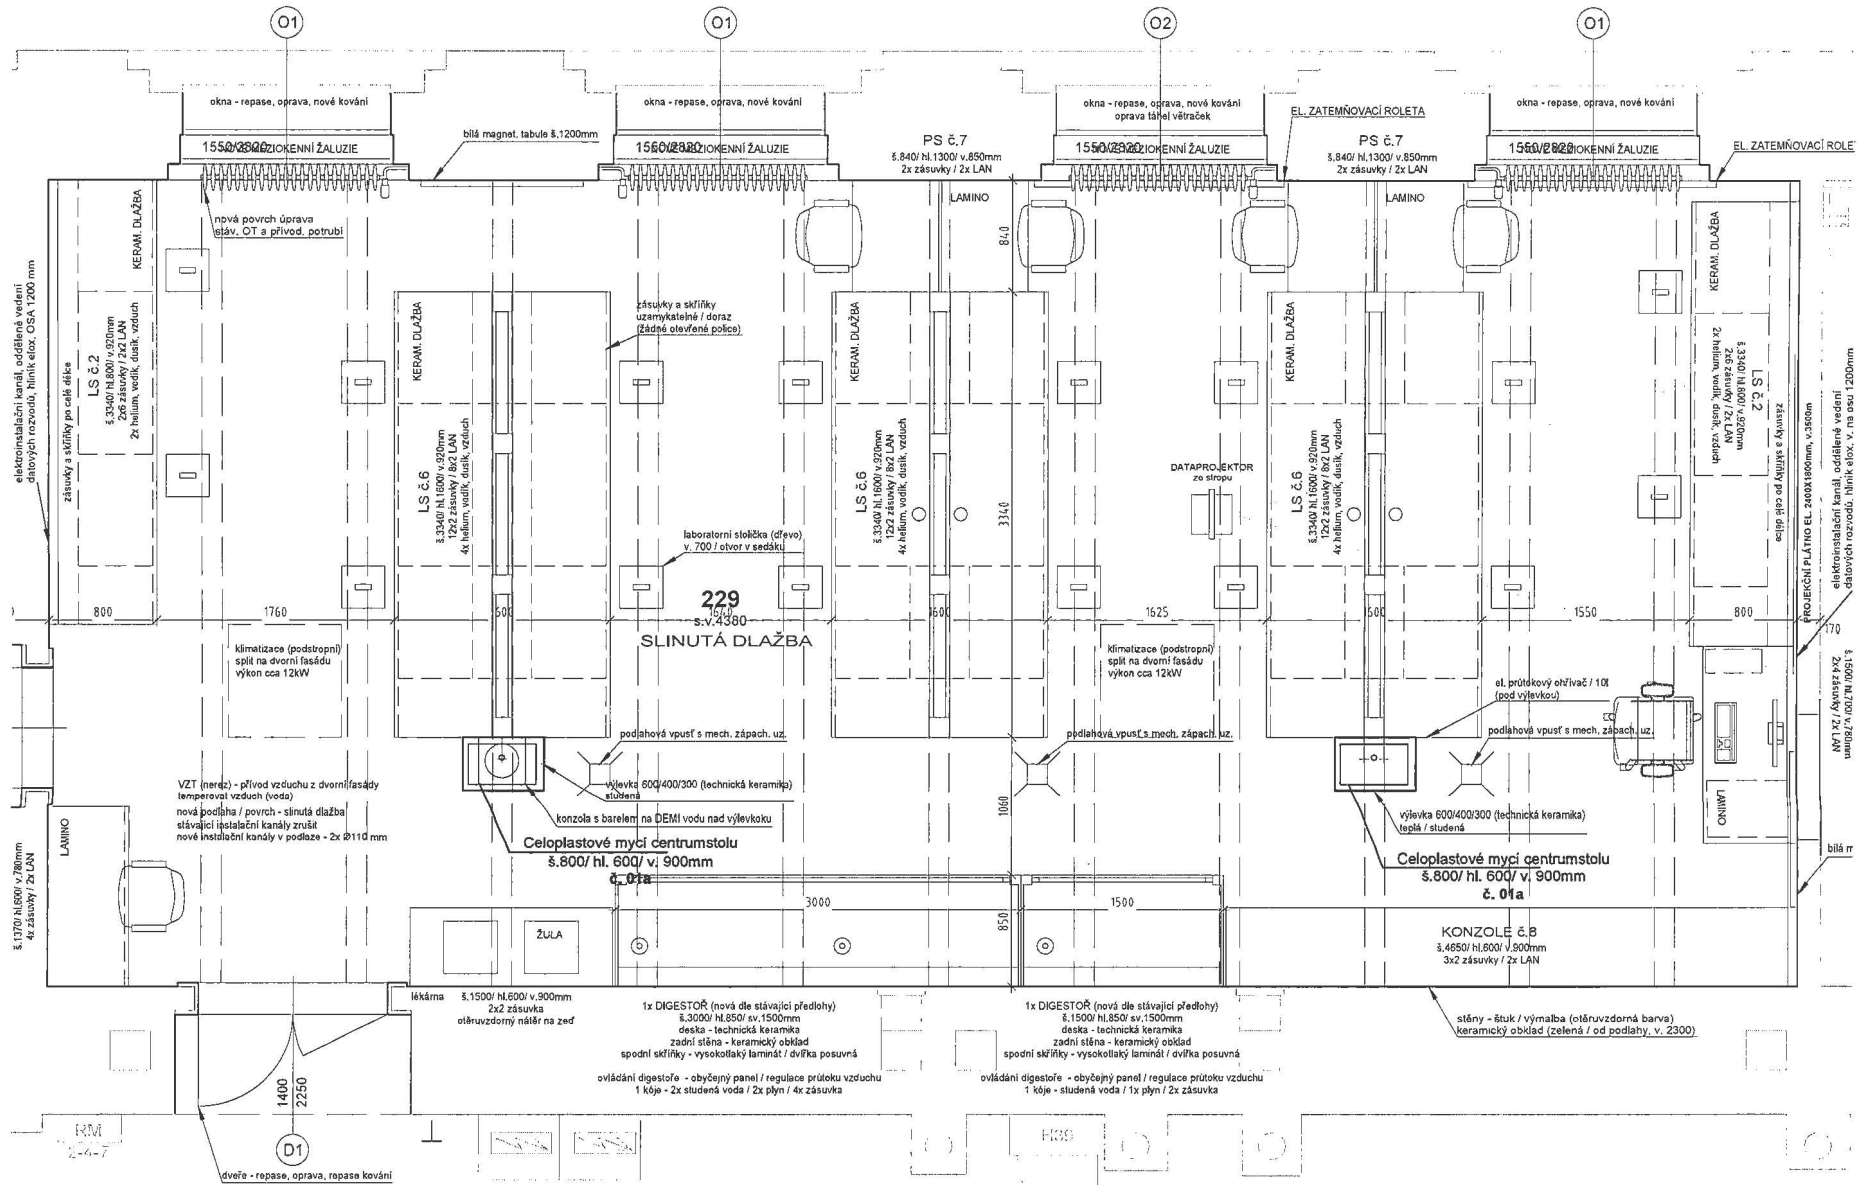

**ZMĚNA: Z.L. č. 6 - Dodávka a montáž mycího centra laboratorního stolu položka č. 01a v počtu 2 ks.**
