

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 023

Klient: **Městská část Praha 7**

**ZMĚNOVÝ LIST**

**Číslo: 023**

**Změna portálů výtahů**

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

**GD – Společnost pro novou radnici Praha 7**

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

**10. 01. 2019**

PŘÍJEMCE:

**Městská část Praha 7**

Zástupce objednatele na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE:

**15. 01. 2019 / 21. 01. 2019**

**STRUČNÝ PŘEHLED:**

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

**Na základě požadavku AD a INV záměna oplechování portálů výtahů za profil tl. 5 mm**

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Na základě požadavku AD /INV je nově změněna tl. materiálu levé a pravé strany (mimo střed mezi výtahy) z 2 na 5 mm (viz Příloha č. 2 – Revize ostění – A)

Toto řešení zhotovitel ocenil, viz Příloha č. 1 - Kalkulace změny.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Kalkulace změny

Příloha č. 2 – Revize ostění - A - nákres rozsahu v typickém patře

**ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

**Změna vyvolaná požadavkem objednatele.**

**CENOVÝ DOPAD:**

VÍCENÁKLAD: 60 712,86 Kč bez DPH

MĚNĚNÁKLAD: 0,- Kč bez DPH

**CELKEM DOPAD DO CENY: 60 712,86 Kč bez DPH**

**ČASOVÝ DOPAD:**

Vliv na harmonogram výstavby: **NE**

Termín dokončení projekčních prací: **NE**

Termín dokončení realizace změny: **NE**

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 023

Klient: Městská část Praha 7

**VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI**

SCHVÁLENÍ: ANO

DATUM: 5.2.19

CONTRACTIS, s.r.o.

PODPIS

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:**

SCHVÁLENÍ: ANO

DATUM: 5.2.19

Dvořák & partneři, s.r.o.

PODPIS

**VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:**

SCHVÁLENÍ: ANO

DATUM: 5.2.2019

Atelier bod architekti s.r.o.

PODPIS

**GENERÁLNÍ DODAVATEL:**

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: 5.2.2019

GEOSAN GROUP a.s. – Metrostav a.s.

**ZAMÍTNUTÍ:**

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM: .....

PODPIS

**ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.**

**DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:**

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		

Příloha č.1 ZL č. 023 - list 1

Akce: Nová radnice pro Prahu 7  
Klient: Městská část Praha 7

## Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 023

### Oplechování výtahů

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cena za realizaci změny - viz list NRP7 změna - oplechování výtahů	kpl	1	60 712,86	60 712,86
<b>odpočet celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>přípočet celkem</b>				<b>60 712,86</b>
<b>Celkem</b>				<b>60 712,86</b>



**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

**NRP 7 - oplechování výtahů**

Místo:

Datum: 15.01.2019


Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>60 712,86</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				60 712,86	
D	767		Konstrukce zámečnické				60 712,86	
1	K	Z04a	Příplatek k zámečnické konstrukci Z 04 u výtahu 1.PP - 9.NP. KONSTRUKCE: Boční plechy (levá strana a pravá strana -mimo středu mezi výtahy) tloušťky 5mm, lakováno práškovým lakem RAL	pol.	1,000	60 592,00	60 592,00	
2	K	998767204	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky přes 24 do 36m	%	1,820	66,40	120,86	CS ÚRS 2017 01

PŘÍLOHA č.2 - REVIZE OSTĚNÍ - A - MAXIMES ROZSAHU V TYPICKÉM PATŘE

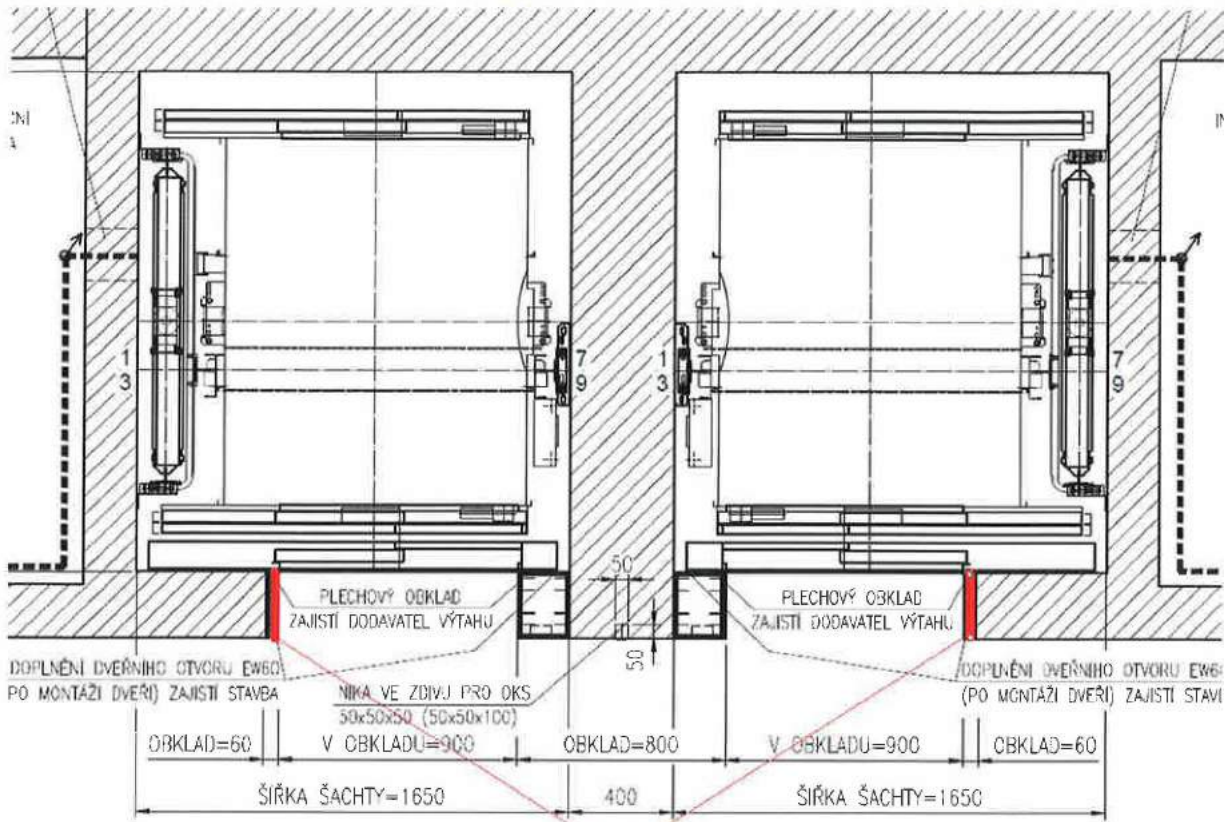

Levá a pravá strana znázorněná červeně je nový požadavek architekta o plech tloušťky 5 mm, šířka dle ostění, na výšku dveří 2160 mm, provedení RAL 7016

Prostřední část beze změn dle požadavku architekta.

POHLED OBECNÉ PATRO M1:30

