

00371/2019



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 1197/2018

č. smlouvy zhotovitele: BTD 1704



MKOLP0028YVL

### I. Smluvní strany

#### I. Objednatel:

Město Kolín  
 se sídlem: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I  
 zastoupené: Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města  
 IČO: 00235440  
 DIČ: CZ00235440  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín  
 Číslo účtu: 3661832/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta města  
 Zástupce objednatele ve věcech technických:

[Redacted]

(dále: „objednatel“)

(dále jen: „Objednatel“)

a

#### II. Zhotovitel:

SYSTEMATICA s.r.o.  
 se sídlem: Jindřišská 33, Pardubice, PSČ: 530 02  
 IČO: 28851587  
 DIČ: CZ28851587  
 zastoupen: [Redacted]  
 bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pardubice  
 číslo účtu: 115-1782340257/0100  
 telefon: 602434952  
 e-mail: [Redacted]

(dále jen: „Zhotovitel“)

### II.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 15. 10. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1197/2018 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Kolíně“.

### III.

Podle Smlouvy o dílo je celkový termín zhotovení díla dle čl. 4.5 - 17 týdnů od předání staveniště = 119 dnů.

Předání staveniště	25. 10. 2018	
Práce probíhaly do	16. 12. 2018	tj. 53 dnů
<b>Přerušení prací od</b>	<b>17. 12. 2018</b>	
<b>Přerušení prací do</b>	<b>05. 03. 2019</b>	<b>tj. 79 dnů</b>
Zahájení prací od	06. 03. 2019	
Ukončení prací	10. 05. 2019	tj. 66 dnů
Celkem dnů prací		119 dnů

S odkazem na čl. 4.3.

„pokud provádění prací připadne do zimního období, při kterém nelze provádět stavební práce v souladu s projektovou dokumentací a dle výkazu výměr, na základě dohody obou smluvních stran dojde v tomto případě k uzavření dodatku smlouvy s úpravou doby plnění předmětu díla se zohledněním doby, po kterou nelze provádět příslušné stavební práce“.

a s odkazem na čl. 9.1.3.

„zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění díla na základě rozhodnutí objednatele a dále je tak oprávněn učinit v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovolujících dodržení stavebně technologických postupů provádění díla“.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

1. Na změně termínu dokončení a předání díla.

Článek 4. Místo, způsob a doba plnění odstavce 4.5 smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést a dokončit Dílo Akceptací Díla ve smyslu čl. 8.2 této Smlouvy nejpozději do 10. 5. 2019.

#### IV.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 10. 2018 beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.
6. „Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.“
7. Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 1. 4. 2019, usnesení 665/17/RM/2019.

Příloha č. 1 – Vyjádření TDI

Příloha č. 2 – Zápis ze stavebního deníku ze dne 17.12.2018 a 6.3.2019

Příloha č. 3 – Prováděcí dokumentace – podmínky montáže


V Kolíně dne 9.4.2019

za objednatele  
Mgr. Michael Kašpar  
místostarosta města



V Pardubicích dne 9.4.2019

za zhotovitele  
SYSTEMATICA s.r.o.



SYSTEMATICA s.r.o.  
Jindřichská 33  
530 02 PARDUBICE  
IČ: 288 91 587 · DIČ: CZ288 91 587

## **Věc : Vyjádření technického dozora investora k dodatku SoD č.1**

Akce: „Automatické parkovací zařízení pro kola v Kolíně“.

Investor: Město Kolín, Karlovo nám 78, Kolín I

Dodavatel stavby: Systematika s.r.o., Jindřišská 33, 530 02 Pardubice

Stavba byla zahájena na přelomu měsíce října a listopadu. I přes důsledný přístup dodavatele k provádění a rychlosti prací, však vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v měsíci prosinec, nebylo možné stavbu opláštit. Do té doby byly dokončeny:

- Zemní práce
- Betonáž základových konstrukcí a svislých betonových stěn
- Dodávka a montáž ocelové konstrukce celé věže
- Dodávka a montáž hlavních dílů technologie věže.
- Montáž střešní konstrukce a krytiny

Pokračování prací však při současném dodržení předepsaných technologických postupů, nebylo možné.

Dne 17.12.2019 došlo zápisem ve stavebním deníku k přerušení prací v souladu s ustanovením odst. 4.3 a 9.1.3 uzavřené SoD.


Stavba byla provizorně zakryta – plachtami. V průběhu přerušení prací byl průběžně monitorován stav provizorního opláštění věže a oplocení pozemku, v případě závad byly neprodleně odstraňovány.

Dne 6.3.2019 po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem došlo ke znovuzahájení prací.

V souladu se smlouvou uzavřenou mezi Městem Kolín a společností Systematika s.r.o., je potřeba uzavřít dodatek smlouvy, který bude specifikovat termín dokončení akce.

Jedná se pouze o stanovení termínu dokončení stavby, dodatek nepředpokládá úpravu ceny.

V Kolíně 8.3.2019



Denní záznamy stavby

Datum

17.12.2019

V souladu s uzavřenou SÚD č. 1197/2018, kapitolou (zvl.) 4.3, 9.1.3 oznamuje statoritel zpracování stavebních prací z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek, které neumožňují dodržení technologických postupů a montážních podmínek uvedených v předané výrobní dokumentaci. Nemí práce při budování náspadu a chodníku kolem věže zatím nelze provést z důvodu zachování rovnosti terénu v průměru 2,5 m. 3m umožňujícího pohyb montážních plošin nutných pro zabetonování věže.


Pro dobu přerušování stavebních prací bude provedeno pravidelné kontroly optocení, staveniště a provádění záhybů věže plachtami.

Znovuzabetonování prací bude uzavřeno dodatečně s upřesněním terénu dokončením.



6.5.2019

ESKÝ TO DNE BYLY PO DOBROU S INVESTOŘEM  
K PŘEVZATÍ KLIEMATICKÉ PODMÍNKY PRÁCE  
K POKROČILÉ DÍLA.






---


Výrobní, dílenská a prováděcí dokumentace  
Podklady pro instalaci a kompletaci zařízení BT 2.1 verze č.4/2018

---

# AUTOMATICKÁ KOLÁRNA BIKETOWER – Kolín

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO SKLADOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL

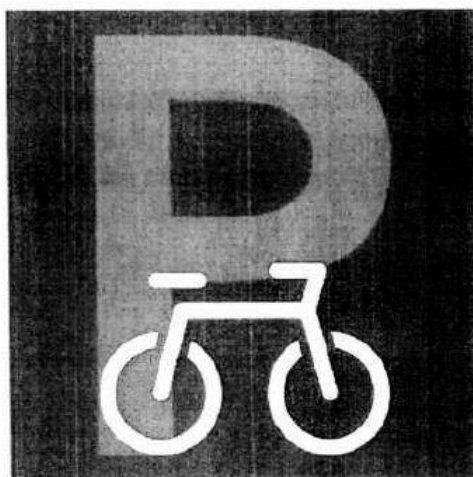



## 1. ÚVODNÍ ČÁST

### a) Vymezení předmětu a účelu typového podkladu (TP)

Podklad pro projektování kolárny typu BT2.1 výrobce Systematica s.r.o. Požadavky uvedené v tomto dokumentu musí být zakomponovány do projektové dokumentace konkrétního řešení pro dané umístění výrobku.

### b)

#### **Projektovou dokumentaci konkrétního řešení zajišťuje odběratel!**

Takto zpracovaná projektová dokumentace musí být zkontrolována výrobcem, který ji v případě souladu s tímto TP opatří kontrolním razítkem. Zkontrolovaná projektová dokumentace je podkladem pro montáž výrobku

### c)

#### **Klimatické podmínky montáže - stanovisko výrobce**

Automatická kolárna je stroj, který obsahuje elektrické prvky (motory, počítače, třífázové baterie, kabely), skleněné lepené prvky a přesné mechanické prvky. Proto se montáž musí provádět za příznivých klimatických podmínek:

- Teplota vyšší než +5°C celých 24 hodin,
- Sucho
- při relativní vlhkosti vzduchu nižší než 60%.

Z technologických důvodů nelze montáž přerušovat na delší dobu než tři dny.

Montáž automatické kolárny v zimním období je možné provádět pouze za příznivých klimatických podmínek.

#### **Montáž nelze provádět:**

- za nižších teplot vzduchu pod +5°C i krátkodobě,
- za vlhka a deště,
- při sněžení
- při relativní vlhkosti vzduchu vyšší jak 60%.

V zimním období od 15.11. do 30.3. jsou výše uvedené klimatické podmínky nepříznivé a velmi proměnlivé, proto se standardně montáž neprovádí.

Dílo bude prováděno s ohledem na možnou nepřízeň počasí, kterou lze v termínu plnění díla s ohledem na zimní období očekávat, v případě nepříznivých podmínek bude dílo přerušeno a domluven další postup včetně úhrady vícenákladů.

## 2. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

### a) Výrobce

Systematica s.r.o., Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, IČ: 28851587, DIČ: CZ28851587
