



## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

### **„NOVÁ PSYCHIATRIE – NEMOCNICE TÁBOR, A.S.“ (STAVENIŠTĚ A)**

*který spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely*

#### **Smluvní strany:**

##### **1) Nemocnice Tábor, a.s.**

se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

IČ: 26095203


DIČ: CZ699005400

právní forma: akciová společnost

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463

zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva

MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva

bankovní spojení: 

*(dále jen „Objednatel“);*


##### **2) PRADAST spol. s r.o.**

se sídlem Nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice

zastoupený Ing. Petrem Steinbauerem

IČO: 60826053

DIČ: CZ60826053

Bankovní spojení: 

č. ú.: 

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Petr Steinbauer

Ve věcech technických je oprávněn jednat stavbyvedoucí (autorizovaná osoba v oboru Pozemních staveb): Ing. Petr Steinbauer, číslo autorizace: 0101082

Společnost je zapsána v OR vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777

*(dále jen „Zhotovitel“)*

*Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, příp. kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“ nebo též „Účastník dohody“)*



## Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9.10.2018 uzavřely na základě veřejné zakázky ev. č. ve VVZ: Z2018-006872, interní číslo VZ: 05/03/2018/OBCH (dále také jen „zadávací řízení“), část 1. smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výstavba pavilonu *Nová psychiatrie – Nemocnice Tábor, a.s.* (Staveniště A). Vzhledem k tomu, že dochází ke změně Díla – dle změnového listu č. 7 a 8, smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). Zhotovitel v souladu s ustanovením odstavce 3.8 Smlouvy předkládá výpis teplot po dnech v místě stavby jako doklad o nesplnění klimatických podmínek vhodných ke splnění technologických postupů konstrukcí monolitické části stavby. Na základě naplnění této podmínky smlouvy Zhotovitel předložil požadavek na prodloužení termínu dokončení díla v souladu s podmínkami ustanovení odst. 3.8 Smlouvy. Dále Zhotovitel předložil chybějící akustické, dilatační a těsnící prvky zabudované do monolitické části stavby oproti počtům těchto položek ve výkazu výměr projektu. Projekt provedl Atelier H1 – architektonická kancelář na základě výběrového řízení s kritériem na nejnižší cenu. Objednatel se obrátil na projektanta s požadavkem vysvětlit rozdíl v množství výztuže a ten potvrdil, že počet těchto prvků ve výkazu výměr je nižší, než je ve výkresové části projektové dokumentace. V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se tak jedná o změny, které Objednatel, která jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### I.

#### Předmět Dodatku

- A) Smluvní strany se v souladu s čl. 2. smlouvy dohodly na **změně rozsahu Díla** specifikovaného v čl. 2 odst. 2.1. smlouvy a jejich Příloze č. 2 a č. 3 (oceněné soupisy prací s výkazem výměr), z důvodu změn uvedených v příloze, tj. změnový list č. 7 a 8, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 4 smlouvy a jsou jeho nedílnou součástí.
- B) Smluvní strany se dále dohodly, v souvislosti se změnou rozsahu Díla, na **změně ceny Díla dle Čl. 4, odst. 4.1. smlouvy**

Cena za zhotovení Díla byla stanovena dohodou Smluvních stran na základě podkladů pro provedení Díla, a činí za změnové listy č.7 a 8:

- i. v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:  
vícepráce dle změnového listu č.7 399 290,00 Kč

Cena Díla dle SoD celkem bez DPH:	<b>126.686.868,00 Kč</b>
vlivem Dodatku č. 1 celkem bez DPH:	<b>127.819.877,34 Kč</b>
vlivem Dodatku č. 2 celkem bez DPH:	<b>129.800.755,27 Kč</b>
vlivem Dodatku č. 3 celkem bez DPH:	<b>133.496.352,80 Kč</b>

<b>Cena dle změnového listu č. 7 bez DPH</b>	<b>399.290,00 Kč</b>
----------------------------------------------	----------------------



Cena Díla celkem (po změně provedené tímto Dodatkem č.4) bez DPH: **133.895.642,80 Kč**

Cena Díla je blíže specifikována ve změnovém listu č. 7 a 8, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (Příloha č.1 Dodatku Smlouvy).

C) Smluvní strany se dále dohodly, v souvislosti s naplněním ustanovení Čl. 3, odst. 3.8 Smlouvy, kdy nebylo možné z důvodů nepříznivých klimatických podmínek dodržet technologický postup při provádění zakládání stavby, na prodloužení termínu dokončení v souladu s Čl. 3, odst. 3.8 o 68 dnů. Staveniště bylo Zhotoviteli předáno 18.10.2018. Dle Čl. 3, odst. 3.2 Smlouvy měl Zhotovitel provést dílo do 570 dnů, tj. do 10.05.2020. Vlivem tohoto Dodatku č.4 spolu se Změnovým listem č.8 se termín provedení díla mění na 17.07.2020.

V souvislosti s posunutím termínu provedení díla o 68 dnů se mění i harmonogram výstavby, který posouvá příslušné termíny výstavby a jež tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 4 smlouvy a jsou jeho nedílnou součástí.

V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku význam definovaný ve Smlouvě.
2. Tento Dodatek je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti od data uveřejnění v registru. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Pro uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv se přiměřeně použijí ujednání odst. 30.1. Smlouvy.
4. Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z tohoto Dodatku nebo jakékoli ustanovení tohoto Dodatku (včetně jakéhokoli odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, neúčinným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku či Smlouvy tím zůstane nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná, neúčinná, nevymahatelná či zdánlivá ustanovení ustanoveními platnými, účinnými, vymahatelnými a nikoli zdánlivými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
5. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyř (4) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každý z Účastníků obdrží dvě (2) vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem nedochází k podstatné změně závazků ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento




Dodatek neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že při uzavírání tohoto Dodatku nejedná v postavení slabší strany ve smyslu § 433 občanského zákoníku. Na důkaz toho připojují Smluvní strany vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 1 – Změnové listy č.7 a 8

Příloha č. 2. – Harmonogram výstavby


V Táboře, dne ..... 23 -04- 2019.....



Nemocnice Tábor, a.s.  
Ing. Ivo Houška, MBA,  
předseda představenstva




Nemocnice Tábor, a.s.  
MUDr. Jana Chocholová,  
člen představenstva



V Českých Budějovicích, dne ..... 24 -04- 2019.....



PRADAST, spol. s r.o.  
Ing. Petr Steinbauer  
jednatel společnosti



Stavba:	Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor (staveniště A) - SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ
---------	----------------------------------------------------------------------------


	Datum vydání ZL		
--	-----------------	--	--

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice
Objednatel:	Nemocnice Tábor a.s., kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Projektant:	Atelier H1, K Byřičce 1656/65, 500 08 Hradec Králové
TDS:	Tareka s.r.o., Ing. Pavel Strnad, Palackého 351/6, 390 01 Tábor

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
<b>Cena bez DPH:</b>	<b>399 290,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>399 290,00 Kč</b>

Soupis změnových listů:			
	vícepráce	méněpráce	
7. Těsnící prvky	399 290,00 Kč	0,00 Kč	399 290,00 Kč
8. Klimatické podmínky	bez dopadu do ceny		

<b>Zhotovitel:</b> Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum: 16 -04- 2019 Podpis:
<b>Objednatel:</b> Nemocnice Tábor a.s. kpt.Jaroše 2000 390 03 Tábor	Datum: 17 -04- 2019 Podpis:
<b>Projektant:</b> Atelier H1 K Byřičce 1656/65 500 08 Hradec Králové	Datum: 16 -04- 2019 Podpis:
<b>TDS:</b> Tareka s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Datum: 16 -04- 2019 Podpis:

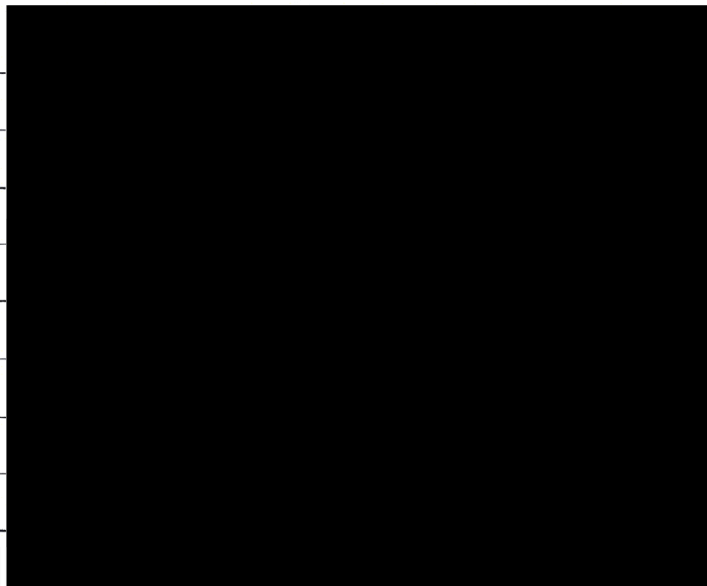



Stavba:	Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor (staveniště A) - ZL č. 7
---------	-------------------------------------------------------------

	Datum vydání ZL
	9.4.2019

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice
Objednatel:	Nemocnice Tábor a.s., kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Projektant:	Ing. arch. Jan Hochman - Atelier H1, K Byřičce 1656/65, 500 08 Hradec Králové
TDI:	Tareka s.r.o., Ing. Pavel Strnad, Palackého 351/6, 390 01 Tábor

Cena bez DPH:	399 290,00 Kč
---------------	---------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	399 290,00 Kč	0,00 Kč	399 290,00 Kč

**Popis změny technického řešení:**

**Těsnící prvky**

Na základě zpracované dílenské dokumentace byly doplněny akustické prvky do monolitické konstrukce výtahu tak, aby výtahová šachta byla oddílatována z důvodu přenosu hluku a vibrací. Původní výkaz výměr obsahoval menší množství prvků, než bylo zakresleno ve výkresové dokumentaci.

	399 290,00 Kč	0,00 Kč	399 290,00 Kč
--	---------------	---------	---------------

Příloha:rozpočet

<b>Zhotovitel:</b> Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:	
	Podpis	
<b>Objednatel:</b> Nemocnice Tábor a.s. kpt.Jaroše 2000 390 03 Tábor	Razítko:	
	Podpis	
<b>Projektant:</b> Ing. arch. Jan Hochman - Atelier H1 K Byřičce 1656/65 500 08 Hradec Králové	Razítko:	
	Podpis	
<b>TDS:</b> Tareka s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:	
	Podpis	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: TS\_18b/2018  
Stavba: NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)

KSO: 802 41 31  
Místo: Tábor

CC-CZ:  
Datum: 9.4.2019

Zadavatel:  
Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor

IČ: 26095203  
DIČ: CZ26095203

Zhotovitel:  
Pradast, spol.s r.o., Nám.Pf.Otakara II., 10/6, Č.B

IČ: 60826053  
DIČ: CZ60826053

Projektant:  
Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřičce, HK

IČ: 11015802  
DIČ:

Zpracovatel:  
Tereza Širhalová, DiS

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo "vlastní položka", nepochází z Cenové soustavy URS a jejich cena je stanovena odborným odhadem.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>399 290,00</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>399 290,00</b>	<b>83 850,90</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>483 140,90</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TS 18b/2018

**Stavba:** NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)

Místo: Tábor

Datum:

09.04.2019

Zadavatel: Nemocnice Tábor,a.s.Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor

Projektant:

Atelier H1  
Ing.arch.J.Hochman, K  
Bíříčce, HK

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o., Nám.Př.Otakara II., 10/6, Č.B

Zpracovatel:

Tereza Širhalová, DiS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>399 290,00</b>	<b>483 140,90</b>
18a	Akustické prvky monolitické konstrukce	399 290,00	483 140,90



# ČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)

Objekt: **akustické prvky monolitické konstrukce**

KSO: 802 41 31  
Místo: Tábor

CC-CZ: 09.04.2019  
Datum:

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor

IČ: 26095203  
DIČ: CZ26095203

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o., Nám.Př.Otakara II., 10/6, Č.B

IČ: 60826053  
DIČ: CZ60826053

Projektant: Atelier H1 Ing.arch.J.Hochman, K Biřčce, HK

IČ: 11015802  
DIČ:

Zpracovatel: Tereza Širhalová, DiS

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **399 290,00**

DPH	základní snížená	Základ daně 399 290,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 83 850,90 0,00
-----	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

---

**Cena s DPH** **483 140,90**

**v CZK**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)		
Objekt:	<b>akustické prvky monolitické konstrukce</b>		
Místo:	Tábor	Datum:	09.04.2019
Zadavatel:	Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor	Projektant:	Atelier H1 Ing. arch. J. Hochman, K Biřičce, HK
Zhotovitel:	Pradast, spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II., 10/6, Č.B	Zpracovatel:	Tereza Širhalová, DiS
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>			<b>399 290,00</b>
IV - Práce a dodávky HSV			399 290,00
ostatní konstrukce a práce, bourání			399 290,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR (staveniště A)

Objekt:

**akustické prvky monolitické konstrukce**

Místo:

Tábor

Datum:

09.04.2019

Zadavatel:

Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000 390 02 Tábor

Projektant:

Atelier H1  
Ing.arch.J.Hochman,  
n, K Biříčce, HK

Zhotovitel:

Pradast, spol.s r.o., Nám.Př.Otakara II., 10/6, Č.B

Zpracovatel:

Tereza Širhalová,  
DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**399 290,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

399 290,00

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

399 290,00

107	dle smlVV	953511511	Nosný tepelně-izolační prvek zlepšující přerušeni tepelných mostů pro atiky (např. typu Isokorb typ A)	kus	31,000	3 180,00	98 580,00	dle smlVV
	vv		"původní SOD" -7			-7,000		
	vv		"skutečnost" 38			38,000		
	vv		"Rozdíl mezi původní SOD a skutečností"			31,000		
108	dle smlVV	953611111	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek zlepšující akustické vlastnosti konstrukce mezi podestou a stěnou (např. typu Tronsole typ AZT)	kus	22,000	6 920,00	152 240,00	dle smlVV
	vv		"původní SOD" -8			-8,000		
	vv		"skutečnost" 30			30,000		
	vv		"Rozdíl mezi původní SOD a skutečností"			22,000		
109	dle smlVV	953611123	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek zlepšující akustické vlastnosti konstrukcí mezi podestou a ramenem (např. typu Tronsole typ T8 )	kus	29,000	4 530,00	131 370,00	dle smlVV
	vv		"původní SOD" -7			-7,000		
	vv		"skutečnost" 36			36,000		
	vv		"Rozdíl mezi původní SOD a skutečností"			29,000		
110	dle smlVV	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek zlepšující akustické vlastnosti konstrukcí dilatační spárové desky mezi schody a stěnou (např. typu Tronsole typ PL)	kus	36,000	475,00	17 100,00	dle smlVV
	vv		"původní SOD" -8			-8,000		
	vv		"skutečnost" 44			44,000		
	vv		"Rozdíl mezi původní SOD a skutečností"			36,000		

Stavba:	Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor (staveniště A) - ZL č. 8
---------	-------------------------------------------------------------

--	--

Datum vydání ZL	9.4.2019
-----------------	----------

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice
-------------	---------------------------------------------------------------

Objednatel:	Nemocnice Tábor a.s., kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor
-------------	-----------------------------------------------------

Projektant:	Ing. arch. Jan Hochman - Atelier H1, K Byřičce 1656/65, 500 08 Hradec Králové
-------------	-------------------------------------------------------------------------------

TDI:	Tareka s.r.o., Ing. Pavel Strnad, Palackého 351/6, 390 01 Tábor
------	-----------------------------------------------------------------

--	--

Cena bez DPH:			
---------------	--	--	--

	vícepráce	méněpráce	rozdíl


**Popis změny technického řešení:**

**Klimatické podmínky**

Klimatické podmínky neumožňovaly dodržet technologické postupy při zhotovování těch částí díla, které jsou tvořeny především mokřými procesy, a tudíž bylo nutno pozastavit stavbu dle čl. 3.8 smlouvy o dílo do doby než budou klimatické podmínky umožňovat opětovné provádění prací. Součástí změnového listu je výpis Českého hydrometeorologického ústavu ze stanice v Táboře za období od 1.11.2018 do 31.3.2019. Jsou zde označeny dny, u kterých byla minimální teplota pod 5 st.C tak, jak je tato podmínka definována ve SoD, Čl.3, odst. 3.8. Počet dnů naplňujících tuto podmínku bylo v tomto časovém rozpětí 137, vynásobeno v souladu se SoD koeficientem 0,5 je prodloužení termínu předání díla o 68,5 dne, zaokrouhleno po dohodě obou smluvních stran na 68. Tento změnový list je bez dopadu do ceny.

Příloha: výčet dnů s nepříznivými klimatickými podmínkami

<b>Zhotovitel:</b> Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:  Podpis
<b>Objednatel:</b> Nemocnice Tábor a.s. kpt.Jaroše 2000 390 03 Tábor	Razítko:  Podpis
<b>Projektant:</b> Ing. arch. Jan Hochman - Atelier H1 K Byřičce 1656/65 500 08 Hradec Králové	Razítko:  Podpis
<b>TDS:</b> Tareka s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:  Podpis

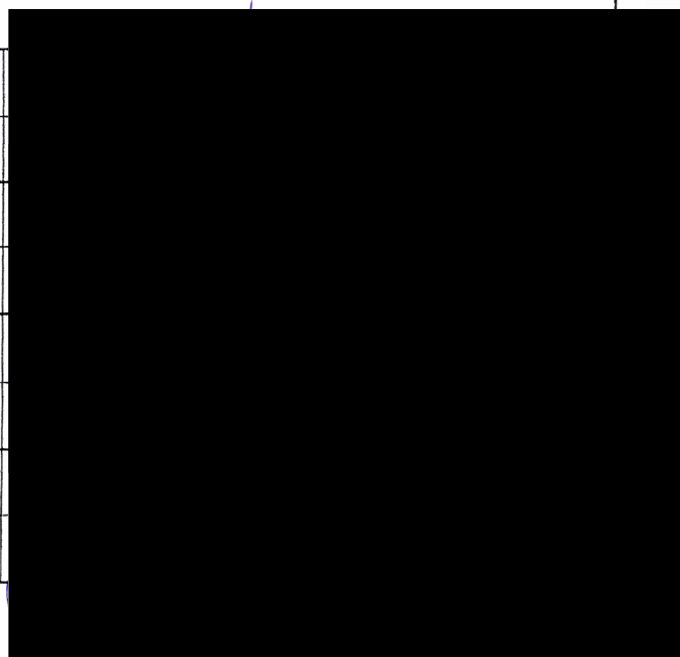

## Počty dnů kdy klimatické podmínky nedovolovali provádění prací

	dny s teplotou pod 5 oC	dle smluvních podmínek krácení o 50%
listopad 2018	19	9,5
prosinec 2018	30	15
leden 2019	31	15,5
1.-15.2.2019	15	7,5
16.2.-28.2.2019	13	6,5
1.-31.3.2019	29	14,5
<b>celkem</b>	<b>137</b>	<b>68,5</b>



Tab.: Výpis teploty minimální [°C] v intervalu od 6:30 do 17:00 SEČ, meteorologická stanice ČHMÚ v Táboře, 1. 11. 2018 – 30. 11. 2018


Tábor	
datum/prvek	teplota minimální [°C] v intervalu od 6:30 do 17:00 SEČ
1. 11. 2018	3,0
2. 11. 2018	2,3
3. 11. 2018	7,6
4. 11. 2018	9,4
5. 11. 2018	8,9
6. 11. 2018	7,5
7. 11. 2018	6,0
8. 11. 2018	8,3
9. 11. 2018	7,8
10. 11. 2018	7,3
11. 11. 2018	7,4
12. 11. 2018	6,9
13. 11. 2018	6,9
14. 11. 2018	-0,8
15. 11. 2018	-1,5
16. 11. 2018	-1,7
17. 11. 2018	-2,1
18. 11. 2018	-5,0
19. 11. 2018	-2,4
20. 11. 2018	-0,1
21. 11. 2018	1,2
22. 11. 2018	1,7
23. 11. 2018	1,6
24. 11. 2018	3,7
25. 11. 2018	0,2
26. 11. 2018	1,9
27. 11. 2018	-2,0
28. 11. 2018	-7,2
29. 11. 2018	-7,6
30. 11. 2018	-3,3





Tab.: Výpis teploty minimální [°C] v intervalu od 6:30 do 17:00 SEČ, meteorologická stanice ČHMÚ v Táboře, 1. 12. 2018 – 31. 12. 2018

Meteorologická stanice ČHMÚ v Táboře	
datum/prvek	teplota minimální [°C] v intervalu od 6:30 do 17:00 SEČ
1. 12. 2018	-4,0
2. 12. 2018	-3,9
3. 12. 2018	3,8
4. 12. 2018	3,3
5. 12. 2018	-3,4
6. 12. 2018	-0,5
7. 12. 2018	3,5
8. 12. 2018	4,1
9. 12. 2018	5,0
10. 12. 2018	0,3
11. 12. 2018	0,1
12. 12. 2018	-2,8
13. 12. 2018	-3,4
14. 12. 2018	-3,3
15. 12. 2018	-3,6
16. 12. 2018	-4,6
17. 12. 2018	-2,2
18. 12. 2018	-1,2
19. 12. 2018	-1,1
20. 12. 2018	-2,6
21. 12. 2018	1,1
22. 12. 2018	7,6
23. 12. 2018	3,9
24. 12. 2018	0,7
25. 12. 2018	0,1
26. 12. 2018	0,5
27. 12. 2018	2,1
28. 12. 2018	0,4
29. 12. 2018	1,3
30. 12. 2018	0,9
31. 12. 2018	1,7





Tab.: Výpis teploty minimální [°C] v intervalu od 6:30 do 17:00 SEČ, meteorologická stanice ČHMÚ v Táboře, 1. 1. 2019 – 31. 1. 2019

Tábor	
datum/prvek	teplota minimální [°C] v intervalu od 6:30 do 17:00 SEČ
1. 1. 2019	4,5
2. 1. 2019	-1,8
3. 1. 2019	-5,1
4. 1. 2019	-6,4
5. 1. 2019	0,4
6. 1. 2019	-1,1
7. 1. 2019	-1,8
8. 1. 2019	0,0
9. 1. 2019	-1,0
10. 1. 2019	-2,6
11. 1. 2019	-9,2
12. 1. 2019	0,3
13. 1. 2019	1,2
14. 1. 2019	-1,2
15. 1. 2019	-0,7
16. 1. 2019	2,3
17. 1. 2019	-0,8
18. 1. 2019	-1,6
19. 1. 2019	-9,5
20. 1. 2019	-2,8
21. 1. 2019	-8,2
22. 1. 2019	-8,9
23. 1. 2019	-9,2
24. 1. 2019	-5,0
25. 1. 2019	-4,6
26. 1. 2019	-4,6
27. 1. 2019	0,7
28. 1. 2019	0,6
29. 1. 2019	-0,6
30. 1. 2019	-3,9
31. 1. 2019	-6,2



VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

PRADAST, spol. s.r.o.

NAŠE ZNAČKA: CHMI/521/85/2019

Náměstí Přemysla Otakara II 10/6

VYŘIZUJE: Mgr. Eva Kalná

DATUM: 18. 2. 2019

TELEFON: [REDAKCE]

370 01

ČESKÉ BUDĚJOVICE

E-MAIL: [REDAKCE]

**Výpis teplot minimálních pro lokalitu Tábor (Kpt. Jaroše 2000, Nemocnice Tábor, a.s.)  
v intervalu od 6:30 do 17:00 v období od 1. 2. 2019 do 15. 2. 2019**

Na základě Vaší objednávky zasíláme v příložené tabulce výpis denních minimálních teplot v intervalu od 6:30 do 17:00 SEČ (středoevropský čas) v období od 1. 2. 2019 do 15. 2. 2019 pro lokalitu Tábor (Kpt. Jaroše 2000, Nemocnice Tábor) dle měření meteorologické stanice ČHMÚ v Táboře.

**Tab.: Výpis teploty minimální [°C] v intervalu od 6:30 do 17:00 SEČ, meteorologická stanice ČHMÚ v Táboře, 1. 2. 2019 – 15. 2. 2019**

Tábor	
datum/prvek	teplota minimální [°C] v intervalu od 6:30 do 17:00 SEČ
1. 2. 2019	-3,0
2. 2. 2019	0,3
3. 2. 2019	-0,6
4. 2. 2019	-2,3
5. 2. 2019	-10,3
6. 2. 2019	-3,5
7. 2. 2019	-7,7
8. 2. 2019	0,3
9. 2. 2019	-0,3
10. 2. 2019	1,0
11. 2. 2019	1,2
12. 2. 2019	-0,5
13. 2. 2019	0,6
14. 2. 2019	0,5
15. 2. 2019	-4,3

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění, dle příložené faktury částku 500 Kč.

S pozdravem

[REDAKCE]  
Ing. Pavel Polcar  
ředitel pobočky

Antala Staška 1177/32, 370 07, České Budějovice 7  
tel.: [REDAKCE]

IČ: 00020699, DIČ: CZ00020699  
č. ú.: [REDAKCE], www.chmi.cz



VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

PRADAST, spol. s.r.o.

NAŠE ZNAČKA: CHMI/521/127/2019

Náměstí Přemysla Otakara II 10/6

VYŘIZUJE: Mgr. Eva Kalná

DATUM: 20. 3. 2019

TELEFON: [REDACTED]

370 01

ČESKÉ BUDĚJOVICE

E-MAIL: [REDACTED]

**Výpis teplot minimálních pro lokalitu Tábor (Kpt. Jaroše 2000, Nemocnice Tábor, a.s.)  
v intervalu od 6:30 do 17:00 v období od 16. 2. 2019 do 28. 2. 2019**

Na základě Vaší objednávky zasíláme v příložené tabulce výpis denních minimálních teplot v intervalu od 6:30 do 17:00 SEČ (středoevropský čas) v období od 16. 2. 2019 do 28. 2. 2019 pro lokalitu Tábor (Kpt. Jaroše 2000, Nemocnice Tábor) dle měření meteorologické stanice ČHMÚ v Táboře.

**Tab.: Výpis teploty minimální [°C] v intervalu od 6:30 do 17:00 SEČ, meteorologická stanice ČHMÚ v Táboře, 16. 2. 2019 – 28. 2. 2019**

Tábor	
datum/prvek	teplota minimální [°C] v intervalu od 6:30 do 17:00 SEČ
16. 2. 2019	-4,3
17. 2. 2019	-4,4
18. 2. 2019	-4,1
19. 2. 2019	-3,2
20. 2. 2019	-2,2
21. 2. 2019	-1,8
22. 2. 2019	0,8
23. 2. 2019	-7,1
24. 2. 2019	-6,4
25. 2. 2019	-2,7
26. 2. 2019	-1,0
27. 2. 2019	-1,8
28. 2. 2019	-2,5

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění, dle příložené faktury částku 500 Kč.

S pozdravem

[REDACTED]  
Ing. Pavel Polcar  
ředitel pobočky

Meteorologická stanice ČHMÚ v Táboře	
datum/prvek	teplota minimální [°C] v intervalu od 6:30 do 17:00 SEČ
01.03.2019	5,9
02.03.2019	2,0
03.03.2019	4,6
04.03.2019	3,7
05.03.2019	3,3
06.03.2019	-1,6
07.03.2019	1,8
08.03.2019	4,2
09.03.2019	1,4
10.03.2019	4,2
11.03.2019	-0,2
12.03.2019	1,0
13.03.2019	2,0
14.03.2019	3,3
15.03.2019	2,9
16.03.2019	3,9
17.03.2019	0,7
18.03.2019	2,8
19.03.2019	-3,2
20.03.2019	-1,2
21.03.2019	-3,9
22.03.2019	-1,2
23.03.2019	0,8
24.03.2019	5,6
25.03.2019	3,5
26.03.2019	1,4
27.03.2019	1,5
28.03.2019	4,1
29.03.2019	2,6
30.03.2019	-1,5
31.03.2019	0,3



