

DODATEK č. 2

k SOD na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 4,007
trati odb. Rožnov - Černý Kříž“**



Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2448 ze dne 02. 05. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-6455/2017/Pal**

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 500 354 0010

a

„Společnost SMP – EDIKT, Rožnov – Černý Kříž“

A. SPRÁVCE / SPOLEČNÍK 1:

SMP CZ, a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

IČO: 27195147, DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9654

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.
Ing. Jindřich Tautrman, člen představenstva SMP CZ, a.s.

A. SPOLEČNÍK 2:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. B 904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 01 (dále také jen jako „ZL“) a **dále úprava termínu dokončení stavebních prací a dokončení díla** v souvislosti se schvalováním ZL. Č. 01. Vzhledem k tomu, že stavba nákladově překročila CIN, je nutné přeschválení nákladů v CK MD.

U ZL č. 01 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce na SO 02 Železniční spodek v celkové výši 1 303 371,00 Kč, jedná se o navýšení ceny o 6,09 % původní hodnoty závazku:

U těchto uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

V souvislosti s výše uvedenými úpravami Díla se upravuje článek 3, odst. 3.3 a 3.6. Smlouvy a dále článek 5, odst. 5.12. Smlouvy, resp. příloha č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla a příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Rekapitulace Ceny Díla a harmonogram nahrazují Rekapitulaci Ceny Díla a harmonogram postupu prací, přiložené k SOD.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-6455/2017/Pal ze dne 24. 01. 2018, ve znění dodatku č. 1, takto:

1. Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 a 3.6. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: 21 416 216,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2 +1 303 371,00 Kč

Cena díla celkem vč. dodatku č. 2 22 719 587,00 Kč

slovy: **dvacet dva milionů sedm set devatenáct tisíc pět set osmdesát sedm korun českých**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla nejpozději však do 31. 10. 2019 ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací **nejpozději do 30. 08. 2019** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/14/17
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – /VTP/R/07/16
c) Zvláštní technické podmínky – ZTP/R/11/17
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: Objednatele: E618-S-6455/2017/Pal ze dne 24. 01. 2018, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla
Příloha č. 2 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 15.05.2019

V Praze dne 14.05.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

„Společnost SMP – EDIKT, Rožnov – Černý Kříž“

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Jan Jech
Místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

Ing. Jindřich Tautman
Člen představenstva
SMP CZ, a.s.

Ing. Jan Velikovský
člen představenstva EDIKT a.s.


Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce mostu v km 4,007 trati odb. Rožnov - Černý Kříž				
Objekt:		Rekapitulace nákladů stavby			Datum zpracování: 04.12.2017	
P.č.	Číslo položky	Název položky	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	
1	2	3	4	5	6	
1	VŠEOB	Všeobecný objekt	████████	████████	████████	
		Stavební část				
2	SO 01	Rekonstrukce mostu	████████	████████	████████	
3	SO 02	Železniční spodek	████████	████████	████████	
4	SO 03	Železniční svršek	████████	████████	████████	
5	SO 04	Ochrana kabelů SŽDC, SSZT	████████	████████	████████	
6	SO 05	Ochrana kabelů SŽDC, TÚDC	████████	████████	████████	
		Náklady stavby celkem	22 719 587,00	4 771 113,27	27 490 700,27	

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	rok 2, 2018					Půlrok 1, 2019					Půlrok		
							S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S
1		 Rekonstrukce mostu v km 4,007 trati odb. Rožnov - Černý Kříž 	341 dny	24.09. 18	30.08. 19														
2		ROV 93 134	61 dny	24.09. 18	23.11. 18														
3		ROV 93 134 - prodloužení	4 dny	24.11. 18	27.11. 18														
4		SO 01 - rekonstrukce mostu	338 dny	27.09. 18	30.08. 19														
5		osazení DIO	1 den	27.09. 18	27.09. 18														
6		vytýčení a ochrana inženýrských sítí pod mostem	1 den	27.09. 18	27.09. 18	5SS													
7		příprava staveniště	3 dny	28.09. 18	30.09. 18	6													
8		výkopové práce pod mostem	3 dny	28.09. 18	30.09. 18	7FF													
9		zřízení pažení	2 dny	29.09. 18	30.09. 18	8FF													
10		bourací práce	4 dny	28.09. 18	01.10. 18	2SS+4 dny													
11		výkopové práce	7 dny	02.10. 18	08.10. 18	10													
12		provedení spodní stavby včetně podkladu	25 dny	09.10. 18	02.11. 18	11													
13		zřízení podpěrné skruže	3 dny	03.11. 18	05.11. 18	12													
14		osazení nosníků včetně pomocných konstrukcí	1 den	06.11. 18	06.11. 18	13													
15		provedení nosné kce	5 dny	07.11. 18	11.11. 18	14													
16		provedení křídel	2 dny	12.11. 18	13.11. 18	15													
17		provedení izolací NK včetně ochrany	2 dny	12.11. 18	13.11. 18	15													
18		provedení odvodnění	1 den	14.11. 18	14.11. 18	16													
19		zásyp přechodových oblastí	4 dny	14.11. 18	17.11. 18	17													
20		pokládka antivibračních rohoží a geotextilie	1 den	18.11. 18	18.11. 18	19													
21		zřízení žel. Spodku na mostě	1 den	19.11. 18	19.11. 18	20													
22		provedení římsy	4 dny	19.11. 18	22.11. 18	21SS													
23		osazení zábradlí	1 den	23.11. 18	23.11. 18	22													
24		zásyp před opěrami	7 dny	12.11. 18	18.11. 18	15													
25		zřízení provizorních povrchů vozovky	2 dny	26.11. 18	27.11. 18	24FS+7 dny													
26		zřízení konstrukčních vrstev vozovky	35 dny	01.04. 19	05.05. 19														
27		zřízení obrub	21 dny	06.05. 19	26.05. 19	26													
28		provedení zárubní zdi	21 dny	27.05. 19	16.06. 19	27													
29		provedení živých vrstev	21 dny	17.06. 19	07.07. 19	28													
30		pokládka zámkové dlažby	21 dny	08.07. 19	28.07. 19	29													
31		kamenný obklad opěr	21 dny	29.07. 19	18.08. 19	30													
32		osazení SDZ, VDZ	12 dny	19.08. 19	30.08. 19	31													
33																			
34		SO 02 - železniční spodek	27 dny	29.10. 18	24.11. 18														
35		bourací práce - část kce beton. Dílců	5 dny	29.10. 18	02.11. 18														
36		uložení prefa dílců včetně podkladu	6 dny	30.10. 18	04.11. 18														
37		provedení odvodnění - žlaby	6 dny	30.10. 18	04.11. 18														
38		pokládka drenáží	6 dny	30.10. 18	04.11. 18														
39		ztěžení původní konstrukce včetně odvozu na skládku nebo deponie	3 dny	07.11. 18	09.11. 18														
40		zřízení konstrukční vrstvy včetně geotextilie - mimo most	8 dny	10.11. 18	17.11. 18														
41		zřízení konstrukční vrstvy včetně geotextilie - na mostě	3 dny	22.11. 18	24.11. 18														
42																			
43		SO 03 - železniční svršek	234 dny	24.09. 18	15.05. 19														
44		demontáž koleje včetně pražců - na mostě	1 den	24.09. 18	24.09. 18	2SS													
45		demontáž výstroje trati	1 den	25.09. 18	25.09. 18														
46		demontáž koleje včetně pražců - mimo most	1 den	05.11. 18	05.11. 18														
47		odstranění kolejového lože	2 dny	06.11. 18	07.11. 18														
48		zřízení kolejového lože - mimo most - nahrubo	3 dny	18.11. 18	20.11. 18														
49		zřízení kolejového lože - mimo most - načisto	2 dny	21.11. 18	22.11. 18														
50		zřízení koleje - mimo most	2 dny	22.11. 18	23.11. 18														
51		zřízení kolejového lože - na mostě	1 den	24.11. 18	24.11. 18														
52		zřízení koleje - na mostě	1 den	25.11. 18	25.11. 18														
53		výškové a směrové vyrovnání	2 dny	25.11. 18	26.11. 18														
54		svar kolejnic	3 dny	13.05. 19	15.05. 19														
55		vystrojení trati	1 den	27.11. 18	27.11. 18	2FF													
56																			
57		SO 04, 05	61 dny	24.09. 18	23.11. 18														
58		vytýčení sítí	1 den	24.09. 18	24.09. 18	2SS													
59		odkop v místě sítí	3 dny	25.09. 18	27.09. 18	58													
60		odstanění stávajícího žlabu	2 dny	28.09. 18	29.09. 18	59													
61		osazení do provizorního stavu	2 dny	28.09. 18	29.09. 18	60SS													
62		pokládka sítí do kabelových žlabů pro definitivní uložení	5 dny	19.11. 18	23.11. 18	2FF													

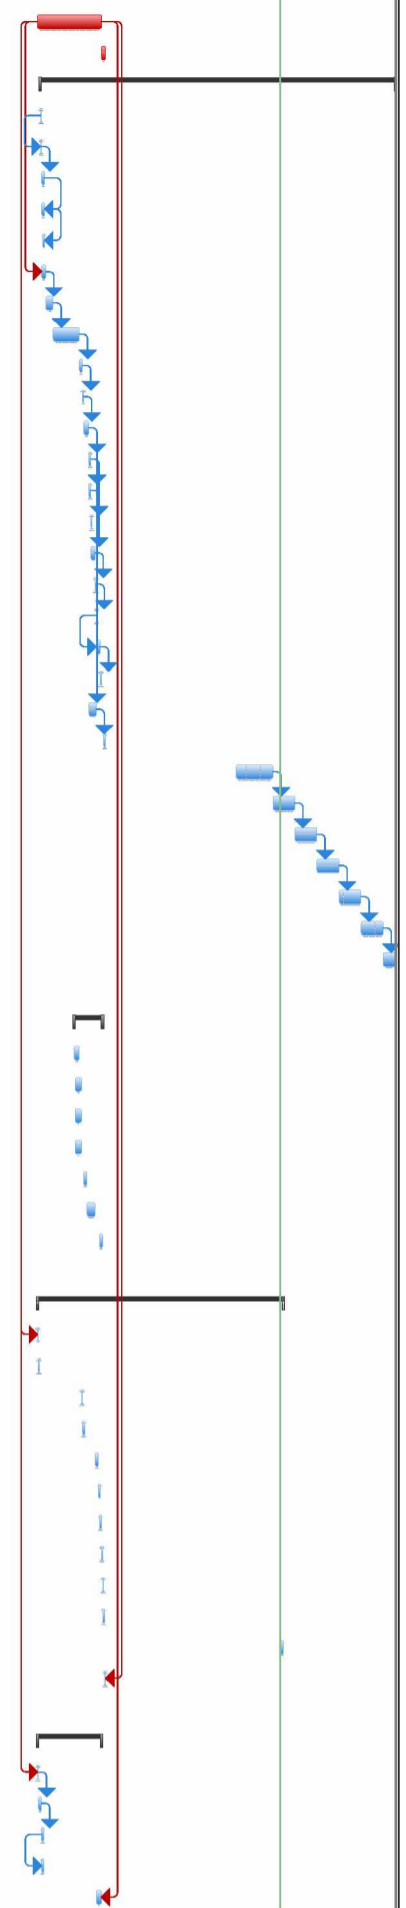

Projekt: HMG - Boršov Datum: 13.05. 19	Úkol		Neaktivní úkol		Pouze zahájení	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení	
	Milník		Neaktivní souhrn		Konečný termín	
	Souhrnný		Ruční úkol		Průběh	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Vnější úkoly		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu			
Vnější milník		Ruční souhrn				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 292359

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d6b7f39d-38d2-427b-b069-2a9b7ee4c75a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.05.2019 13:22:02



2f4280e5-f049-4351-b0ee-f18a83905d86
