



DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 4
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Obnova fasád budovy gymnázia v Kolíně“

| | |
|---|--|
| číslo dodatku smlouvy v evidenci objednatele: | |
| číslo dodatku smlouvy v evidenci zhotovitele: | |

I.
Smluvní strany



Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

| | |
|--------------------------|---|
| se sídlem: | Město Kolín |
| zastoupen: | Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I |
| IČO: | Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města |
| DIČ: | 00235440 |
| Bankovní spojení: | CZ00235440 |
| Číslo účtu: | Česká spořitelna, a.s. Kolín |
| | 3661832/0800 |

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta města
Zástupce objednatele ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel:

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| se sídlem: | Jensovsky, s.r.o. |
| zastoupen: | Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3 |
| IČO: | [REDACTED] |
| DIČ: | 04124863 |
| Bankovní spojení: | CZ04124863 |
| Číslo účtu: | Komerční banka, a.s. |
| | 115-404240297/0100 |

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242893

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [REDACTED]

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek smlouvy o dílo č. 4 na realizaci veřejné zakázky názvem: „Obnova fasád budovy gymnázia v Kolíně“ (dále: „dodatek smlouvy“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 5. 6. 2018 uzavřely smlouvu o dílo číslo smlouvy v evidenci objednatele 00679/2018, číslo smlouvy v evidenci zhotovitele 2018/006 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Obnova fasád budovy gymnázia v Kolíně**“.

2. Dále smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu realizace díla uvedené veřejné zakázky byly provedeny dodatečné práce, vícepráce, či změny stavebních prací, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele, jenž tvořil přílohu č. 1 smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Tento dodatek smlouvy řeší tyto stavební práce:

2.1 Změny prováděných prací nebo vícepráce uvedené ve zdůvodnění změny zhotovitelem stavby, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a výkazu výměr jako součást zadávací dokumentace zadávacího řízení, které předcházelo uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. Jejich potřebu nebylo možno předpokládat ve fázi projektování, neboť se jedná se o práce, které nebylo možno přesně posoudit nebo odměřit bez postaveného lešení. Především se pak jedná o prvky, které z úrovně terénu nebyly viditelné.

2.2 Další práce, které nebyly součástí zadání projektových prací. Jedná se o návrh obnovy původní dochované fasády s cílem zachránit maximální množství původních hodnotných prvků, ploch a stavebních detailů.

3. Z důvodů výše uvedených smluvní strany souhlasí se změnami předmětu díla majícími vliv na cenu díla. Popis, specifikaci a zdůvodnění těchto změn včetně zdůvodnění navýšení ceny díla obsahuje změnový list s položkovým rozpočtem, jenž je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Změnový list obsahuje tyto změny ceny díla:

Přípočty celkem: 1.704.074,92 Kč bez DPH

Odpočty celkem: 462.922,50 Kč bez DPH

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po snížení o hodnotu odpočtů 1.241.152,43 Kč bez DPH

4. Celková změna ceny díla je tato:

4.1 Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo:

Cena díla bez DPH: 9 471 938,62 Kč

Celkem DPH: 1 989 107,11 Kč

Cena díla včetně DPH: 11 461 045,73 Kč

4.2 Cena díla dle dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH: 10 814 376,83 Kč

Celkem DPH: 2 271 019,13 Kč

Cena díla včetně DPH: 13 085 395,96 Kč

4.3 Cena díla dle dodatku č. 4:

Cena díla bez DPH: 12.055.529,25 Kč

Celkem DPH: 2.531.661,14

Cena díla včetně DPH: 14 587 190,39 Kč

III.

Změna smlouvy o dílo

1 Smluvní strany souhlasí se změnou ceny díla dle článku 3. Cena za dílo; odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky účastníka ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Cena díla bez DPH: | 12.055.529,25 Kč |
| Celkem DPH: | 2.531.661,14 |
| Cena díla včetně DPH: | 14 587 190,39 Kč |

IV.

Ostatní ujednání

1 Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek smlouvy zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.

2 Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření, předmětu a výše plnění dodatku smlouvy. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek smlouvy může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

V.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5. 6. 2018 beze změn.
2. Tento dodatek č. 4 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je tato příloha:


Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 s položkovým rozpočtem

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek smlouvy č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 20. 5. 2019, usnesení č. 898/23/RM/2019.

V Praze dne 3.6.2019

Zhotovitel: Jensovsky, s.r.o.

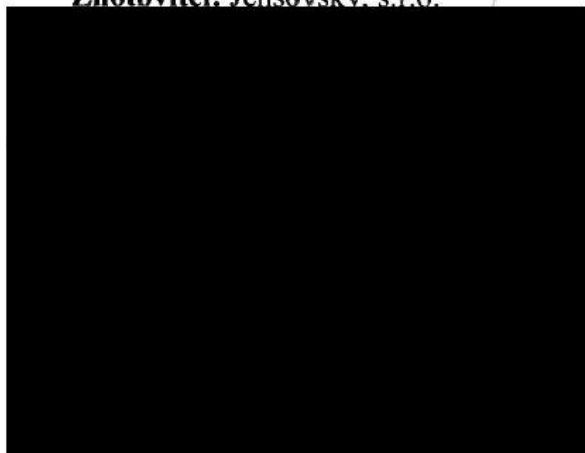

V Kolíně dne 21.5.2019

Objednatel: Město Kolín



Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

| | |
|--|---|
| Identifikace stavby: Město Kolín Obnova fasád budovy gymnázia v Kolíně | Číslo změny: 2 |
| Registrační číslo: | Datum: 10.4.2019 |
| Návrh ocenění změny navazuje: na požadavky zhotovitele, uživatele, investora zapsaných v rámci kontrolních dnů | |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> |
| | dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/> |

Soupis odsouhlasených přípočtů:

Je uveden v rekapitulaci víceprací, která je nedílnou přílohou tohoto návrhu změny č. 1.

Jedná se především o následující vícepráce:

- 01 - pol. 14 - Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou,
- 02 - pol. 26 - Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122,
- 03 - pol. 39 - 42 - Přesun sutě,
- 04 - pol. 45 - Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do sutí,
- 05 - pol. 60 - Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 130 mm,
- 06 - pol. 61 - Kruhový litinový svod průměru 130 mm,
- 07 - pol. 63 - Kruhový litinový svod průměru 130 mm,
- 08 - pol. 65 - Kruhový litinový svod průměru 80 mm,
- 09 - pol. 66 - Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm,
- 10 - pol. 67 - Kruhový litinový svod průměru 120 mm,
- 11 - pol. VRN4 - Vybavení staveniště,
- 12 - pol. VRN5 - Připojení staveniště na inženýrské sítě,
- 13 - pol. VRN9 - Vliv klimatických podmínek,
- 14 - pol. Y3 - Patinace rozdílných barevností omítkových vrstev původních a doplňků,
- 15 - pol. Y4 - Barvy pro nátěr věže (překrytý nevhodný nátěr), včetně dopravy,
- 16 - pol. Y6 - Dabetonování parapetů u oken v suterénu,
- 17 - pol. X1 - Kordonová římsa, n. v. = 227,511 m n.m., oplechování parapetu nebo římsy, Cu 0,6 mm, r.š. = 620 mm,
- 18 - pol. X2 - Nástřešní žlab - jiný rozměr, nástřešní žlab, oblý, včetně háků s podporou, rohů, čel a hrdel, r.š. = 670 mm,
- 19 - pol. X3 - Korunová římsa n. v. = 231,293 m n.m., oprava dřevěného záklopu římsy r. š. 420 mm, kotvení do zdiva a výměna ztrouchnivělých prken v rozsahu cca do 50%, broušení vystouplých hrbů, podložení Pz plechem, včetně Cu,
- 20 - pol. X20 - Žlab podokapní hranatý z Cu plechu rš 500 mm, včetně háků,
- 21 - pol. X21 - Atypické přechodové kotlíky žlab / svod,
- 22 - pol. X22 - Oplechování atiky balkonu u spojovací chodby (ředitelna x hlavní budova), r.š. = 700 mm,
- 23 - pol. X4 - Prostupy svodů,
- 24 - pol. X23 - Nastavení svodu měděného k lapači splavenin v KG trubce, různé průměry, včetně kolen,
- 25 - pol. X24 - Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový 130 mm,
- 26 - pol. Y7 - Y15 a Y41 - Rekonstrukce podlah na terasách,
- 27 - pol. Y16 - Y40 - Rekonstrukce ploché střechy nad chodbou u tělocvičny,
- 28 - pol. W5 a W6 - Přístřešek nad vedlejší vstup,
- 29 - pol. Z13 - Z15 - Výplně otvorů (montáž, začistění, doprava).

Přípočty celkem: 1.704.074,92 Kč bez DPH

Soupis odsouhlasených odpočtů:

Jedná se o následující položky, které nebudou předmětem plnění:

- 01 - pol. 04 - Vypadlé kameny doplnit identickým kamenem,
- 02 - pol. 08 - Doplňky ztracených či oklepaných omítek,
- 03 - pol. 31 a 33 - Montáž/Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,
- 04 - pol. 37 - Odtučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva,
- 05 - pol. 44, 46 a 47 - Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů, žlabu podokapního a svodu do sutí,
- 06 - pol. 53, 55, 56 a 57 - Žlaby - různé r.š.,
- 07 - pol. X19 - Oplechování parapetů.

Odpočty celkem: 462.922,50 Kč bez DPH

Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po snížení o hodnotu odpočtů **1.241.152,43 Kč bez DPH**
viz příloha: položkový rozpočet

Počet listů příloh: Položkový rozpočet - Bilance víceprací přípočtů a odpočtů (11 listů) ; 6 listů zdůvodnění - celkem 17 listů příloh

Navrhovaná změna ceny díla:

| | |
|----------------|---------------------------|
| zvýšení ceny o | + 1.704.074,92 Kč bez DPH |
| snížení ceny o | - 462.922,50 Kč bez DPH |

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

| | |
|---------------------|--|
| prodloužení lhůty o | |
| zkrácení lhůty o | |

| | |
|-----------------|-------------|
| Za zhotovitele: | |
| Za objednatele: | Město Kolín |

ODSOUHLESENÍ ZMĚNY

| | | | |
|---|---|---|--|
| Identifikace stavby: Město Kolín Obnova fasád budovy gymnázia v Kolíně | | Číslo změny: 2 | |
| Registrační číslo: | | Datum: 10.4.2019 | |
| Určeno pro | projektanta <input checked="" type="checkbox"/> | TDI <input checked="" type="checkbox"/> | zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odesláno/předáno: | poštou <input type="checkbox"/> | poslem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Soupis odsouhlasených přípočtů:

Je uveden v rekapitulaci víceprací, která je nedílnou přílohou tohoto návrhu změny č. 1.

Jedná se především o následující vícepráce:

- 01 - pol. 14 - Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou,
- 02 - pol. 26 - Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² Připlatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1122,
- 03 - pol. 39 - 42 - Přesun sutě,
- 04 - pol. 45 - Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do sutí,
- 05 - pol. 60 - Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 130 mm,
- 06 - pol. 61 - Kruhový litinový svod průměru 130 mm,
- 07 - pol. 63 - Kruhový litinový svod průměru 130 mm,
- 08 - pol. 65 - Kruhový litinový svod průměru 80 mm,
- 09 - pol. 66 - Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm,
- 10 - pol. 67 - Kruhový litinový svod průměru 120 mm,
- 11 - pol. VRN4 - Vybavení staveniště,
- 12 - pol. VRN5 - Připojení staveniště na inženýrské síť,
- 13 - pol. VRN9 - Vliv klimatických podmínek,
- 14 - pol. Y3 - Patinace rozdílných barevností omítkových vrstev původních a doplňků,
- 15 - pol. Y4 - Barvy pro nátěr věže (překrytí nevhodný nátěr), včetně dopravy,
- 16 - pol. Y6 - Dobetonování parapetů u oken v suterénu,
- 17 - pol. X1 - Kordonová římsa, n. v. = 227,511 m n.m., oplechování parapetu nebo římsy, Cu 0,6 mm, r.š. = 620 mm,
- 18 - pol. X2 - Nástěšní žlab - jiný rozměr, nástěšní žlab, obly, včetně háků s podporou, rohů, čel a hrdel, r.š. = 670 mm,
- 19 - pol. X3 - Korunová římsa n. v. = 231,293 m n.m., oprava dřevěného záklapu římsy r. š. 420 mm, kotvení do zdiva a výměna ztrouchnivělých prken v rozsahu cca do 50%, broušení vystouplých hrbů, podložení Pz plechem, včetně Cu,
- 20 - pol. X20 - Žlab podokapní hranatý z Cu plechu rš 500 mm, včetně háků,
- 21 - pol. X21 - Atypické přechodové kotlíky žlab / svod,
- 22 - pol. X22 - Oplechování atiky balkonu u spojovací chodby (ředitelna x hlavní budova), r.š. = 700 mm,
- 23 - pol. X4 - Prostupy svodů,
- 24 - pol. X23 - Nastavení svodu měděného k lapači splavenin v KG trubce, různé průměry, včetně kolen,
- 25 - pol. X24 - Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový 130 mm,
- 26 - pol. Y7 - Y15 a Y41 - Rekonstrukce podlah na terasách,
- 27 - pol. Y16 - Y40 - Rekonstrukce ploché střechy nad chodbou u tělocvičny,
- 28 - pol. W5 a W6 - Přístřešek nad vedlejší vstup,
- 29 - pol. Z13 - Z15 - Výplně otvorů (montáž, začistění, doprava).

Přípočty celkem: 1.704.074,92 Kč bez DPH

Soupis odsouhlasených odpočtů:


Jedná se o následující položky, které nebudou předmětem plnění:

- 01 - pol. 04 - Vypadlé kameny doplnit identickým kamenem,
- 02 - pol. 08 - Doplňky ztracených či oklepaných omítek,
- 03 - pol. 31 a 33 - Montáž/Demontáž zachytne stříšky zřízované současně s lehkým nebo těžkým lešením,
- 04 - pol.37 - Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva,
- 05 - pol. 44, 46 a 47 - Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů, žlabu podokapního a svodu do sutí,
- 06 - pol. 53, 55, 56 a 57 - Žlaby - různé r.š.,
- 07 - pol. X19 - Oplechování parapetů.

Odpočty celkem: 462.922,50 Kč bez DPH

Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po snížení o hodnotu odpočtů 1.241.152,43 Kč bez DPH

| | | | |
|--|------------------------------|---|--------------------|
| Počet připojených listů: 21 | | Počet připojených výkresů: složka s vyznačením změn | |
| Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 10.814.376,83 Kč bez DPH | | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: | |
| zvýšení ceny o | 1.241.152,43 Kč bez DPH | prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| snížení ceny o | 0,00 Kč bez DPH | zkrácení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| celková cena po změně | 12.055.529,25 Kč bez DPH | celková lhůta po změně | Datum dokončení: |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | chybou v dokumentaci zakázky | <input type="checkbox"/> | |
| | zjištěnou skutečností | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Veškeré práce budou spíňovat podmínky Smlouvy o materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo př | | o jakosti o. | |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: | | razítko: | |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: | | | |

ZA TDI: 

| 38 | K | 985311117 | podle čí části listiny ze železobetonu, lanace ochranných armatur např. systém BetADRM, včetně oděrního bezpečnostního speciálního nátěru s parozábranou útluk | m ² | 367,640 | 300,00 | 110 792,00 | CS URS 2018 01 |
|----|---|-----------|--|----------------|---------|--------|------------|----------------|
| | | | W3.1 | | 193,199 | | | |
| | | | W3.2 | | 16,726 | | | |
| | | | W3.3 | | 167,415 | | | |
| | | | W3.4 | | | | | |
| | | | W3.5 | | | | | |
| | | | W3.6 | | | | | |
| | | | W3.7 | | | | | |
| | | | W3.8 | | | | | |
| | | | W3.9 | | | | | |
| | | | W3.10 | | | | | |
| | | | W3.11 | | | | | |
| | | | W3.12 | | | | | |
| | | | W3.13 | | | | | |
| | | | W3.14 | | | | | |
| | | | W3.15 | | | | | |
| | | | W3.16 | | | | | |
| | | | W3.17 | | | | | |
| | | | W3.18 | | | | | |
| | | | W3.19 | | | | | |
| | | | W3.20 | | | | | |
| | | | W3.21 | | | | | |
| | | | W3.22 | | | | | |
| | | | W3.23 | | | | | |
| | | | W3.24 | | | | | |
| | | | W3.25 | | | | | |
| | | | W3.26 | | | | | |
| | | | W3.27 | | | | | |
| | | | W3.28 | | | | | |
| | | | W3.29 | | | | | |
| | | | W3.30 | | | | | |
| | | | W3.31 | | | | | |
| | | | W3.32 | | | | | |
| | | | W3.33 | | | | | |
| | | | W3.34 | | | | | |
| | | | W3.35 | | | | | |
| | | | W3.36 | | | | | |
| | | | W3.37 | | | | | |
| | | | W3.38 | | | | | |
| | | | W3.39 | | | | | |
| | | | W3.40 | | | | | |
| | | | W3.41 | | | | | |
| | | | W3.42 | | | | | |
| | | | W3.43 | | | | | |
| | | | W3.44 | | | | | |
| | | | W3.45 | | | | | |
| | | | W3.46 | | | | | |
| | | | W3.47 | | | | | |
| | | | W3.48 | | | | | |
| | | | W3.49 | | | | | |
| | | | W3.50 | | | | | |
| | | | W3.51 | | | | | |
| | | | W3.52 | | | | | |
| | | | W3.53 | | | | | |
| | | | W3.54 | | | | | |
| | | | W3.55 | | | | | |
| | | | W3.56 | | | | | |
| | | | W3.57 | | | | | |
| | | | W3.58 | | | | | |
| | | | W3.59 | | | | | |
| | | | W3.60 | | | | | |
| | | | W3.61 | | | | | |
| | | | W3.62 | | | | | |
| | | | W3.63 | | | | | |
| | | | W3.64 | | | | | |
| | | | W3.65 | | | | | |
| | | | W3.66 | | | | | |
| | | | W3.67 | | | | | |
| | | | W3.68 | | | | | |
| | | | W3.69 | | | | | |
| | | | W3.70 | | | | | |
| | | | W3.71 | | | | | |
| | | | W3.72 | | | | | |
| | | | W3.73 | | | | | |
| | | | W3.74 | | | | | |
| | | | W3.75 | | | | | |
| | | | W3.76 | | | | | |
| | | | W3.77 | | | | | |
| | | | W3.78 | | | | | |
| | | | W3.79 | | | | | |
| | | | W3.80 | | | | | |
| | | | W3.81 | | | | | |
| | | | W3.82 | | | | | |
| | | | W3.83 | | | | | |
| | | | W3.84 | | | | | |
| | | | W3.85 | | | | | |
| | | | W3.86 | | | | | |
| | | | W3.87 | | | | | |
| | | | W3.88 | | | | | |
| | | | W3.89 | | | | | |
| | | | W3.90 | | | | | |
| | | | W3.91 | | | | | |
| | | | W3.92 | | | | | |
| | | | W3.93 | | | | | |
| | | | W3.94 | | | | | |
| | | | W3.95 | | | | | |
| | | | W3.96 | | | | | |
| | | | W3.97 | | | | | |
| | | | W3.98 | | | | | |
| | | | W3.99 | | | | | |
| | | | W3.100 | | | | | |
| | | | W3.101 | | | | | |
| | | | W3.102 | | | | | |
| | | | W3.103 | | | | | |
| | | | W3.104 | | | | | |
| | | | W3.105 | | | | | |
| | | | W3.106 | | | | | |
| | | | W3.107 | | | | | |
| | | | W3.108 | | | | | |
| | | | W3.109 | | | | | |
| | | | W3.110 | | | | | |
| | | | W3.111 | | | | | |
| | | | W3.112 | | | | | |
| | | | W3.113 | | | | | |
| | | | W3.114 | | | | | |
| | | | W3.115 | | | | | |
| | | | W3.116 | | | | | |
| | | | W3.117 | | | | | |
| | | | W3.118 | | | | | |
| | | | W3.119 | | | | | |
| | | | W3.120 | | | | | |
| | | | W3.121 | | | | | |
| | | | W3.122 | | | | | |
| | | | W3.123 | | | | | |
| | | | W3.124 | | | | | |
| | | | W3.125 | | | | | |
| | | | W3.126 | | | | | |
| | | | W3.127 | | | | | |
| | | | W3.128 | | | | | |
| | | | W3.129 | | | | | |
| | | | W3.130 | | | | | |
| | | | W3.131 | | | | | |
| | | | W3.132 | | | | | |
| | | | W3.133 | | | | | |
| | | | W3.134 | | | | | |
| | | | W3.135 | | | | | |
| | | | W3.136 | | | | | |
| | | | W3.137 | | | | | |
| | | | W3.138 | | | | | |
| | | | W3.139 | | | | | |
| | | | W3.140 | | | | | |
| | | | W3.141 | | | | | |
| | | | W3.142 | | | | | |
| | | | W3.143 | | | | | |
| | | | W3.144 | | | | | |
| | | | W3.145 | | | | | |
| | | | W3.146 | | | | | |
| | | | W3.147 | | | | | |
| | | | W3.148 | | | | | |
| | | | W3.149 | | | | | |
| | | | W3.150 | | | | | |
| | | | W3.151 | | | | | |
| | | | W3.152 | | | | | |
| | | | W3.153 | | | | | |
| | | | W3.154 | | | | | |
| | | | W3.155 | | | | | |
| | | | W3.156 | | | | | |
| | | | W3.157 | | | | | |
| | | | W3.158 | | | | | |
| | | | W3.159 | | | | | |
| | | | W3.160 | | | | | |
| | | | W3.161 | | | | | |
| | | | W3.162 | | | | | |
| | | | W3.163 | | | | | |
| | | | W3.164 | | | | | |
| | | | W3.165 | | | | | |
| | | | W3.166 | | | | | |
| | | | W3.167 | | | | | |
| | | | W3.168 | | | | | |
| | | | W3.169 | | | | | |
| | | | W3.170 | | | | | |
| | | | W3.171 | | | | | |
| | | | W3.172 | | | | | |
| | | | W3.173 | | | | | |
| | | | W3.174 | | | | | |
| | | | W3.175 | | | | | |
| | | | W3.176 | | | | | |
| | | | W3.177 | | | | | |
| | | | W3.178 | | | | | |
| | | | W3.179 | | | | | |
| | | | W3.180 | | | | | |
| | | | W3.181 | | | | | |
| | | | W3.182 | | | | | |
| | | | W3.183 | | | | | |
| | | | W3.184 | | | | | |
| | | | W3.185 | | | | | |
| | | | W3.186 | | | | | |
| | | | W3.187 | | | | | |
| | | | W3.188 | | | | | |
| | | | W3.189 | | | | | |
| | | | W3.190 | | | | | |
| | | | W3.191 | | | | | |
| | | | W3.192 | | | | | |
| | | | W3.193 | | | | | |
| | | | W3.194 | | | | | |
| | | | W3.195 | | | | | |
| | | | W3.196 | | | | | |
| | | | W3.197 | | | | | |
| | | | W3.198 | | | | | |
| | | | W3.199 | | | | | |
| | | | W3.200 | | | | | |
| | | | W3.201 | | | | | |
| | | | W3.202 | | | | | |
| | | | W3.203 | | | | | |
| | | | W3.204 | | | | | |
| | | | W3.205 | | | | | |
| | | | W3.206 | | | | | |
| | | | W3.207 | | | | | |
| | | | W3.208 | | | | | |

